
- 2024년 4/4분기 -
민선8기 공약사업

목 차

I. 공약사업 추진상황	4
II. 목표별 공약사업 목록	6
III. 부서별 공약사업 목록	8
IV. 부서별 관리카드	
1. 기획예산담당관	13
2. 도종합체전추진단	17
3. 행정복지국 / 자치행정과	21
4. 행정복지국 / 복지정책과	25
5. 행정복지국 / 행복돌봄과	29
6. 경제산업국 / 일자리정책과	45
7. 경제산업국 / 소상공인지원과	57
8. 경제산업국 / 문화체육과	67
9. 경제산업국 / 관 광 과	81
10. 경제산업국 / 농업정책과	95
11. 경제산업국 / 축산정책과	103
12. 경제산업국 / 산 림 과	107
13. 건설도시국 / 건 설 과	117
14. 건설도시국 / 환경정책과	137
15. 건설도시국 / 자원순환과	145
16. 건설도시국 / 도 시 과	149
17. 건설도시국 / 교 통 과	161
18. 보 건 소 / 보건정책과	173
19. 농업기술센터 / 소득개발과	177
20. 평생교육사업소	183
21. 상수도사업소	191
22. 하수도사업소	195

- 2024년 4/4분기 - 민선8기 공약사업 추진상황

○ 4/4분기 공약사업 추진현황

구 분		추진현황 (건수)							완료율 (완료·계속)	추진율 (완료·정상·일부추진)
		계	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	폐기		
2024	4분기	55	8	16	29			2	43.6% (16.3%↑)	100%
2024	3분기	55	8	7	38			2	27.3% (-)	100%
2024	2분기	55	8	7	37	2		1	27.3% (5.5%↑)	100%
2024	1분기	55	7	5	40	2		1	21.8% (7.3%↑)	100%

⇒ 4분기 추진상황 점검결과 총 55개 공약사업 중 24개 사업 완료

○ 분야별 현황

분 야	건수	목 표 년 도			사 업 주 체				
		단기	중기	장기	자체	중앙	경기도	자체+ 민자	기타 (민자등)
계	55	10	31	14	45	4	4	1	1
I. 군민중심의 경제·농업정책	9		8	1	8			1	
II. 맞춤형 인구정책 추진	6	2	3	1	6				
III. 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	14	4	7	3	14				
IV. 생활인구 1,000만의 자족도시 완성	6	1	4	1	3	1	1		1
V. 도시 인프라 구축	12		5	7	6	3	3		
VI. 군민의 건강한 삶	5		4	1	5				
VII. 일 잘하는 가평군	3	3			3				

※ 단기: 2년 이내, 중기: 2년 초과 ~ 임기 내, 장기: 임기 후

○ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기후	비고
			소계	'22	'23	'24	'25	'26		
계	932,619	173,825	619,598	64,651	93,560	111,681	168,624	181,082	139,196	
국비	252,103	68,332	161,709	9,680	7,731	18,669	58,385	67,244	22,062	
도비	114,645	13,904	87,274	3,713	15,287	24,855	18,367	25,052	13,467	
군비	321,126	57,645	198,814	18,472	35,750	36,226	59,967	48,399	64,667	
민간	37,400	-	37,400	15,000	15,000	7,400	-	-	-	
기타	207,345	33,944	134,401	17,786	19,792	24,531	31,905	40,387	39,000	

⇒ 사업주체가 가평균인 사업, 주체가 가평균이 아니더라도 군비가 수반되는 사업

※ 2024년 3/4분기(909,496백만원) 대비 23,123백만원 증

- 사업비 증감 주요사업: 미영연방 관광안보공원 조성, 아이돌보미사업 확대, 청정산업단지 기반조성, 산림생태테마파크 조성, 한강수계관리기금 추가확보, 청소년문화의집 프로그램, 하수도 사회기반시설 증진

○ 부서별 추진현황 총괄

(단위: 건, %)

부서명	구분	공약건수	추진상황					공정률	비고
			완료	이행후계속	정상추진	일부추진	폐기		
계		55	8	16	29	0	2	71.95	3분기 (60.8%)
기획예산담당관		1	1					100	
도종합채전추진단		1		1				100	
자치행정과		1	1					100	
복지정책과		1			1			40	
행복돌봄과		5	2	1	2			78	
일자리정책과		3		1	2			66.7	
소상공인지원과		2		1	1			90	
문화체육과		5		1	3		1	65	
관광과		5		2	2		1	80	
농업정책과		2		2				100	
축산정책과		1	1					100	
산림과		4	1		3			31.25	
건설과		6			6			47.5	
환경정책과		3		3				100	
자원순환과		1			1			55	
도시과		4	1	1	2			73.25	
교통과		4	1	1	2			82.5	
보건정책과		1			1			25	
소득개발과		1		1				100	
평생교육사업소		2		1	1			77.5	
상수도사업소		1			1			30	
하수도사업소		1			1			41.4	

II. 목표별 공약사업 목록

번호	사업명	담당부서	비고
I 군민중심의 경제·농업 정책			
I-1	지역성장을 위한 청정산업단지 기반조성	일자리정책과	p.46
I-2	소상공인 생존·활력 프로그램 추진 이행후계속	소상공인지원과	p.58
I-3	가평 2030 청년 지원(눈높이 청년복지)	일자리정책과	p.49
I-4	조종면 전통시장 활성화 지원	소상공인지원과	p.63
I-5	일자리 창출(다문화, 군인가족, 경력단절 여성 등) 이행후계속	일자리정책과	p.52
I-6	글로벌 가평농업 프로젝트 이행후계속	농업정책과	p.96
I-7	직거래장터 활성화 이행후계속	농업정책과	p.99
I-8	가평군 스마트팜 기술보급 사업 추진 이행후계속	소득개발과	p.178
I-9	산림자원 가공산업 육성	산림과	p.108
II 맞춤형 인구정책 추진			
II-1	인구증가정책 수립(다문화가족중시) 완료	행복돌봄과	p.30
II-2	노인회관(노인복지회관) 건립	행복돌봄과	p.32
II-3	생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성	행복돌봄과	p.35
II-4	행복한 가정을 위한 아이돌보미사업 확대 완료	행복돌봄과	p.40
II-5	평생학습관 건립 및 교육사업 프로그램 편성 운영	평생교육사업소	p.184
II-6	청소년문화의집 프로그램 운영 이행후계속	평생교육사업소	p.188
III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성			
III-1	미영연방 관광안보 공원 조성	복지정책과	p.26
III-2	가평 역사박물관 건립 폐기	문화체육과	p.68
III-3	(지역예술인과 함께 하는)음악역 1939 피크닉 콘서트 이행후계속	문화체육과	p.71
III-4	운악산 관광레저 단지 조성 이행후계속	관광과	p.82
III-5	밀리터리 콘텐츠 테마파크 조성 폐기	관광과	p.85
III-6	드론 아카데미 확대 운영 이행후계속	교통과	p.162
III-7	신선봉(울업산) 일대 산악관광지 개발계획 수립 이행후계속	관광과	p.87
III-8	북한강 수변 관광특구 지정 신청	관광과	p.89
III-9	북면 산림생태테마파크 조성	산림과	p.110
III-10	상면 산림자원 관광레저 바이오밸리 조성	산림과	p.113
III-11	북한강 천년벚길 조성	관광과	p.92
III-12	청평 옛 중앙내수면연구소 이전부지 주민 개방 완료	축산정책과	p.104
III-13	축령산 생태관광마을 둘레길 조성(행현2리 중심) 완료	산림과	p.115
III-14	2025~2026 경기도 체육대회 유치 이행후계속	도종합체전추진단	p.18

번호	사 업 명	담당부서	비 고
IV 생활인구 1,000만의 자족도시 완성			
IV-1	명품주거단지 1만호 건설 등 목표로 주거문제 해결 이행후계속	도시과	p.150
IV-2	북면도시공원 야간 경관 조성 완료	도시과	p.153
IV-3	수도권정비계획법 자연보전권역 규제 완화	도시과	p.156
IV-4	GTX-B 노선 가평 연장 확정 완료	교통과	p.164
IV-5	대중교통 시스템 및 노선확충(잠실-청평-가평)	교통과	p.167
IV-6	재정여건 개선을 위한 한강수계관리기금 추가확보 이행후계속	환경정책과	p.138
V 도시 인프라 구축			
V-1	제2경춘국도 건설사업 조기 착공	건설과	p.118
V-2	지방도 387호선(내방-연하) 도로 개량사업 조기 착공	건설과	p.121
V-3	하천IC~고성 간 도로 개설사업(호명터널) 확정	건설과	p.124
V-4	국도75호선(가평~목동) 확장사업 착공	건설과	p.127
V-5	상판~적목 간 2차선 도로 개설사업 확정	건설과	p.130
V-6	두밀~대보 간 2차선 도로 개설사업 확정	건설과	p.133
V-7	읍면별 도심지 주차장 확충 추진	교통과	p.169
V-8	청평역, 상천역 역세권 활성화(기반시설 확충)	도시과	p.158
V-9	전기차 충전 인프라 확대 이행후계속	환경정책과	p.141
V-10	친환경 자원회수시설(소각) 설치	자원순환과	p.146
V-11	상수도 사회기반시설 증진	상수도사업소	p.192
V-12	하수도 사회기반시설 증진	하수도사업소	p.196
VI 군민의 건강한 삶			
VI-1	경기도의료원 가평병원 유치	보건정책과	p.174
VI-2	보조기기 수리센터 운영 이행후계속	행복돌봄과	p.42
VI-3	파크골프장 확충	문화체육과	p.73
VI-4	상면 생활문화체육시설 및 공간조성	문화체육과	p.76
VI-5	설악면 생활문화체육시설 및 주차장 확보	문화체육과	p.78
VII 일 잘하는 가평군			
VII-1	민원정책관제 및 감사관실 신설 완료	자치행정과	p.22
VII-2	예산 및 사업유치를 위한 서울사무소 설치 완료	자치행정과	p.14
VII-3	환경부 대응 환경정책자문회 설치·운영 이행후계속	환경정책과	p.143

III. 부서별 공약사업 목록

번호	공약목표	사업명	추진상황	공정률	완료시기	비고
계		55개 사업		71.95%		
기획예산담당관		1개 사업		100%		
VII-2	일 잘하는 가평군	예산 및 사업유치를 위한 서울사무소 설치	완료	100%	2023 (임기내)	p.14
도종합체전추진단		1개 사업		100%		
III-14	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	2025~2026 경기도 체육대회 유치(개최)	이행후계속	100%	2023 (임기내)	p.18
자치행정과		1개 사업		100%		
VII-1	일 잘하는 가평군	민원정책관제 및 감사관실 신설	완료	100%	2023 (임기내)	p.22
복지정책과		1개 사업		40%		
III-1	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	미영연방 관광안보 공원 조성	정상추진	40%	2028 (임기외)	p.26
행복돌봄과		5개 사업		78%		
II-1	맞춤형 인구정책 추진	인구증가정책 수립(다문화가족중시)	완료	100%	2023 (임기내)	p.30
II-2	맞춤형 인구정책 추진	노인회관(노인복지회관) 건립	정상추진	45%	2026 (임기내)	p.32
II-3	맞춤형 인구정책 추진	생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성	정상추진	45%	2027 (임기외)	p.35
II-4	맞춤형 인구정책 추진	행복한 가정을 위한 아이돌보미사업 확대	완료	100%	2023 (임기내)	p.40
VI-2	군민의 건강한 삶	보조기기 수리센터 운영	이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.42
일자리정책과		3개 사업		66.7%		
I-1	군민중심의 경제·농업 정책	지역성장을 위한 청정산업단지 기반조성	정상추진	30%	2028 (임기외)	p.46
I-3	군민중심의 경제·농업 정책	가평 2030 청년 지원(눈높이 청년복지)	정상추진	70%	2026 (임기내)	p.49
I-5	군민중심의 경제·농업 정책	일자리 창출 (다문화, 군인가족, 경력단절 여성 등)	금회 이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.52
소상공인지원과		2개 사업		90%		
I-2	군민중심의 경제·농업 정책	소상공인 생존·활력 프로그램 추진	금회 이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.58
I-4	군민중심의 경제·농업 정책	조종면 전통시장 활성화 지원	정상추진	80%	2025 (임기내)	p.63

번호	공약목표	사업명	추진상황	공정률	완료시기	비고
문화체육과		5개 사업(폐기 1)		65%		
III-2	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	가평 역사박물관 건립	폐기	-	-	p.68
III-3	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	(지역예술인과 함께 하는) 음악역 1939 피크닉 콘서트	금회 이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.71
VI-3	군민의 건강한 삶	파크골프장 확충	정상추진	50%	2025 (임기내)	p.73
VI-4	군민의 건강한 삶	상면 생활문화체육시설 및 공간조성	정상추진	40%	2026 (임기내)	p.76
VI-5	군민의 건강한 삶	설악면 생활문화체육시설 및 주차장 확보	정상추진	70%	2025 (임기내)	p.78
관광과		5개 사업(폐기 1)		80%		
III-4	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	운악산 관광레저 단지 조성 (현등사, 운악산 문화관광마을)	금회 이행후계속	100%	2030 (임기외)	p.82
III-5	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	밀리터리 콘텐츠 테마파크 조성	폐기	-	-	p.85
III-7	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	신선봉(울업산) 일대 산악관광지 개발 계획 수립	이행후계속	100%	2023 (임기내)	p.87
III-8	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	북한강 수변 관광특구 지정 신청	정상추진	80%	2025 (임기내)	p.89
III-11	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	북한강 천년벚길 조성	정상추진	40%	2026 (임기내)	p.92
농업정책과		2개 사업		100%		
I-6	군민중심의 경제·농업 정책	글로벌 가평농업 프로젝트	금회 이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.96
I-7	군민중심의 경제·농업 정책	직거래장터 활성화	이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.99
축산정책과		1개 사업		100%		
III-12	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	청평 옛 중앙내수면연구소 이전부지 주민 개방	완료	100%	2023 (임기내)	p.104
산림과		4개 사업		31.25%		
I-9	군민중심의 경제·농업 정책	산림자원 가공산업 육성	정상추진	5%	2025 (임기내)	p.108
III-9	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	북면 산림생태테마파크 조성	정상추진	10%	2025 (임기내)	p.110
III-10	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	상면 산림자원 관광레저 바이오밸리 조성	정상추진	10%	2026 (임기내)	p.113
III-13	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	축령산 생태관광마을 둘레길 조성 (행현2리 중심)	완료	100%	2023 (임기내)	p.115

번호	공 약 목 표	사 업 명	추진상황	공정률	완료시기	비고
건설과		6개 사업		47.5%		
V-1	도시 인프라 구축	제2경춘국도 건설사업 조기 착공	정상추진	50%	2026 (임기내)	p.118
V-2	도시 인프라 구축	지방도 387호선(내방-연하) 도로 개량사업 조기 착공	정상추진	45%	2026 (임기내)	p.121
V-3	도시 인프라 구축	하천IC~고성 간 도로 개설사업 (호명터널) 확정	정상추진	60%	2027 (임기외)	p.124
V-4	도시 인프라 구축	국도75호선(가평~목동) 확장사업 착공	정상추진	10%	2028 (임기외)	p.127
V-5	도시 인프라 구축	상판~적목 간 2차선 도로 개설사업 확정	정상추진	60%	2027 (임기외)	p.130
V-6	도시 인프라 구축	두밀~대보 간 2차선 도로 개설사업 확정	정상추진	60%	2027 (임기외)	p.133
환경정책과		3개 사업		100%		
IV-6	생활인구 1,000만의 자족도시 완성	가평군 재정여건 개선을 위한 한강수계관리기금 추가확보	이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.138
V-9	도시 인프라 구축	전기차 충전 인프라 확대	이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.141
VII-3	도시 인프라 구축	환경부 대응 환경정책자문회 설치 · 운영	이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.143
자원순환과		1개 사업		55%		
V-10	도시 인프라 구축	친환경 자원회수시설(소각) 설치	정상추진	55%	2028 (임기외)	p.146
도시과		4개 사업		73.25%		
IV-1	생활인구 1,000만의 자족도시 완성	명품주거단지 1만호 건설(군인아파트 등) 목표로 주거문제 해결	금회 이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.150
IV-2	생활인구 1,000만의 자족도시 완성	북면도시공원 야간 경관 조성	완료	100%	2024 (임기내)	p.153
IV-3	생활인구 1,000만의 자족도시 완성	수도권정비계획법 자연보전권역 규제 완화	정상추진	55%	2026 (임기내)	p.156
V-8	도시 인프라 구축	청평역, 상천역 역세권 활성화 (기반시설 확충)	정상추진	38%	2027 (임기외)	p.158
교통과		4개 사업		82.5%		
III-6	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	드론 아카데미 확대 운영	금회 이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.162
IV-4	생활인구 1,000만의 자족도시 완성	GTX-B 노선 가평 연장 확정	완료	100%	2026 (임기내)	p.164
IV-5	생활인구 1,000만의 자족도시 완성	대중교통 시스템 및 노선확충 (7000노선 : 잠실-청평-가평)	정상추진	60%	2026 (임기내)	p.167
V-7	도시 인프라 구축	읍면별 도심지 주차장 확충 추진	정상추진	70%	2026 (임기내)	p.169

번호	공 약 목 표	사 업 명	추진상황	공정률	완료시기	비고
보건정책과		1개 사업			25%	
VI-1	군민의 건강한 삶	경기도의료원 가평병원 유치	정상추진	25%	2026 (임기외)	p.174
소득개발과		1개 사업			100%	
I-8	군민중심의 경제·농업 정책	가평군 스마트팜 기술보급 사업 추진	금회 이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.178
평생교육사업소		2개 사업			77.5%	
II-5	맞춤형 인구정책 추진	평생학습관 건립 및 교육사업 프로그램 편성 운영	정상추진	55%	2026 (임기내)	p.184
II-6	맞춤형 인구정책 추진	청소년문화의집 프로그램 운영	금회 이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.188
상수도사업소		1개 사업			30%	
V-11	도시 인프라 구축	상수도 사회기반시설 증진	정상추진	30%	2026 (임기내)	p.192
하수도사업소		1개 사업			41.4%	
V-12	도시 인프라 구축	하수도 사회기반시설 증진	정상추진	41.4%	2028 (임기외)	p.196

기 획 예 산 담 당 관

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						100%	
Ⅶ-2	예산 및 사업유치를 위한 서울사무소 설치	가평군	신규	2023 (임기내)	완료	100	

약속Ⅶ 군민의 눈높이에서 일 잘하는 가평군이 되겠습니다.

예산 및 사업유치를 위한 서울사무소 설치

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅶ-2	행정	주민참여는 더 활발하게	가평군	신규	단기	임기 내
추진부서	기획예산담당관		기획팀장	조경아(2050)	담당자	윤희준(4628)
협조부서	행정복지국	자치행정과	인사팀장	박석현(2125)	담당자	유호열(2126) 하영하(2128)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 국회 및 중앙부처를 대상으로 한 예산확보, 정책자료 수집 등으로 군정발전에 기여
- 가평군 대외홍보로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2023. 12.
- 사업위치: 서울시 영등포구 국회대로 800(여의도동) 여의도파라곤 413호
- 사업규모: 사무공간: 73.46㎡ / 직원: 임기제 5급 1명, 7~8급 2명
※ 현재 시간선택제임기제 가급 1명, 6급 1명 서울사무소 근무
- 소요예산: 482백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	482		482		125	119	119	119		
국비										
도비										
군비	482		482		125	119	119	119		
기타										

○ 사업내용

- 조직진단 용역 과업에 포함하여 신규 행정기구 모델 도출
- 서울사무소 위치, 운영방식, 직원 선정 방식, 타당성 등 세부 검토 실시
- 서울사무소 개소

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	이행률
계			100	100
2022 하반기	· 계획 수립 · 조직진단 용역 추진 (자치행정과)	· 조직진단 용역 추진계획 수립 · 조직진단 용역 추진 · 조직진단 용역 결과를 바탕으로 조례(안) 수립	10	10
2023 상반기	· 세부 검토 추진 · 조직 신설 의뢰 (기획예산담당관)	· 서울사무소 운영 세부 검토 추진 - 파견 직원 선정 방식, 운영방안 - 서울사무소 상시 운영 타당성 검토 - 서울사무소 위치 선정 등 · 조직 신설 의뢰(팀 규모, 소속 과 등)	40	40
2023 하반기	· 인사 발령 (자치행정과)	· 인사 발령	10	10
	· 서울사무소 운영 (해당 부서)	· 서울사무소 운영	40	40

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2022	3분기	· 조직진단용역 착수 · 조직진단용역 관련 자료 제출 · 조직진단 용역 관련 부서별 의견 수렴 · 부서별 인터뷰 완료	
	4분기	· 가평군 서울사무소 설치계획 수립 · 가평군공무원노동조합 의견 수렴 · 조직진단용역 중간보고회 개최 · 조직진단용역 최종보고회 개최 · 「가평군 행정기구 및 정원 조례」 공포	
2023	1분기	· 「가평군 행정기구 및 정원 조례」 시행 · 가평군 서울사무소 설치 변경 계획 수립	
	2분기	· 2023년 제1회 추가경정 예산안 의회 의결 · 서울사무소 부동산 임대차 계약 체결 · 서울사무소 리모델링공사 계약 체결 · 시간선택제임기제(소장) 채용 의뢰 · 서울사무소 집기 비품 구입	
	3분기	· 시간선택제임기제(소장) 임용 · 서울사무소 개소 및 운영 [2023. 8. 11.]	

□ 기대효과

- 국비확보, 입법활동, 투자유치 등 동향파악 신속 대응

도 종 합 체 전 추 진 단

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						100%	
III-14	2025~2026 경기도 체육대회 유치(개최)	가평군	신규	2023 (임기내)	이행후 계속	100	

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

2025~2026 경기도 체육대회 유치(개최)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-14	문화	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	도종합체육추진단		대회기획팀장 대회홍보팀장 대회운영팀장 대회시설팀장	김미경(2671) 나선주(2681) 원경원(2676) 공중식(2672)	담당자	김혜영(2673) 이경하(2682) 이수종(2677) 이종국(2674)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 경기도종합체육대회를 통해 지역경제 활성화
- 기존 체육시설 개·보수를 통한 최선의 체육 인프라 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 4. ~ 2026. 10.
- 사업규모: 25년 ~ 26년 경기도종합체육대회 유치 1식
- 소요예산: 27,921백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	27,921		27,921		6,305	16,116	2,500	3,000		
국비	1,010		1,010		500	510				
도비	10,000		10,000		3,200	6,000	400	400		
군비	16,911		16,911		2,605	9,606	2,100	2,600		
기타										

○ 사업내용

- 가평종합운동장 및 기존 체육시설 개·보수를 통한 공인 경기장 구축
- 2025년 ~ 2026년 경기도종합체육대회 경기장 배정
- 대회 행사 운영비 지출 및 각종 용역 발주

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022	경기도 종합체육대회 유치 준비	25~26년 경기도종합체육대회 개최지 선정을 위해 유치신청 준비 및 체육시설 전수조사	80	80
2023	시설 총사업비 확정 및 설계용역발주	체육대회 유치 확정(4월) 이후 체육시설 총사업비 산출 및 설계용역발주	20	20
2024	체육시설 인프라 구축 완료	24년 말까지 경기장 구축 완료	-	-
2025	대회진행 용역 발주 및 체육시설 개·보수	25년 경기도체육대회(비장애인, 장애인) 행사운영비 지출 및 용역 실시 및 체육시설 개·보수	-	-
2026	대회진행 용역 발주 및 대회종료 후 정산	26년 10월을 끝으로 모든 대회를 종료하고 정산	-	-

□ 추진실적

구 분	추진실적		비고
2022	4분기	· 군의회 시정연설에 대회 유치 표명	
2023	1분기	· 경기도종합체육대회 유치 신청서 제출 · 경기도종합체육대회 현장 실사단 방문	
	2분기	· 가평군 유치 확정	
	3분기	· 도민체전T/F팀 구성 · 기본계획 수립 및 대회추진단 발대식 · 경기장 개·보수 대상지 전수조사 및 공사(사업완료 30개소, 추진중 1개소)	
	4분기	· 경기장 시설설계용역 착수(17건) 및 준공(12건)	
2024	1분기	· 개·폐회식 및 경기장 방영용 홍보동영상 제작(~24.11월) · 대회 참여 외식·숙박업소 모집(2회, 360개 업소) 및 타 시군에 리스트 제공 · 대회 홍보 민간추진단 발족식 및 캠페인 활동(8회/~24.12월) · 대회상징물 및 디자인 개발(~24.8월) · 대회추진단 부서별 추진상황 보고회(3회/~24.10월)	
	2분기	· 도종합체전 조직위원회 출범식 · 종합홍보계획 수립 및 차기 개최지 홍보(~24.10월) - 경기도(장애인)체육대회 2024 파주, 경기모아뮤직페스티벌, 경기도(장애인) 생활체육대회 2024 성남, 자라섬 가을꽃페스타, 제7회 경기도민의 날	
	3분기	· 경기운영 종합계획 수립, 종목별 경기 및 운영 필요 물품 수요조사, 경기장 배정 · 경기도(장애인)종목별 단체 경기장 사전답사 및 경기장 확정(수영 제외)	
	4분기	· 자원봉사자 모집 시작(~25.2월) · 외식·숙박 가격 안정화를 위한 업무 협약 · 대회 공식 홈페이지 오픈 · 개·폐회식 행사 연출 대행 용역 계약 체결 · 교통매체(ITX, 경춘선) 모니터 내 대회 홍보영상 송출 · 성화 채화 및 봉송행사 용역 공고 · 경기장 시설보수 준공(30개소, 21,000백만원)	

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	1분기	· 지하철 모니터, 경기버스(G버스) 등 생활밀착형 매체 홍보(~25.5월) · D-100 보드판 제막식 추진 · 부대행사장 설치 및 운영 추진(~25.5월) · 경기장 의료·방역·교통 대책 수립 및 추진(~25.5월) · 추진상황 4차 보고회 · 참여업소 지정 현판 배부 및 이동식경사로 대여 용역 추진 · 숙박외식업 서한문 및 선수단 환영포스터 등 배부 · 대회 홍보 현수막 및 가로기 설치, 대회 조형물 및 꽃탑 설치 · 추진상황 최종 보고회	
	2분기	· 자원봉사자 및 공무원운영지원단 발대식 및 교육 · 대회 홍보 온라인이벤트 추진 · 2025 가평 도민체전 성화 채화 · 제15회 경기도장애인체육대회 2025 가평 [2025. 4. 24. ~ 4. 26.] · 제71회 경기도체육대회 2025 가평 [2025. 5. 15. ~ 5. 17.]	
	3분기	· 체육시설 개보수공사 사업완료 1개소(자라섬 롤러경기장) - 2026년 경기도생활체육대축전 대회 대비	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 기대효과

- 경기도 최대 규모 체육대회를 유치하여 군민의 자긍심을 높이고 군민화합과 단합된 가평 이미지를 경기도 전역에 확산
- 청정 관광 자원과 연계한 우수한 체육 인프라 홍보로 자연이 어우러진 수도권 최고의 힐링 스포츠 투어링 메커니즘 도시로 도약
- 다양한 체육 종목 저변 확대 및 지역이 건강해지는 체육 복지 실현

자 치 행 정 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						100%	
VII-1	민원정책관제 및 감사관실 신설	가평군	신규	2023 (임기내)	완료	100	

약속Ⅷ 군민의 눈높이에서 일 잘하는 가평군이 되겠습니다.

민원정책관제 및 감사관실 신설

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅷ-1	행정	주민참여는 더 활발하게	가평군	신규	단기	임기 내
추진부서	행정복지국	자치행정과	인사팀장	박석현(2125)	담당자	유호열(2126)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 적극적인 민원해결 및 주민 소통을 위한 민원정책관 직위 신설
- 청렴한 공직사회 조성 및 선제적 감사 업무 수행을 위한 감사 담당 부서 신설
- 행정 기능별 사무의 합리적 조정

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2023. 6.
- 사업규모: 조직진단 1식
- 소요예산: 52백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	52		52	52						
국비										
도비										
군비	52		52	52						
기타										

○ 사업내용

- 적극적인 민원해결과 군민 소통을 위한 민원정책관 직위 신설
- 청렴 공직사회 풍토 조성을 위한 감사담당부서 신설
- One-stop 민원처리를 위한 건축과 · 허가민원과 민원처리 부서 기능 및 구조진단
- 보건소 및 보건진료소 유사·중복기능·통폐합 인력 및 업무 조정

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	· 계획 수립 · 조직진단 용역 추진	· 조직진단 용역 추진계획 수립 · 조직진단 용역 추진 · 조직진단 용역 결과를 바탕으로 조례(안) 수립	90	90
2023 상반기	· 자치법규 정비 · 인사 발령	· 「가평군 행정기구 및 정원」 조례, 규칙, 규정 등 자치법규 정비 · 인사 발령	10	10

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2022	3분기	· 조직진단용역 착수 · 조직진단용역 관련자료 제출 · 조직진단 용역 관련 부서별 의견 수렴 · 부서별 인터뷰 완료	
	4분기	· 가평군공무원노동조합 의견 수렴 · 조직진단용역 중간보고회 및 최종보고회 개최 · 「가평군 행정기구 및 정원 조례」 공포	
2023	1분기	· 「가평군 행정기구 및 정원 조례」 시행	

□ 기대효과

- 적극적인 민원해결 및 청렴한 공직사회 조성으로 주민들이 체감하는 행정서비스 만족도 향상

복 지 정 책 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						40%	
Ⅲ-1	미영연방 관광안보 공원 조성	가평군	신규	2028 (임기외)	정상추진	40	

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

미영연방 관광안보공원 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-1	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	신규	장기	임기 외
추진부서	행정복지국	복지정책과	복지기획팀장	신성남(2210)	담당자	김은영(2214)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	40%

□ 추진방향

- 미국참전비 및 호주·뉴질랜드·캐나다 등 각국의 참전기념비가 설치되어 있는 북면 지역에 동 참전비와 연계된 안보 교육의 구심점 역할을 할 수 있는 공원 조성
- 군유지 활용 및 지역사회 공감대 형성을 위한 주민의견 수렴 이행

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2028. 12. ※ 공약실천계획서: 2022. 8. ~ 2026. 6
- 사업위치: 가평군 북면 목동리 산226-1 일원
- 사업규모: 부지면적 151,151㎡ (93,520㎡ 활용), 조형물, 전시관, 관광·문화시설 조성 등
- 소요예산: 29,500백만원 ※ 투융자심사 금액으로 반영(토지 보상비 350백만원 증가)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	29,500	350	15,365		50	300	7,000	8,015	13,785	
국비										
도비	11,815		11,815				5,000	6,815		균특
군비	17,685	350	3,550		50	300	2,000	1,200	13,785	
기타										

○ 사업내용

- 미영연방 참전비 관련 조형물 설치, 전시관 등 스물문화원 설치
- 가평전투 3D게임 형상화를 통한 안보교육장 마련 및 학생 방문코스 조성 등
- 지역주민과 관광객이 이용할 수 있는 관광·문화시설 설치로 지역경제 활성화 도모
- 편익시설: 주차장 155면
- 교양시설: 메모리얼 파크(4,080㎡), 조각공원(2,690㎡), 가평전투기념관(연면적 3,500㎡)
- 유희시설: 어린이 놀이터(1,625㎡), 루지 체험장(9,480㎡) 제외

□ 연도별 목표 및 추진계획 ※ 행정절차 이행 기간 소요 등으로 인해 기간 변동

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	40
2022 하반기	중기지방재정계획 및 주민의견수렴	· 공약사업 추진계획 보고 및 중기지방재정계획 반영 · 학술연구용역 심의 및 주민의견 수렴	10	10
2023 ~ 2024	사전타당성 연구용역 및 예산확보	· 자료조사 및 우수시설 벤치마킹 · 사업 타당성 용역실시(사업비 산정) · 기본계획수립 및 사업대상지(입지) 확정 · 사전행정절차 이행(중기지방재정계획, 투융자심사, 공유재산관리계획) 및 사업예산 확보 · 군 관리계획(변경) 및 기본·실시설계	30	30
2025	행정절차 완료	· 실시계획인가 승인 및 인·허가 완료	30	
2026	공사착공	· 시공사 선정 및 공사착공	10	
2028	공사준공	· 공사 진행 및 준공	20	

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2022	3분기	· 민선8기 인수위원 의견청취 및 검토 보고 · 미영연방 관광안보공원 조성 추진계획 보고 · 중기지방재정계획 반영	
	4분기	· 주민의견 수렴(2회)	
2023	1분기	· 우수 보훈 및 전시시설 벤치마킹 실시(오산시 UN초전기념관 외 3개소) · 학술연구용역 심의 의결(원안가결)	
	2분기	· 사전 타당성 조사 연구 용역비 제1회 추경예산 확보(70백만원) · 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 계약 체결 및 착수	
	3분기	· 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 관련 - 착수보고회, 주민설명회(1·2차), 관계자(자문위원 등) 사전 회의 개최	
	4분기	· 타당성 조사 연구 및 기본계획 용역 중간보고회·최종보고회 개최, 용역 준공 · 중앙투자심사 의뢰(재원확보계획 미비로 반려 2024. 1. 9.)	
2024	1분기	· 군 관리계획(변경) 용역비 본예산 확보 · 전투기념관 건립 관련 공유재산심의 원안가결 · 지방재정 투자심사 조건부 의결 (2025년 중기지방재정계획에 추가 사업비의 재원을 수정하여 재반영) · 일사감사 및 계약심사 (재)의뢰(국토계획 표준품셈에 따른 품셈 수정) · 일상감사 및 계약심사 결과 알림(자문위원 검토결과 별도 의견없음) · 미영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 계약 의뢰	

구 분		추진 실적	비고
	2분기	· 마영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 사업수행능력평가 실시 · 마영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 계약 및 착수	
	4분기	· 마영연방 관광안보공원 군관리계획(공원) 입안 서류 접수(가평군 도시과) · 마영연방 관광안보공원 공공건설 사전검토 완료 · 제3차 지역균형발전사업비 확보(11,815백만원) · 2024년 제23회 가평군 군계획(분과)위원회 안건 상정 *조건부 자문 · 공공건축심의위원회 심의 완료 · 가평 군관리계획[군계획시설(공간시설 근린공원)] 결정 신청 - 경기도 도시주택실 도시정책과 제출	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 타당성 연구용역 결과 산정된 사업비(295억원)를 토대로 국·도비 등 예산 확보 노력 강구

□ 향후계획

- 추가 국·도비 예산 확보를 위한 노력 강구
- 행정절차 이행완료(지방재정중앙투자심사, 건축설계 공모, 건축실시설계, 계약심사 등)
- 공사 착공 등

□ 기대효과

- 미영연방 안보전시관 및 관광시설과 연계된 볼거리·즐길거리 등이 있는 공원 조성을 통해 지역경제 활성화에 기여

행 복 돌 봄 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
5개 사업						78%	
Ⅱ-1	인구증가정책 수립(다문화가족중시)	가평군	신규	2023 (임기내)	완료	100	
Ⅱ-2	노인회관(노인복지회관) 건립	가평군	신규	2026 (임기내)	정상추진	45	
Ⅱ-3	생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성	가평군	계속	2027 (임기외)	정상추진	45	
Ⅱ-4	행복한 가정을 위한 아이돌보미사업 확대	가평군	계속	2023 (임기내)	완료	100	
Ⅵ-2	보조기기 수리센터 운영	가평군	계속	2026 (임기내)	이행후 계속	100	

약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

인구증가정책 수립(다문화가족중시)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
II-1	행정	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	단기	임기 내
추진부서	행정복지국	행복돌봄과	여성가족팀장	최윤정(2260)	담당자	주하진(2261)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 현재 추진 중인 19개 다문화가족 지원 사업 가운데 14개 사업이 국·도비 보조사업으로 우리 지역만의 특화된 다문화가족 지원 사업이 부족한 실정으로 다문화가족에 대한 실태 조사, 지원 사업에 대한 성과 분석 및 개선안 도출 필요
- 중장기 다문화 중시 인구증가정책 및 연차별 시행계획 수립을 위해 다양한 분야의 전문가 및 지역주민, 민간기관 등 지역사회 주체들이 참여하는 학술연구용역 실시

□ 사업개요

- 사업명: 다문화가족 중시 인구정책 수립 연구용역
- 사업기간: 2022. 8. ~ 2023. 12.
- 소요예산: 22백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	22		22		22				
국비									
도비									
군비	22		22		22				
기타									

○ 용역 주요 내용

- 다문화가족 실태조사 및 유형 분석, 자원 발굴
- 다문화가족 지원사업 시행결과 성과 분석 및 개선과제 도출
- 다문화가족 욕구조사 및 신규 지원사업 등 발굴
- 다문화가족 중시 중장기 인구정책 및 연차별 시행계획 수립

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022.10.	학술연구용역 심의	· 2023년 본예산 반영 학술연구용역 심의	5	5
2022.12.	예산 확보	· 학술연구용역 사업비 확보	5	5
2023. 1.	용역 착수	· 학술연구용역 착수	30	30
2023. 7.	용역 완료	· 학술연구용역 완료	30	30
2023.12.	인구증가 정책수립	· 중장기 인구정책 및 연차별 시행계획 수립	30	30

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2022	3분기	· 인구증가정책 추진계획 수립 · 인구증가정책 수립 학술연구용역 방침 보고	
	4분기	· 가평군 학술연구용역 심의 완료 · 학술연구용역 사업비 확보(2023년도 본예산 22,000천원)	
2023	1분기	· 학술연구용역 계약 체결(경기도 여성가족재단) 및 착수 보고	
	2분기	· 학술연구용역 지역전문가 자문회의 실시 및 중간보고회 개최	
	3분기	· 학술연구용역 최종보고회 개최	
	4분기	· 다문화가족 중시 중장기 정책방안 시행계획 수립 완료	

□ 기대효과

- 다문화가정의 지역사회 내 안정적인 정착과 화합을 적극 지원하여 인구증가에 기여
- 타 시군과 차별화된 다문화가정 정착지원 사업 발굴을 통해 선진 다문화 사회 구현

약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

노인회관(노인복지회관) 건립

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
II-2	복지	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	행정복지국	행복돌봄과	복지시설팀장	최태양(2228)	담당자	조영운(2253)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 45%

□ 추진방향

- 가평군노인회, 노인회 취업센터, 가평군노인복지관이 각각의 시설에서 운영되고 있어 복지 서비스 이용 시 수혜자 및 프로그램 중복을 줄이고 보다 많은 어르신들에게 다양한 프로그램 제공을 위해 관련 시설들을 한곳에서 운영
- 또한, 접근성이 편리하고 어르신들이 이용하기 편리한 위치에 조성하여 노인여가복지 증진에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업위치: 가평읍 읍내리 282-2
- 사업규모: 연면적 약 2,300㎡(지하1층, 지상4층)
- 소요예산: 12,100백만원 ※ 공약실천계획서: 15,000백만원(부지매입비 5,000/공사비 10,000)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	12,100		12,100		2,142	450	7,508	2,000		
국비										
도비	2,000		2,000				2,000			
군비	10,100		10,100		2,142	450	5,508	2,000		
기타										

※ 재원확보방안: 특별조정교부금(2,000백만원) 및 지방소멸대응기금(2,000백만원)지원건의
 ▶ 국·도비 미확보 시, 군비 확보 필요

○ 사업내용

- 지하1층: 기계실
- 지상1층: 경로식당, 체력단련실, 휴게실, 화장실
- 지상2층: 다목적실, 소회의실, 프로그램실 1·2, 정보화교육실, 화장실
- 지상3층: 관장실, 사무실(노인복지관), 프로그램실 3, 휴게실, 화장실
- 지상4층: 지회장실, 노인대학장실, 사무실(사무국, 취업센터), 소회의실, 화장실

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	45
2022 하반기	부지선정	· 가평군노인회 및 가평군노인복지관 등 의견수렴	10	10
2023	부지매입	· 노인회관 신축 지자체 벤치마킹 실시(양평, 포천) · 공유재산 관리계획 승인 · 재정투자 심사 · 중기지방재정계획 반영	20	20
2024	실시설계	· 특별조정교부금 및 특별교부세 등 신청 · 공공건축물 사업계획 사전검토 · 실시설계 및 공사 착공	30	15*
2025 ~2026	공사추진	· 준공	40	

□ 추진실적

구 분		추진실적	비 고
2022	4분기	· 중기지방재정계획 반영 · 부지선정 후 부지의 감정평가 실시	
2023	1분기	· 제1회 가평군 공유재산 심의회 원안가결 · 제1회 지방보조금 투자심사 원안가결	
	2분기	· 노인회관 부지 매입 완료(2,100백만원) · 제2회 지방보조금 투자재심사 원안가결	
	3분기	· 제4회 가평군 공유재산 심의회 원안가결	
	4분기	· 노인회관 건립공사 건축기획용역 착수	
2024	1분기	· 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰	
	2분기	· 공공건축 사업계획 사전검토 완료 · 공공건축심의위원회 심의 요청 및 완료 · 건축기획용역 완료 · 건축설계공모 공고	
	3분기	· 공모 작품심사위원회 개최 · 설계용역 계약 의뢰	
	4분기	· 설계용역 계약 체결 · 설계용역 착수보고회 실시 · 설계용역 사용자 설명회 실시	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	2분기	· 기본 및 실시설계 용역 완료(25.5월) · 공사 착공(25.6월)	
	4분기	· 공사 준공	
2026	-		

□ 기대효과

- 노인여가복지시설 이용자들이 고령임을 감안, 이용자의 안전과 이동의 편리함을 최우선으로 하여 이용자의 만족도 향상
- 교육, 각종 여가활동, 노인일자리 등 다양한 복지서비스 제공시 프로그램 중복을 방지하고 수요자의 눈높이에 맞게 제공함으로써 삶의 질 향상

□ 조감도



약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
II-3	복지	지역문화는 더 다채롭게	가평군	계속	장기	임기 외
추진부서	행정복지국	행복돌봄과	복지시설팀장	최태양(2228)	담당자	조영운(2253)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	45%

□ 추진방향

- 민선8기 공약사업으로 4개 권역에 어린이들이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 공간 및 프로그램을 마련하여 출산율을 높이는 정책 기여
- 아이들의 꿈과 상상력을 키울 수 있는 안전한 공간으로 4계절 이용 가능한 실내 어린이 놀이시설건립 및 연령에 맞는 다양한 키즈 프로그램으로 어린이들의 놀 권리 보장과 놀이문화 조성
- 가평군 주민들의 양육 환경 조성 및 가평군을 찾는 관광객들에게 어린이들이 재미있고 행복한 「힐링 가평」 으로의 밝은 이미지 고취시킴

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 9. ~ 2026. 6. ※ 조종권역 '26.12월, 설악권역 '27.6월 준공 예정
- 사업위치: 청평면 청평리 405-4번지 일원, 조종면 현리 419-11번지 일원, 설악면 미정
- 사업규모: 3개소(청평면, 조종면, 설악면)
- 소요예산: 26,500백만원 ※ 공약실천계획서: 26,440백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	26,500		25,106	6,000	7,896	4,900	5,450	860	1,394	
국비										
도비	8,896		8,896		1,896	2,000	5,000			
군비	17,604		16,210	6,000	6,000	2,900	450	860	1,394	
기타										

- 청평면 9,860백만원, 조종면 8,210백만원, 설악면 8,430백만원

○ 사업내용

- 실내 영유아·복합시설 건립(모험·창의 체험공간 및 놀이문화 조성)
- 사회재난 및 자연재난에 대비한 어린이 안전체험교실 구축

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	45
2022 하반기	어린이 놀이체험시설 조성 계획 수립	· 어린이 놀이체험시설 조성 총괄 계획수립	5	5
2023	청평·조종권역 놀이체험 시설 조성 계획 수립 및 건축설계용역 착수	· 청평·조종권역 어린이 놀이체험시설 추진계획 수립 · 청평·조종권역 어린이 놀이체험시설 조성 사전행정절차 이행 및 설계 공모 · 청평·조종권역 어린이 놀이체험시설 건축설계 및 전시물 제작 설치 착수	30	20
2024	청평·조종권역 놀이체험시설 설계	· 청평·조종권역 어린이 체험시설 - 설계공모 공고 및 심사위원회 실시 - 건축설계용역 착수(2024.10.)	30	20*
	설악권역 놀이체험시설 조성 계획 수립	· 설악권역 어린이 놀이체험시설 - 부지선정 및 추진계획 수립, 부지매입 - 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축위원회 심의(2024.12.)		
2025	청평·조종권역 놀이체험시설 착공	· 청평·조종권역 설계용역 완료 - 공사착공 및 준공(2025. 5. ~ 2026.10.) - 설계공모 및 건축설계 및 전시물 제작·설치 용역 착수, 완료	25	
2026 상반기	청평·조종권역 놀이체험시설 준공	· 청평·조종권역 어린이 체험시설 - 공사 준공(2026.10.)	10	
	설악권역 놀이체험시설 준공	· 설악권역 어린이 실내놀이체험시설 - 공사 착공 및 준공(2026. 1. ~ 2027. 6.)		

□ 추진실적

구 분		추진실적			비 고
		청평권역	조종권역	설악권역	
2022	3분기	· 민선8기 공약사업 실천계획 확정(청평역 역세권 활성화 공약사업과 통합) · 공약이행평가단 제1차 회의 / 2022. 9. 27. - 내용: 키즈프로그램, 청평면 역세권 활성화(영유아 놀이터) 사업 통합 - 사유: 사업 성격 중복에 따른 공약사업 하나로 통합			
	4분기	· 조성계획 수립 · 공유재산심의회 승인			
2023	1분기	· 건축기획용역 착수	· 조성계획 수립 · 공유재산심의회 승인 · 지방재정투자심사 승인		
	2분기	· 사업설명회 개최 · 공공건축사업계획 사전검토	· 공유재산 관리계획안 승인 · 건축기획용역 착수		
	3분기		· 사업설명회 개최 · 공공건축사업계획 사전검토 · 경기주택도시공사 공공 건설지원센터 현장 방문		

구 분		추진 실적			비고
		청평권역	조종권역	설악권역	
2024	4분기	· 유희부지 활용계획 보고 · 기본계획수립용역 완료 · 설계공모 계약의뢰 · 건축기획용역 완료	· 공공건설지원센터 사전검토의견서 회신		
	1분기	· 설계공모 공고 · 작품 심사 결과 발표 · 업체 선정	· 조성계획 변경 (사업비 증액)	· 건립부지 현장조사	
	2분기	· 실시설계용역 착수	· 공공건축심의위원회 심의 완료 · 건축기획용역 완료 · 공유재산 관리계획안 (변경) 승인	· 건립계획 수립 · 공유재산 관리계획안 승인	
	3분기		· 설계공모 공고		
	4분기	· 주민설명회 개최 · 중간보고회 개최 · 건립공사(건축) 계약체결 · 건축허가 접수 완료 · 완료보고회 개최	· 참가등록업체 미달로 설계공모 재공고 · 작품 심사 결과 발표 · 업체 선정 · 건축설계 및 전시물 제작설치 계약 의뢰	· 건축기획용역 착수	

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

구 분		향후계획			비고
		청평권역	조종권역	설악권역	
2025	1분기	· 공사 착공 및 준공 (~26.6월)	· 건축설계용역 착수 및 완료(~25.7월)	· 공공건축사업계획 사전검토 · 공공건축위원회 심의 · 설계공모 공고 · 건축설계 및 전시물 제작·설치 용역 착수 및 완료(~25.10월)	
	2분기				
	3분기		· 공사 착공 및 준공 (~26.12월)		
	4분기				
2026	1분기			· 공사 착공 및 준공 (25.12월~27.6월)	

구 분		향 후 계 획			비 고
		청평권역	조종권역	설악권역	
2027	2분기				
	3분기				
	4분기				
	1분기				
	2분기				

□ 기대효과

- 어린이가 마음껏 뛰어 놀 수 있는 안전한 공간을 마련하여 주인의식 성장과 지역에 대한 애정으로 질 좋은 양육환경 조성
- 권역별 어린이 놀이체험시설 건립으로 가평읍에 치우쳐진 문화공간에 대한 지역격차를 해소하여 아동의 놀 권리 보장 및 아동의 행복지수를 향상시키는 건전한 놀이문화 조성에 기여

□ 조감도(청평권역 어린이 놀이체험시설)



□ 조감도(조종권역 어린이 놀이체험시설)



약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

행복한 가정을 위한 아이돌보미사업 확대

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
II-4	복지	지역문화는 더 다채롭게	가평군	계속	단기	임기 내
추진부서	행정복지국	행복돌봄과	여성가족팀장	최윤정(2260)	담당자	주하진(2261)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 저출산·고령사회화의 심화로 군지역 인구비중이 1975년 25.1%에서 2015년 8.3%로 급감함에 따라, 우리군은 아이돌봄 본인부담금 지원 사업을 확대하여 건강한 양육환경을 조성하여 저출산 문제에 대응하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. 1. ~ 계속
- 지원대상: 가평군 아이돌봄서비스 이용 가구
- 사업규모: 480가구/연
- 소요예산: 380백만원 ※ 가평군과 유사한 경기도 아이돌봄사업 추진에 따라 군 자체사업비 120백만원 감소(대상 일부 동일)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	380		310		100	70	70	70	70	
국비										
도비										
군비	380		310		100	70	70	70	70	
기타										

○ 사업내용

- 우리군은 ‘가평군 아이돌봄서비스 지원’ 사업을 통하여 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정에 아이돌보미가 찾아가는 돌봄서비스를 제공하는 ‘아이돌봄 지원사업’을 이용하는 관내 이용자의 본인부담금 전부 또는 일부를 군비로 지원함
- 이에 우리군은 저출산에 대응하기 위한 맞춤형 인구정책으로 ‘가평군 아이돌봄서비스 지원’ 사업의 본인부담금 지원율 상향(일반가정 50%→60%)을 통하여 인구소멸 위기에 대응하고자 함

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022. 9.	기본계획 수립 및 협의 추진	· 시행계획 수립 · 조례 개정안 작성	20	20
2022.11.	방침 결재	· 조례 개정 방침 결재 및 입법예고 · 사회보장 변경협의(보건복지부)	20	20
2022.12.	조례 개정	· 사회보장 변경협의(보건복지부) 완료	30	30
2023. 5.	사업 시행	· 조례 개정 심의 완료 후 공포 · '가평군 아이돌봄서비스 지원' 확대 시행	30	30

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2022	3분기	· 아이돌봄미 사업 확대 추진계획 수립	
	4분기	· 조례 개정 관련 부서 협의 완료 · 사회보장제도 변경 협의 요청 및 완료(보건복지부) · 「가평군 아이돌봄서비스 지원」 조례 일부개정 - 방침 결재 및 입법예고 완료(의견없음)	
2023	1분기	· 제313회 가평군의회 임시회 안건 상정	
	2분기	· 「가평군 아이돌봄서비스 지원」 조례 공포 · 아이돌봄본인부담금 확대 시행	

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 없음

□ 향후계획

○ 보도자료 등을 통한 적극적인 사업 홍보

□ 기대효과

○ 양육 부담의 완화를 통해 일과 가정의 양립을 도모하고, 건강한 양육 환경 조성을 통하여 자녀 출산의 부담을 경감하여 저출산 문제에 적극적으로 대응

약속Ⅵ 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

보조기기 수리센터 운영

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅵ-2	복지	주민안전은 더 세심하게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	행정복지국	행복돌봄과	장애인복지팀장	이정아(2225)	담당자	손다운(2227)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 100%

□ 추진방향

- 장애인 등이 보조기기를 활용하는데 어려움이 없도록 적절한 수리서비스 제공 및 소득수준에 따른 수리비용 지원
- 2021년 10월부터 보조기기 수리업체를 지정하여 운영 중에 있음에 따라 향후 수리 센터의 효율적 운영과 관리를 위하여 연간 수리실적 및 수요추세에 따라 단계별 운영형태 결정 및 사업추진
 - '21. 8. 4.제정된 「가평군 장애인·노인 등을 위한 보조기기 수리비용 지원 조례」에 따라 '사단법인 경기도지체장애인협회 가평군지회(대표자 김영수)'를 보조기기 수리업체로 지정하여 운영 중에 있음

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 가평군
- 사업규모: 1개소
- 소요예산: 378백만원 ※ 수리센터 운영 인력 추가 채용 미추진에 따른 인건비 42백만원 감소

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	378	4	294	11	15	85	103	80	80	
국비										
도비										
군비	378	4	294	11	15	85	103	80	80	
기타										

○ 사업내용

- 보조기기 수리센터 운영 지원
- 장애인, 노인, 국가유공자 보조기기 수리비용 지원

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	수리업체 운영 지원 및 수리업체 지정	· ‘22. 7.~‘22.12. 수리업체 운영 및 수리비용 지원 · ‘22.11.~‘22.12. 수리업체 지정절차 추진(공개모집)	10	10
2023 ~ 2024	수리업체 운영 지원 및 운영형태 결정	· ‘23. 1.~‘24.12. 수리업체 운영 및 수리비용 지원 · ‘23.10.~‘24. 2. 사업추진 성과 검토 · ‘24. 3.~‘24. 4. 센터 운영형태 결정 (센터 설치·위탁 또는 업체 지정) · ‘24. 5.~‘24. 8. 센터 운영 및 지원을 위한 조례개정	60	60
2025 ~ 2026	수리센터 위탁 운영 또는 수리업체 지원	· ‘25. 1.~‘26. 6. 센터 운영 또는 업체 운영 지원 · ‘25. 1.~‘26. 6. 보조기기 수리비용 지원	30	30

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2022	4분기	· 보조기기 수리업체 지정 (사단법인 경기도지체장애인협회 가평군지회/2년)	
2023	2분기	· 가평군 장애인노인 등을 위한 보조기기 수리비용 지원 조례 - 일부개정 입법예고 (수리업체→수리센터, 경비 지원 근거 명시)	
	3분기	- 지방보조금관리위원회 및 조례규칙심의회 심의	
	4분기	- 의회 의결 및 조례 공포 · 2024년 본예산 편성(85백만원)	
2024	1분기	· 수리센터 운영 인력 채용(2명) 및 1분기 운영 보조금 교부	
	2분기	· 수리센터 관리시스템 도입 및 2분기 운영 보조금 교부	
	3분기	· 수리센터 3분기 운영 보조금 교부	
	4분기	· 수리센터 4분기 운영 보조금 교부 · 보조기기 수리센터 재지정 (사단법인 경기도지체장애인협회 가평군지회/2년)	

○ 보조기기 수리업체를 통한 보조기기 수리 지원

기 간	계	‘22. 7. ~ ‘22.12.	‘23. 1. ~ 12.	‘24. 1. ~ 12.
수리건수	284건	34건	113건	321건
수리비(천원)	29,574	4,320	14,705	15,927
수리비 총액 (본인부담금 포함)	42,876	6,144	22,095	22,783

□ 향후계획

○ 보조기기 수리센터 운영 및 수리비용 계속 지원(~ 2026.)

□ 기대효과

○ 가평군에 거주하는 장애인·노인 등이 보조기기를 편리하고 안전하게 사용함으로써 삶의 질이 향상될 수 있는 기반 마련

일 자 리 정 책 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
3개 사업						66.7%	
I -1	지역성장을 위한 청정산업단지 기반조성	가평군 민간	신규	2028 (임기외)	정상추진	30	
I -3	가평 2030 청년 지원(눈높이 청년복지)	가평군	계속	2026 (임기내)	정상추진	70	
I -5	일자리 창출 (다문화, 군인가족, 경력단절 여성 등)	가평군	계속	2026 (임기내)	이행후 계속	100	금회 완료

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

지역성장을 위한 청정산업단지 기반조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-1	경제	군민생활은 더 풍요롭게	가평군·민간	신규	장기	임기 외
추진부서	경제산업국	일자리정책과	기업지원팀장	박정일(2275)	담당자	최원정(2277)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	30%

□ 추진방향

- 지역성장 기반 마련을 위한 청정산업단지 조성 사업 추진
- 실수요자 중심으로 첨단 및 바이오 산업 위주의 친환경 업종을 우선 배치
- 기 추진 중인 사업과 연계하여 순차적으로 추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2028.
- 사업위치: 관내 2개소(상면 태봉리 105번지 일원, 설악면 창의리 214-1 일원)
- 사업규모: 일반산업단지 2개
- 소요예산: 22,526백만원 ※ (공약실천계획서: 13,700백만원)
상면 GH 협약 체결에 따른 GH 부담액, 군 부담액 증가 / 설악면 민간개발로 미포함

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	22,526		8,986			26	700	8,260	13,540
국비									
도비									
군비	8,926		4,386			26	700	3,660	4,540
기타	13,600		4,600					4,600	9,000 GH

○ 사업내용

구분	세부내용	비고
상면 일반산업단지	· 1개소(제조업, 첨단 중심)	
	· 공영개발	
	· 약 13,600백만원(GH 부담) / 약 8,900백만원(진입도로 군 부담)	협약체결
설악면 일반산업단지	· 1개소(바이오, 의료 중심)	
	· 공영 또는 민간개발	
	· 약 13,000백만원	

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	30
		2권역(상면)	3권역(설악면)	
2022 하반기	[상면] 산업단지 지정계획 반영	· 산업단지 지정계획 작성 및 제출(심의)	10	10
2023	[상면] 산업단지 공동추진 협의	· 경기주택도시공사 (균형발전처) 실무협의	10	10
2024	[상면] 업무협약 체결 [설악면] 산업단지 지정계획 반영	· 가평군-경기주택도시공사 업무협약 체결 · 산업단지계획 수립 용역	20	10*
2025	[상면] 산업단지계획 승인 [설악면] 산업단지계획 수립	· 산업단지계획 심의 (도, 국토부) 및 고시 · 공사 착공	30	
2026 상반기	[상면] 공사 준공	· 공사 준공	30	
2028	[설악면] 공사 준공	· 공사 준공		

□ 추진실적

구 분		추진 실적		비 고
		2권역(상면)	3권역(설악면)	
2023	1분기	· 산업단지 지정계획 고시 · 경기주택도시공사 업무 협의(3회) - 입주수요용역 추진 방안 협의 등		
	2분기	· GH 업무협의(2회/관내업체 입주의향) · 벤치마킹(양평군) · GH 자체 입주수요조사 용역 추진 · 입주의향서 모집(12개 업체)		
	3분기	· GH(경기주택도시공사), 경기도형 산업단지 융복합 모델 및 추진전략 수립 용역 추진(~24.10월)		
	4분기	· 가평군수-경기주택도시공사 이사장 면담(공동추진 건의) · 공약이행평가단 제3차 회의 / 2023. 11. 16. - 내용: 사업기간(~2026—2028), 사업위치 일부(1권역/가평읍·북면) 제외 등 - 사유: ‘지구단위계획’ 변경, 공동추진 경기주택도시공사 용역 결과 등에 따라 조정	· 입주수요조사 용역 예산 확보(30백만원)	

구 분		추진 실적		비고
		2권역(상면)	3권역(설악면)	
2024	1분기	· 경기주택도시공사 사장 방문 업무협의	· 입주수요조사 용역사 미팅(5회) · 입주수요조사 용역 착수 · 경기도 산업입지와 업무협의	
	2분기		· 민간사업시행 관심 업체 면담 · 민간개발사업 시행자 발굴	
	3분기	· 경기주택도시공사 사장 방문 업무협의	· 민간사업시행자(민간단독 및 민관합동개발 등) 공모 사례 파악 · 입주수요조사 용역 준공 (기투자 26백만원)	
	4분기	· 벤치마킹(양평군) · 경기주택도시공사와 상생 협약 체결	· 민간사업시행자 발굴 공모(1.2차)	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 신규 산업단지 조성 시 장기간 많은 예산이 소요되기 때문에 군 재정부담 증가
 - 군 예산 부담을 최소화 하고 효율적인 산업단지 조성사업 추진을 위해
- 경기주택도시공사와 공동추진(상면) 및 민간사업자 공모(설악면) 등의 방식으로 추진

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획		비고
		2권역(상면, 조종면)	3권역(설악면)	
2025	1분기		· 민간개발사업 시행자 2차 공모	
	2분기	· 산업단지계획(안) 수립 : 700백만원 * 산업단지계획(안) 및 제영향평가 (전략환경, 재해, 교통, 경관 등) 용역 실시	· 경기도 산업입지와 및 민간개발사업 시행 관심 기업과 관련 협의(계속)	
	3분기	* 관계부서 협의 및 주민설명회 실시 (산업단지계획 및 제영향평가 설명, 주민의견 수렴 등)	· 산업단지 물량배정(국토부 → 지자체)	
	4분기		· 민간사업자 공모 및 선정 · 산업단지 지정 계획 반영	
2026		· 산업단지 조성에 따른 분담 사업비 확보 - (GH안) “가평 상면 일반산업단지 사업화방안 검토 보고서(GH)” 의 진입도로 분담비 8,900백만원 - (가평 일반산업단지 개발계획상) GH 부담 사업비 13,600백만원	· 산업단지계획 수립 용역 및 제영향평가 추진	
2027		· 산업단지계획심의위원회 및 수도권정비위원회 심의	· 산업단지계획심의위원회 및 수도권정비위원회 심의	
2028 ~		· 공사 착공 및 준공	· 공사 착공 및 준공	

□ 기대효과

- 지역성장 및 균형 발전을 위한 산업 기반 조성 마련, 고용창출을 통한 인구 증대 효과 등

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

가평 2030 청년 지원 (눈높이 청년복지)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-3	경제	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	일자리정책과	청년팀장	임미경(2951)	담당자	김우식(4169)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	70%

□ 추진방향

- 청년에게는 안정적이고 장기적인 직업생활을 유도하여 지역에 정착할 수 있는 기반 마련
- 기업에는 다양한 역량을 가진 인력 지원을 통한 일자리 창출
- 인구감소, 청년유출 등으로 어려움을 겪고 있는 지역에 청년 유입을 통해 활력 제고

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업규모: 매년 약 3~10명
- 소요예산: 1,084백만원 ※ (공약실천계획서: 3,794백만원/지역주도형 청년일자리 사업 일몰 및 참여자 미달로 감소)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	1,084		1,084	478	480	104	15	7		
국비	518		518	239	236	39	4	-		
도비	129		129	61	57	10	1	-		
군비	360		360	142	151	50	10	7		
기타	77		77	36	36	5	-	-		

※ 기타: 인건비, 인센티브 지원에 대한 기업 자부담 금액

※ 작성대상: 지역주도형 청년일자리사업(보조, 자체, 교통비지원), 청년 면접 지원 사업

○ 사업내용

- 미취업 청년 채용 시 인건비 및 교육컨설팅 지원(1인 월 최대 180만원(인건비의 90%) 2년간 지원)
- 2년 지원 종료 후 정규직으로 계속 근무 시 인센티브 1,000만원 분기별(250만원) 지급
- 참여자 역량강화 교육 및 컨설팅, 네트워킹 지원, 참여자 교통비 지원 사업 등
- 청년 면접 지원 사업

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	70
2022	국·도비 예산 확보 등	· 2023년 예산 확보 및 사업 계획 수립 등	10	10
2023	국·도비 예산 확보 등	· 2023년 사업 참여자 모집, 선발 및 보조금 지원 · 2024년 사업 계획 수립 등 · 2025년까지 보조금, 인센티브 지원예산 확보	30	30
2024	청년일자리 창출	· 2024년 사업 참여자 모집, 선발 및 보조금 지원 · 2025년 사업 계획 수립 등 · 2026년까지 보조금, 인센티브 지원예산 확보	30	30
2025	청년일자리 창출	· 2026년 사업 계획 수립 등 · 기 청년일자리사업 참여자에 대한 보조금 지급	20	
2026 상반기	청년일자리 창출	· 기 청년일자리사업 참여자에 대한 보조금 지급	10	

□ 추진실적

구 분		추진실적				비 고
		청년 일자리	청년 인턴십	청년 면접	지역주도형 교통비	
2023	1분기	· 사업 참여자 모집·심사 및 청년-기업 매칭·선발 완료		· 사회보장제도 신설 협의 완료		
	2분기	· 지역주도형 청년일자리사업 참여자 역량강화 교육 실시				
	4분기	· 보조금(157건/ 279,033천원) · 인센티브(32건/ 80,000천원)		· 사업홍보 실시 · 보조금(8건/ 389천원)	· 보조금(26명/ 7,700천원)	
2024	1분기		· 추진 계획 수립 · 기업-청년 모집 공고 및 선정 (기업 3곳 - 청년 4명 매칭) · 인턴십 협약 체결	· 확대 추진 (정장대여비 → 정장대여비, 증명사진, 헤어· 메이크업 지원) 사업 홍보·참여자 지원 (~추진중)		
	2분기			· 관내 사진관, 면접 실시기관 및 유관기관 등 방문 홍보		

구 분		추진 실적				비고
		청년 일자리	청년 인턴십	청년 면접	지역주도형 교통비	
	4분기	· 보조금(15건/ 26,959천원), · 인센티브(27건/ 67,500천원)	· 인턴십 근무 · 보조금(36건/ 46,800천원) · 본예산 삭감	· 지원금(16건/ 880천원)	· 보조금(5명/ 750천원)	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 청년 인턴십 지원 사업 2025년 본예산 삭감
- 지역주도형 청년 일자리(국도비사업) 일몰로 2024년부터 신규 참여자 없음
 - 기존 사업 참여자까지 인센티브 지급

□ 향후계획

구 분		향후계획				비고
		청년 일자리	청년 인턴십	청년 면접	지역주도형 교통비	
2025	1분기	· 기존 참여자 인센티브 지급		· 사업 확대를 통한 지원 방법 다양화 및 홍보		

□ 기대효과

- 청년에게 근로소득의 기회를 제공하여 삶의 질 향상 및 생활안정을 도모함

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

일자리 창출 (다문화, 군인가족, 경력보유 여성 등)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-5	경제	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	일자리정책과	일자리정책팀장	정진숙(2270)	담당자	박현화(2274)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 관내 다문화, 군인가족 및 경력보유 여성의 지역 특수성을 고려한 맞춤형 취업 지원 및 일자리 창출 대책 마련
- 가평군 일자리센터 취업상담 운영을 통한 취업교육 프로그램 수요 파악, 일자리 상담, 취업알선 및 연계 등 one-stop 취업 서비스 제공
- 「2022 가평군 일자리인식 실태조사」 분석에 따른 경력보유 여성의 일자리 수요 반영

□ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업규모: 「가평군 일자리박람회」, 「권역별 채용박람회」(추가),
맞춤형 취업지원프로그램, 읍·면별 찾아가는 일자리 이동상담소
- 소요예산: 432백만원 ※ (공약실천계획서: 495백만원) 신규사업 지양 및 행사성 사업예산 동결로 48백만원 등 감소

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	432		327		72	75	75	105	105	
국비										
도비										
군비	432		327		72	75	75	105	105	
기타										

○ 사업내용

구분	사업내용	비고
	총 4개 사업	
1	『가평군 일자리박람회』 • 추진규모: 연 1회 • 추진장소: 한석봉체육관 • 추진내용: 사전알선을 통한 1:1 현장면접 및 구직상담, 이력서 작성 및 간접참여업체 입사지원 대행 서비스 제공 • 협업추진: 행복돌봄과, 가평군건강가정·다문화가족지원센터, 여성새일센터	

구 분	사 업 내 용	비 고
	총 4개 사업	
2	『권역별 채용박람회』 - 추진규모: 상반기 권역별 3회 - 추진장소: 권역별 행정복지센터 - 사업대상: 관내 구직자 및 구인 업체 - 추진내용: 1:1 오프라인 현장 면접 및 간접 업체 지원 대행 서비스 제공, 맞춤형 취업 연계, 국민취업지원제도 관련 홍보 및 취업 연계	
3	『다문화, 군인가족, 경력보유 여성 맞춤형 취업지원프로그램 운영』 - 추진규모: 연 2회 - 추진장소: 군부대 지정 장소 및 가평군여성비전센터 - 사업대상: 관내 군인가족 및 여성 등 40명 / 회당 20명 - 추진내용: 수요 조사 결과에 따른 맞춤형 교육과정 운영, 교육수료자 대상 관내 취업정보 제공 및 취업 적극 연계	
4	『읍·면별 찾아가는 일자리 이동상담소 운영』 - 추진규모: 연 9회 - 추진장소: 각 읍·면 행정복지센터 등 - 사업대상: 관내 다문화·군인가족·경력보유 여성 - 추진내용: 설악면·상면·조종면 운영 시 다문화·군인가족 여성 중점 추진 및 참여 유도, 구직 등 상담 지원 및 지속적 정보 제공	

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	100
2022 하반기	수요조사 실시 및 결과 바탕으로 교육과정 선정	· 군인가족 대상 자격증 취득과정 사전 수요조사 실시 (‘22.10월중)	-	-
2023 ~ 2025	다문화·군인가족·경력보유 여성 일자리창출	· 「권역별 채용박람회」 개최(연 3회) · 「가평군 일자리박람회」 개최(연 1회 / 하반기) · 군인가족(경력보유 여성) 맞춤형 자격증 취득과정 운영(연 2회) · 읍·면별 일자리 이동상담소 운영 (연 9회 / 상반기 3회, 하반기 6회)	90	100
2026 상반기		· 군인가족(경력보유 여성) 맞춤형 자격증 취득과정 운영(상반기 1회) · 읍·면별 일자리 이동상담소 운영(상반기 4회)	10	

*2023~2025: 매년 30% 목표 이행 (박람회 개최 10%, 취업지원프로그램 10%, 이동상담소 운영 10%)

□ 추진실적

* 박람회 개최, 취업지원프로그램 운영, 이동상담소 운영 취업연계 추진실적은 사업에 참여한 전 연령·계층으로 함

① 가평군 일자리박람회 개최(대규모)

구 분	참여업체· 구인인원	방문인원 (구직자)	구직 등록	직접업체 취업실적		간접업체 취업실적		2차 면접
				면접인원	채용인원	알선인원	채용인원	
2023.09.14.	50개, 215명	550	178	203	7	20	-	103
2024.10.17.	50개, 162명	504	209	318	13	20	-	284

② 권역별 채용박람회 운영(중규모) (단위: 명)

구 분	방문인원	구인인원	구직(등록) 인원	현장 면접자	간접 알선	채용결과	
						직·간접 채용	2차면접
계	814	922	555	621	100	90	252
2022(6회)	388	455	243	295	44	40	120
2023(3회)	178	269	131	138	28	20	54
2024(3회)	248	198	181	188	28	30	78

③ 찾아가는 일자리 이동상담소 운영 (단위: 명, 장)

구분	운영횟수	방문인원	구인등록	구직등록	홍보리플렛 배부
계	24회	1,160	22	628	2,149
2022	6회	187	5	94	494
2023	9회	538	8	293	911
2024	9회	435	9	241	744

④ 취업지원프로그램 운영 (단위: 명)

구분		수료인원
계		72
2023	청년층 OA마스터(ITQ자격증) 취득과정	19 (다문화 4, 그 외 15)
	다문화, 군인가족, 경력보유여성 취업코칭 교육	19 (다문화 2, 군인가족 3, 경력보유 14)
2024	다문화, 군인가족, 경력보유여성 바리스타 2급 자격증 취득과정	18 (다문화 2, 군인가족 7, 경력보유 9)
	청년층 컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득과정	16 (경력보유 6, 그 외 10)

□ 현장사진(일자리박람회)



□ 향후계획

- 취업취약계층 대상 맞춤형 취업 지원 및 일자리 창출 사업 지속 추진

□ 기대효과

- 다문화·군인가족·경력보유 여성의 직무 역량 강화 및 경제활동 참여 촉진

소 상 공 인 지 원 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
2개 사업						90%	
I -2	소상공인 생존·활력 프로그램 추진	가평균	계속	2026 (임기내)	이행후 계속	100	금회 완료
I -4	조종면 전통시장 활성화 지원	가평균	신규	2025 (임기내)	정상추진	80	

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

가평군 소상공인 생존·활력 프로그램 추진

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-2	경제	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	소상공인지원과	소상공인지원팀장 소비자지원팀장	최윤영(2205) 김남희(4881)	담당자	정운숙(2206) 김가영(2953)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 가평군 소상공인 경영안정 확대지원을 통한 경영위기 극복과 성장 역량강화
- 가평군 소상공인 연합회의 조직성장 및 역량강화를 위해 사업추진계획 단계적 지원

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업대상: 가평군 소상공인
- 사업규모: 경영안정지원사업 7개 내외
- 소요예산: 24,915백만원 ※ (공약실천계획서: 21,970백만원) 경기도종합체육대회 소상공인 참여업체 시설 개선 지원 확대 및 공모사업 선정, GP페이 확대 등으로 2,945백만원 증가

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	24,915		24,915	4,394	4,087	7,646	4,394	4,394		
국비						1,071				
도비	1,988		1,988	269	228	953	269	269		
군비	19,136		19,136	3,445	3,859	4,942	3,445	3,445		
기타	2,270		2,270	680		680	680	680		

○ 사업내용

- 소상공인 경영안정지원사업 지속·확대추진
- 소상공인 연합회 조직성장 지원

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	소상공인 경영위기 극복과 성장역량강화	· 창업 및 노후 점포 경영환경개선사업 · 소상공인 위기극복 자금 지원사업 · 찾아가는 소상공인 매니저 운영사업(완료) · 소상공인 경영컨설팅 지원사업(완료) · 가평군 지역화폐사업 확대 · 공공배달앱 운영 확대	20	20
2023		· 소상공인 경영환경개선사업 · 소상공인 위기극복 자금 지원사업 · 소상공인 홍보 마케팅 지원사업(신규) · 폐업 소상공인 사업정리와 재기지원(신규) · 가평 맛집·멋집 챙겨 투어(신규) · 가평군 지역화폐사업 확대 · 공공배달앱 운영 확대 · 소상공인 연합회 조직성장 지원	20	20
2024		· 소상공인 경영환경개선사업 · 소상공인 홍보 마케팅 지원사업 · 경기도 골목상권 활성화 사업 공모 추진 · 가평 맛집·멋집 챙겨 투어 · 첫 출발 응원 창업 소상공인 지원사업(신규) · 가평군 지역화폐사업 확대 · 공공배달앱 운영 확대 · 소상공인 연합회 조직성장 지원	20	60
2025		· 소상공인 경영안정지원사업 지속·확대추진 · 가평군 지역화폐사업 확대 · 공공배달앱 운영 확대 · 소상공인 연합회 조직성장 지원	20	
2026 상반기		· 소상공인 경영안정지원사업 지속·확대추진 · 가평군 지역화폐사업 확대 · 공공배달앱 운영 확대 · 소상공인 연합회 조직성장 지원	20	

□ 추진실적

- 2022년 찾아가는 소상공인 매니저 운영(완료)
 - 기간: 2022. 6월 ~ 12월
 - 내용: 방문 및 상담 165건, 사업 홍보·안내를 위한 소상공인 정보 일제조사 2,593개소
- 소상공인 경영컨설팅 추진(완료): 「2022년 가평 힐링 맛집 만들기」15개소, 99백만원
- 2023년 소상공인 동절기 긴급난방비 접수 및 지원 : 3,695업소 / 739백만원
 - 지원업소당 지역화폐로 20만원 지원
- 2024년 첫 출발 응원 창업 소상공인 지원 사업: 21개소/ 20백만원
 - 2024년 창업 관내 소상공인 인테리어, 스마트 결제시스템 등 지원

○ 소상공인 경영환경개선사업 추진

(2024.12.31. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

연도	예산액	집행액(예정)	접수업체	선정업체	업소당 지원금액
총계	3,224	3,220	1,137	673	최대 500만원 이내
2022	750	746	287	175	
2023	900	900	449	178	
2024	1,574	1,574	401	320	

○ 소상공인 홍보 마케팅 지원사업 추진

(2024.12.31. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

연도	예산액	집행액(예정)	접수업체	선정업체	업소당 지원금액
2023	100	100	135	42	최대 200만원 이내
2024	40	40	59	50	최대 80만원 이내

○ 소상공인 위기극복 경영안정자금 지속·확대지원

- 이자차액 보전 이자율 기존 2% → 3% 상향 지원(2023.1.1. 특례보증부터)
- 이자차액 보전 금융기관 확대(2023.4.12.부터 NH농협, 새마을금고, 가평신용협동조합)
- 「2020년 행정명령대상 영세사업자 특례보증」잔여 출연금 가평균 특례보증 재원 편입: 70백만원
(2024.12.31. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

연도	특례보증		이자보전금(분기별)		신용보증료(2022.4.~)	
	업체	지원액	업체(누적)	지원액	업체	지원액
총계	558	14,212	435	375	509	512
2022	155	4,141	435	128	108	114
2023	171	4,371		154	169	171
2024	232	5,700		93	232	227

○ 경기도 골목상권 공동체 지원사업 공모 선정

(2024.12.31. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

연도	사업명	지원액	지원대상	비고
		485		
2023	성장지원	40	가평군조종면펜션협회 외 4개소	개소당 8백만원
	골목상권 상인회 · 연합회 매니저 지원사업	22	가평군소상공인연합회	
	상인회간 연합	40	백둔리 상가번영회 외 1개소	개소당 2천만원
2024	성장지원	20	가평읍상인회 외 3개소	개소당 5백만원
	골목상권 상인회 · 연합회 매니저 지원사업	26	가평군소상공인연합회	
	신규조직화	22	1939음악역상인회	
	대학협업	20	경기대학교-백둔리상가번영회	
	경기살리기 통큰세일	70	가평군농어촌민박협회 외 3개소	개소당 5백~5천만원
	경기도 브랜드거리 육성사업	200	상면상가번영회	
	추석맞이 민생회복 프로젝트	25	소상공인연합회 외 3개소	개소당 5백~천만원

○ 자라섬 꽃 페스타 할인이벤트 추진

(2024.12.31. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

연 도	예산액	지원대상	내용	비 고
총 계	24			
2023	8	봄 50/가을 22	축제 기간에 참여업소 홍보 및 종량제 봉투 제공	봄/가을 2회
2024	16	봄 35/가을 36		

○ 가평GP페이 추진 실적

(2024.12.31. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

연 도	판매량	할인금액(보전금)	유통량	비 고
총 계	139,467,500	10,239,845	135,829,191	0
2021	19,360,674	1,506,509	18,970,030	
2022	40,917,484	3,056,919	39,599,075	
2023	41,825,467	3,012,563	41,166,156	
2024	37,363,875	2,663,854	36,093,930	

○ 공공배달앱 「배달특급」 추진 실적

(2024.12.31. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

연 도	사업비	가맹점 수	주문건수	거래액	비 고
총 계	510,200	1,360	134,849	3,769,234	0
2021	45,200	258	7,136	186,509	
2022	155,000	321	36,282	991,220	
2023	155,000	357	40,877	1,148,694	
2024	155,000	424	50,554	1,442,811	

□ 향후계획

- 지역화폐 이용 활성화를 위한 축제·행사·정부지원금 등 신규 시책 발굴 및 지급
- 배달특급 가맹점 및 이용자 프로모션(이용자 쿠폰 지급 등) 확대
- 타부서 교육 또는 행사시 홍보 리플렛 배부를 통한 배달특급 가입 홍보 안내
- 가평 군민의 날 홍보 부스 설치 및 오프라인 캠페인 실시
- 소상공인의 날 기념식 행사 지원
- 군 홈페이지, 군정소식지, SNS 등 매체를 활용하여 배달특급 수시 홍보
- 소상공인 지원사업 신규 발굴 및 지원

□ 기대효과

- 소상공인 경영안정 확대지원을 통한 지속성장 강화와 자립기반 확충
- 경기도 골목상권 활성화 공모사업 추진을 통한 지역경제 발전 도모
- 가평군소상공인연합회 사업추진계획 단계적 지원을 통한 조직성장 및 역량강화

□ 사진

경영환경개선사업 (전/후)



공공배달앱 배달특급 홍보부스 운영



약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

조종면 전통시장 활성화 지원

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-4	경제	군민생활은 더 풍요롭게	가평군·민간	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	소상공인지원과	시장관리팀장	김상일(2267)	담당자	이상기(2278)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	80%

□ 추진방향

- 전통시장 상인회 등록 및 전통시장 인정 절차 지원
- 전통시장 공모사업과 직접 지원을 통한 시장 홍보 및 상권 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2025. 12.
 - 사업위치: 가평군 조종면 현리 중심상권 일원
 - 주요내용
 - 상인회 등록 및 전통시장 인정
 - 시장 홍보물 설치(시장 홍보 상징조형물, 시장안내도) 및 공모사업 추진
 - 소요예산: 508백만원 * (공약실천계획서: 1,171백만원 / 공모사업 신청 기준 등에 따른 미확보)
- 연말 통큰세일 공모 선정으로 10백만원 증가

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	508		508			208	300		
국비	150		150				150		
도비	74		74			74			
군비	284		284			134	150		
기타									

- 전통시장 홍보 상징조형물 및 시장안내도 제작·설치: 120백만원(군비) * 당초 200백만원
- 전통시장 공모사업 신청 및 추진
 - 2025년 첫걸음시장지원사업: 300백만원(국비 50%, 군비 50%)
 - ※ 중기부 및 경기도 공모사업 계획에 따라 공모사업 신청연도 등이 변동될 수 있음
 - ※ 공모사업 신청 기준(상인회 가입 60% 이상) 충족 여부 중요 ※ 현재 281개 점포 중 140개 완료

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	80
2022 하반기	상인회 등록 및 전통시장 인정 준비	· (가칭)조종면 전통시장상인회 구성 준비	30	30
2023		· 상인회 등록 및 전통시장 인정	30	30
2024	전통시장 홍보사업 추진 및 경기도 공모사업 신청	· 전통시장 홍보 상징조형물 및 시장안내도 설치 · 전통시장 활성화를 위한 플리마켓 등 행사지원	20	20
2025	중소벤처기업부 공모사업 신청	· 첫걸음시장사업 공모사업 신청	20	

□ 추진실적

구 분		추진실적	비 고
2023	4분기	· (가칭)조종면전통시장 상인회 설립을 위한 회의 등 개최(6회) · 조종시장 인정 및 상인회 등록	
2024	1분기	· 「2024년 경기 전통시장매니저 육성」공모사업 선정 및 시장매니저 채용 · 전통시장 활성화 상인교육('24. 3.26. ~ 28.) · 경기도상인연합회 「2024년 전략적 마케팅 지원」 공모사업 선정(30백만원)	
	2분기	· 경기도시장상권진흥원「경기살리기 통큰세일」 공모사업 선정(10백만원) · 가평군(문화체육과) 「2024년 피크닉콘서트 및 버스킹」공연(5.9, 6.29) · 조종시장(전통시장), 온누리카드 활성화를 위한 소상공인시장진흥공단-수도기계화 보병사단 업무협약 체결(6.27) [가맹인력 지원, 가입혜택 제공, 사용인증 이벤트 진행]	
	3분기	· 소상공인시장진흥공단, 카카오 「2024년 단골시장 특채널 지원사업」 공모 선정 · 전통시장 홍보 상징조형물 및 시장안내도 제작설치 계약체결 및 착수 · 경기도시장상권진흥원 「추석맞이 소상공인 민생회복 프로젝트」 공모사업 선정(10백만원) · 소상공인시장진흥공단 「2025년 전통시장 활성화 지원사업(시장경영패키지)」 공모 신청(45백만원, 국비 80%, 지방비 20%)	
	4분기	· 경기도시장상권진흥원 「2025년 경기 전통시장매니저 육성사업」 공모 신청 (31백만원, 도비 50%, 지방비 50%) · 경기도시장상권진흥원 「연말 경기살리기 통큰세일」 공모사업 선정(10백만원)	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 전통시장 활성화를 위한 플리마켓 등 행사지원
 - ‘24년 제1회 추경에 민간행사사업보조로 예산편성 미반영되었으나 경기도 보조의
「2024년 전략적 마케팅 지원」, 「경기살리기 통큰세일」 사업으로 추진

□ 향후계획

- 전통시장 홍보 상징조형물 및 시장안내도 설치: 2024. 8. ~ 2025. 1.
- 전통시장 홍보, 공모사업 등 활성화 지원사업 추진: 2024. ~ 2025.

□ 기대효과

- 전통시장 인정으로 정부 및 도 지원 사업을 활용한 상권 활성화
- 전통시장 상인역량 및 자생력 강화로 지역경제 발전 기여

□ 사진



문 화 체 육 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
5개 사업(폐기 1)						65%	
III-2	가평 역사박물관 건립	-	-	-	-	-	폐기
III-3	(지역예술인과 함께 하는) 음악역1939 피크닉 콘서트	가평군	신규	2026 (임기내)	이행후 계속	100	금회 완료
VI-3	파크골프장 확충	가평군	신규	2025 (임기내)	정상추진	50	
VI-4	상면 생활문화체육시설 및 공간조성	가평군	신규	2026 (임기내)	정상추진	40	
VI-5	설악면 생활문화체육시설 및 주차장 확보	가평군	신규	2025 (임기내)	정상추진	70	

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

가평 역사박물관 건립

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-2	관광	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	장기	임기 외
추진부서	경제산업국	문화체육과	문화예술팀장	-	담당자	-
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☒ 폐기				공정률	-

- **변경내역** (공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3.19.)
- 역사박물관 부지 접근성 부족, 소장 유물 다양성 및 수량 부족 등 설립타당성 결과 부적정으로 부지 마련 절차, 기본계획변경 검토용역 필요에 따라 공약사업에서 제외

- **추진방향**
- 공립 박물관이 전무한 가평군에 군민의 역사에 대한 정체성을 확립
 - 가평의 역사적 시대 흐름과 인물, 문화, 민속, 산업 등 다양한 분야를 조명하는 박물관 건립
 - 가평의 역사인물을 알리고 교육 체험할 공간의 마련

- **사업개요**
- 사업기간: 2022 ~ 2028
 - 사업위치: 가평읍 대곡리 산25번지 일원
 - 사업규모: 부지면적 14,201㎡ / 건축 연면적 3,180㎡(지하 1층, 지상 1층)
 - 소요예산: 17,969백만원 ※ 확보예산: 총 200백만원(23년: 200)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	17,969	62	10,339		838	1,934	4,729	2,838	7,568	
국비	5,906		2,953				1,731	1,222	2,953	
도비										
군비	12,063	62	7,386		838	1,934	2,998	1,616	4,615	
기타										

- 사업내용
 - 가평 역사박물관(가칭) 건립
 - 박물관 내 역사인물 전용 전시실 설치 및 문화유적 체험을 위한 별도 공간 조성

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	-
2023	문체부 승인완료	· 문화체육관광부 역사박물관 설립 타당성 사전평가 (2023. 7. 29 의뢰, 4~16개월 소요예상)	15	-
2024	사전검토용역	· 1 ~ 8월: 건축기획용역, 사전검토, 공공건축위원회 심의, 투자심사 · 3 ~ 12월: 사업대상부지(군유지) 묘지이장(보상)	15	-
2025	실시설계	· 1 ~ 12월: 설계공모 및 실시설계, 건설기술심사	20	-
2026	공사착공	· 2 ~ 4월: 계약심사 · 5 ~ 12월: 공사착공	30	-
2027 ~2028	공사준공 및 개관	· 27. 1월 ~ 28. 3월 : 공사추진 및 준공 · 28. 6월 : 개관	20	-

□ 추진실적

- 2022. 8. 9.: 추진계획 방침결재 완료
- 2022.12.14.: 가평역사박물관 건립추진위원회 위원 재위촉 및 신규 위촉
- 2022.12.23.: 가평역사박물관 건립추진위원회 전문가 자문
 - 유물 수집 방향 및 범위, 유물 기증자 예우 방안 등
- 2023. 2. 7.: 2023년 유물수집계획 방침결재 완료
- 2023. 2.13.: 가평역사박물관 건립 유물구입 공고
- 2023. 4.11.: 행정사항 이행을 위한 공약사업 기간변경 완료
- 2023. 5. 4.: 가평역사박물관 건립 유물구입 완료(17건 277점)
- 2023. 7.21.: 문화체육관광부 사전 설립협의 완료
- 2023.10.27.: 문화체육관광부 공립박물관 설립타당성 사전평가(부적정)
- 2023.12.26.: 2차 유물구입 완료(12건 31점)
- 2024. 1.12.: 공약사업 제외 군수 방침결재 및 장기과제 전환
- 2024. 3.22.: 민선8기 공약사업 폐기
 - ※ 민선8기 공약이행평가단 공약사업 실천계획 등 변경심의결과 알림
기획예산담당관-6178(2024. 3. 22)호

□ 추진상 문제점

- 가평군 박물관 건립추진위원회: 접근성 부족 우려 (2021년 전문가 자문)
- 문화체육관광부 국립박물관 설립타당성 사전평가결과 부적정 (2023.10.27.)
 - ※ 전문적 별도 조직계획 미흡, 역사박물관 부지 접근성 부족, 소장유물의 다양성 및 수량 부족
- 가평군 시설직 부서장 현장실사 결과 부지 변경 검토의견
 - ※ 테니스장 지붕과 뒤편 임야로 인해 공간조망 부실, 주변시설과의 관련성 부족, 부지 경사도 개선 및 진입공간 확보를 위한 토목·건축공사로 예산 과다 투입 예상

□ 대책

- 현 위치 건립에 대한 부적정 의견이 다수임에 따라 대체 부지 마련절차 및 기본계획 변경 이행을 위한 검토용역 필요에 따라 공약사업 제외 (2024. 1.12. 군수 방침결재, 장기과제 전환 지시)
- 구입 및 기증 등 수집 된 유물의 공개를 통해 박물관건립 필요성을 군민에게 알리고 유물의 효율적 홍보를 위해 가평문화원 내 향토사료관(2층) 운영

【향토사료관 운영】

- 운영시기: 2025. 1월 ~ 박물관 개관 전까지
- 장 소: 가평문화원 향토사료실(2층)
- 운영주체: 가평군 직영
- 인 원: 학예사1, 기간제근로자2
- 공간구성: 유물전시실, 수장고 등
- 운영내용: 소장유물 기획전시, 상설교육, 유물 수집 등

- 소장유물의 다양성 확보를 위한 지속적 구입, 복제, 기증 등 필요

□ 기대효과

- 출토유물과 문화유산의 전시(기획전 포함) 및 이를 활용한 다양한 교육, 체험 행사의 진행으로 군민의 문화적·교육적 욕구충족 및 문화발전 기여

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

(지역예술인과 함께 하는) 음악역1939 피크닉 콘서트

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-3	문화	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국 문화체육과 공연기획팀장 홍복숙(4323)					
추진현황	□완료 ■ 이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 100%

□ 추진방향

- 지역 예술인들에게 무대에 설 수 있는 기회를 제공함으로써 지역민의 문화예술적 욕구 충족 및 역량강화를 이룸과 동시에 지역 상권 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 사업위치: 가평읍 음악역 1939 야외공연장 일원 및 실내공연장 ※ 기상상황에 따른 선별추진
- 사업규모: 야외 공연 1식(년 15회, 월 2~3회)
- 소요예산: 525백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	525		525		150	150	150	75		
국비										
도비										
군비	525		525		150	150	150	75		
기타										

○ 사업내용

- 지역 예술인 및 전문 아티스트 야외 공연(피크닉 분위기 연출)
- 지역 예술인 참여한 출연팀 구성
- 지역 예술인 모집 공고를 통한 인적자원 구성
- 읍·면별 공연 희망일자 및 장소 조사(2월 한)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2023	공연 15회 추진	음악역1939 야외공연장에서 지역 아티스트(당초 주민출연팀) 공연 추진	30	30
2024	공연 15회 추진		30	70
2025	공연 15회 추진		30	
2026	공연 8회 추진		10	

□ 추진절차

○ 공연 수요조사 → 용역 계약 → 공연 → 마무리 및 최종 평가

□ 추진실적

구 분	공연횟수	공연장소	참여인원(예상) 1회 당 200명	참여인원(예상) 1회 당 4팀	비 고
2022	15회	음악역1939 (가평군 일원)	3,000명	60팀	
2023	15회		3,000명	60팀	
2024	15회		3,000명	60팀	

□ 향후계획

○ 군민들의 수요를 반영해 공연 기획 수립 및 추진

□ 기대효과

○ 음악역1939 내 야외 및 실내 공연장에 관내 지역예술인들이 상설 공연할 수 있는
장소를 제공하여 문화적 역량을 강화하고 가평주민의 문화예술 향유기회 증진

□ 사진



약속VI 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

파크골프장 확충

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
VI-3	체육	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국 문화체육과 문화체육시설팀장 장성세(2510)					
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	50%

□ 추진방향

- 파크골프장 조성으로 문화체육인프라를 확충하여 지역주민 삶의 질 향상
- 생활체육 활성화를 도모하고 군민들의 휴식, 문화 체육활동 등 건전한 여가활동 제공
- 지역별 균형 있는 문화·체육시설인프라 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 사업위치: 가평읍, 청평면, 설악면, 북면
- 사업규모: 파크골프장 4개소(신규3, 확충1)
- 소요예산: 6,970백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	6,970		6,970		1,110	1,060	4,800			
국비										
도비	1,890		1,890				1,890			
군비	3,180		3,180		110	160	2,910			
기타	1,900		1,900		1,000	900				

○ 사업내용

시설구분	위치	규모	비고
계	4개소		
파크골프장	가평읍 달전리 275번지 일원	18홀	신규
파크골프장	설악면 창의리 501-4	9홀	신규
파크골프장	북면 소법리 627번지 일원	9홀	신규
파크골프장	청평면 대성리 산 2-1번지 일원	27홀	확충

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	50
2022 하반기	사업대상지 선정	· 경제성, 접근성, 인·허가 가능여부 등을 고려한 사업대상지 검토 및 선정	5	5
2023	실시설계	· 파크골프장 3개소(가평, 청평, 설악) 실시설계	20	20
2024	실시설계 및 공사 착공	· 경제성, 접근성, 인·허가 가능여부 등을 고려한 사업대상지 검토 및 선정(북면) · 파크골프장 4개소 실시설계 · 파크골프장 4개소 공사 착공	35	25*
2025	사업완료	· 파크골프장 4개소 공사 준공	40	

□ 추진실적

구 분		추진실적				비 고
		가평읍	청평면	설악면	북면	
2022	3분기	· 사업대상 후보지 현장 확인 · 사업대상지 추천 요청(문화체육과→6개 읍면) · 가평군 파크골프협회 협의				
	4분기				· 북면 파크골프 및 그라운드골프협회 협의(그라운드골프장 → 파크골프장)사업 변경	
2023	1분기	· 원주지방환경청 협의(2회)(대상 부지)				
	2분기	· 조성사업 수리검토 및 실시설계용역 착수				
		· 공약이행평가단 제2차 회의 / 2023. 4.11. - 내용: 명칭 및 사업규모(그라운드골프장 1개소 제외, 파크골프장 1개소 추가) - 사유: 파크골프협회 및 그라운드골프협회 의견 수렴 및 건의사항 반영				
	3분기	· 조성사업 수리검토 및 실시설계용역 중지 (하천점용허가 협의 등 행정절차 진행)				
	4분기			· 조성사업 수리검토 · 실시설계용역 착수		
2024	1분기	· 원주지방환경청 협의(3차)(대상 부지) · 조성사업 소규모환경영향평가 용역 착수 · 한수원 부지 사용허가 요청		· 인접 토지주 및 야영장 운영인 의견수렴	· 대상지 선정	
	2분기	· 용역중지 (수질오염총량 및 소규모환경영향평가 협의 등)	· 진출입로 개선 관련 도로교통공단 경기도지부 기술지원 요청			
	3분기	· 하천점용허가 신청 및 보완요청	· 진출입로 협의 요청(의정부국토관리사무소)	· 낙찰자 및 업체 선정	· 실시설계용역 중지(기하천점용 허가취소절차이행)	

구 분		추진 실적				비고
		가평읍	청평면	설악면	북면	
	4분기	· 소규모영향평가 협의 요청	· 청평 파크골프장 진출입로 개선 방안 협의 요청 (의정부국토관리사무소)	· 기하천점용허가 취소에 따른 원상복구(건설과 하천관리팀)	· 기하천점용허가 보상관련 법률자문 및 결과통보 (문화체육과 → 북면, 건설과)	

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 가평읍 파크골프장

⇒ 국가하천에 대한 점용허가를 위해 원주지방환경청에 협의한 결과 이동식 건축물(클럽 하우스, 화장실) 및 구조물(파고라, 의자)등에 대한 이동계획 수립 요청(보완)이 있어 건축물 및 구조물을 최소화하고 이동계획을 수립하여 소규모영향평가 협의 완료 및 반영 후 보완제출(25.1월 내) 할 예정임

○ 청평면 파크골프장

⇒ 진출입로로 신청평대교(가평에서 설악 방향) 진입차선의 초입부분을 일부 사용하고 있으나, 파크골프장 진출입차량과 신청평대교 진입차량 간 교차로 인해 교통사고 발생 우려가 상존하고 있음에 따라

⇒ 청평공공하수처리장 앞의 3지교차로를 4지교차로로 변경하여 진출입로를 확보하고자 하였으나, 원주지방환경청과 하천점용허가 사전검토 협의결과 4지교차로에 대하여 부정적인 의견이 있어 기존 진출입로를 개선하는 방안으로 의정부국토관리사무소 협의 요청(2024. 11)

○ 북면 파크골프장

⇒ 사업부지내 하천점용허가건에 대해 하천부지점용 허가취소 및 불법사항(나무식재 등)에 대한 원상복구를 관련부서(북면, 건설과)에 요청하였으며, 부서에서 처리 완료 후 설계 용역 재착수 예정(2024. 8.13. 설계중지).

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	1분기	· 실시설계 및 하천점용 등 행정절차 이행(가평읍, 청평면, 북면)	
	4분기	· 파크골프장 4개소 조성	

□ 기대효과

○ 파크골프장을 조성하여 군민의 건강증진에 기여함은 물론 건전한 여가활동 제공을 통해 군민의 삶의 질 향상 도모

약속VI 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

상면 생활문화체육시설 및 공간조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
VI-4	체육	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	문화체육과	문화체육시설팀장	장성세(2510)	담당자	이선명(2072)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	40%

□ 추진방향

○ 다목적 생활문화공간 조성으로 양질의 문화 공간 제공을 통한 지역주민의 복지 증진 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 6. ※ 공약실천계획서: 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사업위치: 상면 연하리 136-3번지 일원
- 사업용도: 문화센터, 공연장, 체육시설(종합행정타운) 등
- 소요예산: 5,200백만원(보상비 2,200백만원, 시설비 3,000백만원)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	5,200	1,070	4,130	430	140	170	3,390			
국비										
도비										
군비	5,200	1,070	4,130	430	140	170	3,390			
기타										

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	40
2022 하반기	사업대상지 선정	· 시설의 필요성, 수혜도 등을 종합적으로 고려한 세부사업 계획 확정	5	5
2023	토지보상	· 편입토지 손실보상 협의 : 1월 ~ 12월	10	10
2024	실시설계	· 군관리계획 변경 및 실시설계 : 6월 ~ 12월	25	25
2025	실시설계 완료 및 공사착공	· 군관리계획 변경 및 실시설계 : 1월 ~ 3월 · 편입토지 손실보상 협의 : 4월 ~ 8월 · 공사 착공 : 8월	40	
2026	공사준공	· 공사 준공 : 6월	20	

※ 사업기간 연장에 따라 변경

□ 추진실적

구 분		추진실적	비고
2022	3분기	· 주민의견 수렴 제출 요청(문화체육과→상면) 및 주민 회의 개최	
2023	1분기	· 주민건의(상면청사신축)에 대한 의견제출 요청(문화체육과→회계과) ※ 면청사 이전 - 별도 검토 추진(회계과) · 편입토지(상면 연하리 136-5번지) 손실보상협의 완료 · 부서의견 회신(회계과→문화체육과)	
	3분기	· 편입 물건(상면 연하리 136-5번지, 분묘3기)손실보상협의 요청	
2024	2분기	· 편입토지 물건(상면 연하리 136-5번지) 손실보상협의 완료	
	3분기	· 군관리계획 결정, 실시설계 용역 의뢰 및 착수	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 군·관리계획 결정을 통해 문화센터, 공연장 및 운동시설 설치 등에 대한 위치를 결정한 후 토지보상 및 시설별 세부계획 확정 추진

□ 향후계획

구 분		향후계획	비고
2025	1분기	· 실시설계(안)에 대한 주민설명회 개최 · 군관리계획 결정 및 실시설계용역	
	2분기	· 편입토지 손실보상 협의(~25.8월)	
	3분기	· 공사 착공	
2026	2분기	· 공사 준공	

□ 기대효과

- 다목적 생활문화공간을 조성하여 양질의 문화공간을 제공하여 군민의 복지증진 및 삶의 질 향상

약속VI 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

설악면 생활문화체육시설 및 주차장 확보

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
VI-5	체육	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	문화체육과	문화체육사업팀장	장성세(2510)	담당자	이선명(2072)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	70%

□ 추진방향

- 체육시설 확충을 통한 생활체육 활성화를 도모하고 군민들의 휴식, 문화, 체육활동 등 건전한 여가활동 제공
- 체육시설 이용객의 편의를 위한 주차장 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사업위치: 설악면 선촌리 산34-5번지 일원(설악생활체육공원)
- 사업규모: 체육센터 2개소, 주차장 조성 1식
- 소요예산: 17,550백만원 ※ (공약실천계획서: 17,100백만원) 반다비 체육관 관람석 설치(446석)로 250백만원 등 증가

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	17,550	12,600	4,950	1,000	2,000	1,450	500			
국비	6,000	4,000	2,000	1,000	1,000					
도비										
군비	11,550	8,600	2,950		1,000	1,450	500			
기타										

○ 사업내용

시설구분	위치	규모	소요사업비(백만원)	비고
계	3개소		17,550	
설악 반다비 체육센터	설악면 선촌리 31-4번지 일원	연면적:2,531㎡ (지상3층/1동)	13,050	
설악면 생활형 국민체육센터	설악면 선촌리 32-1번지 일원	연면적:1,268㎡ (지상2층/1동)	2,600	
설악 생활체육공원 주차장 확충사업	설악면 신천리 514-1번지 일원	주차장 조성 4,193㎡	1,900	

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	70
2022 하반기	실시설계 및 공사추진	· 설악 반다비 문화체육센터 착공 · 설악 생활형 체육센터 준공	20	20
2023	실시설계 및 공사추진	· 설악생활체육공원 주차장 확충사업 실시설계 및 군관리 계획(변경)결정 용역	20	20
2024	공사추진	· 설악 반다비 문화체육센터 준공 · (주차장)편입 토지 손실보상 협의	30	30
2025	사업완료	· (주차장)편입 토지 손실보상 협의(1~3월) · 설악생활체육공원 주차장 확충사업 착공(4월) · 설악생활체육공원 주차장 확충사업 준공(12월) ※ 당초: 착공 24.9월 / 준공 25.6월	30	

※ 설악 생활체육공원 주차장 확충사업 착공 시기 연장에 따른 목표이행률 일부 수정

□ 추진실적

구 분		추진실적		비 고
		설악 반다비 문화체육센터	설악생활체육공원 주차장 확충사업	
2022	3분기	· 공사 착공 · 주민설명회 개최(1·2차)	· 사업대상지 현장 확인 및 검토	
	4분기	· 소통 회의 개최(민원해소 대책방안)	· 대상지 수정 건의 관련 설악면 7개 기관단체장 회의 ※ 신천리 514-1번지 일원으로 변경	
	설악면 생활형 국민체육센터 준공 [2022.11.24.]			
2023	1분기	· 주민설명회 개최(3차) · 진입로 개선공사 실시설계용역 착수 · 주민설명회 개최(4차/진입로 관련) · 공사 재착공	· 군관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 착수	
	3분기	· 콘크리트파일(말뚝) 시공 완료	· 주민설명회 개최	
	4분기	· 동절기 공사 중지	· 군관리계획 결정(변경) 협의 등 행정절차 이행	
2024	1분기	· 공사 재착공		
	2분기		· 군관리계획 결정(변경) 고시 완료	
	3분기		· 실시계획인가 실무부서 협의 등 행정절차 이행 · 매장문화유존지역 지표조사 실시 · 토지보상금 예산 확보(1,200백만원) · 대상지 보상계획 공고	
	4분기	· 공사 준공	· 편입토지 감정평가 의뢰 및 회보 · 편입토지 손실보상 요청	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 설악체육공원 주차장 확충 편입토지에 대하여 토지주에게 손실보상요청을 하였으나, 토지주들이 감정평가에 대한 이의를 제기하고 변호사를 선임함에 따라 토지 수용이 장기간 소요될 것으로 보임.

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획		비 고
		설악 반다비 문화체육센터	설악생활체육공원 주차장 확충사업	
2025	1분기	· 에너지효율등급 및 제로에너지 인증 완료 · 장애물 없는 생활환경 인증(BF) 완료	· 편입토지 손실보상 협의 추진	
	2분기		· 공사 착공	
	3분기		· 공사 준공	

□ 기대효과

- 체육시설을 확충하여 군민들의 휴식, 문화, 체육활동 등 건전한 여가활동 제공 및 생활체육 활성화 도모
- 주차장을 확충하여 불법주차 감소를 통한 차량사고 위험을 감소하고 체육공원 이용객의 편의 증진

관 광 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
5개 사업						80%	
Ⅲ-4	운악산 관광레저 단지 조성 (현등사, 운악산 문화관광마을)	가평군	계속	2030 (임기외)	이행후 계속	100	금회 완료
Ⅲ-5	밀리터리 콘텐츠 테마파크 조성	-	-	-	-	-	폐기
Ⅲ-7	신선봉(올업산) 일대 산악관광지 개발 계획 수립	가평군	계속	2023 (임기내)	이행후 계속	100	
Ⅲ-8	북한강 수변 관광특구 지정신청	가평군	계속	2025 (임기내)	정상추진	80	
Ⅲ-11	북한강 천년벚길 조성	가평군	계속	2025 (임기내)	정상추진	40	

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

운악산 관광레저 단지 조성(현등사, 운악산 문화관광마을)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-4	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	장기	임기 외
추진부서	경제산업국	관광과	관광시설팀장 관광운영팀장	신훈식(4630) 빈혜진(2515)	담당자	안지혜(4633) 김단비(4635)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 100%

□ 추진방향

- 운악리 마을대상 체험관광마을 콘텐츠 확대
- 운악산 경관지역에 출렁다리와 곤돌라를 설치하여 관광 명소화 추진으로 방문객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2018. ~ 2030.
- 사업위치: 가평군 조종면 운악리 산162-1번지, 운악산 일원
- 사업규모: 공공분야(운악산 관광마을 조성) 및 민간분야(곤돌라)
- 소요예산: 22,051백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	22,051	3,390	18,661	811	2,000	850		3,000	12,000
국비									
도비	4,858	1,569	3,289	439	2,000	850			
군비	2,193	1,821	372	372					
기타	15,000		15,000					3,000	12,000

○ 사업내용

구분	사업내용	비고
공공분야	1단계사업 / 출렁다리 (L=210m, B=1.5m) 및 전망데크 설치공사 2단계사업 / 관광마을 조성공사 1식 - 마을환경정비 (마을안길 정비, 간판 정비, 안내표지판 정비) - 등산로 정비 (매표소~현등사, L=1,770m) - 마을광장(A=454m²) 조성 및 화장실, 농산물판매장, 쉼터, 관리실 설치 - 운악교 보도 및 경관조명 설치	2020 ~ 2024 (70억)
민간분야	- 곤돌라(L=1,220m, A=4,876m²) 설치 ((주)운악파크) - 하부정거장 : 3,726m², 상부정거장: 750m², 포스트 4개소: 400m² - 운악산 일원 자연휴양림 조성	2025 ~ 2030 (150억)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	(공공)관광마을 조성	· 출렁다리 및 전망데크 설치공사 착공	40	40
2023		· 출렁다리 및 전망데크 설치공사 준공 · 관광마을 조성공사 착공	40	40
2024		· 관광마을 조성공사 준공	20	20
2025	(민간)곤돌라 등 설치	· 곤돌라 및 자연휴양림 조성 인허가 착수	-	
2026		· 곤돌라 및 자연휴양림 조성 인허가 완료 · 곤돌라 및 자연휴양림 조성 착공	-	
2027		· 곤돌라 및 자연휴양림 조성(공정률 30%)	-	
2028		· 곤돌라 및 자연휴양림 조성(공정률 60%)	-	
2029		· 곤돌라 및 자연휴양림 조성(공정률 100%)	-	
2030 상반기		· 곤돌라 및 자연휴양림 개장	-	

□ 추진실적

구 분		추진실적	비 고
2021	4분기	· 1단계사업(운악산 출렁다리 조성공사) 착공	
2022	3분기	· 출렁다리 운영방안 검토보고	
2023	1분기	· 출렁다리 운영 및 관리조례 제정방침 수립 · 출렁다리 전기(가로등) 및 통신(CCTV, 방송설비) 공사 착공	
	2분기	· 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 착공 · 1단계사업(운악산 출렁다리 조성공사) 준공	
	3분기	· 출렁다리 전기(가로등) 공사 준공 · 운악산 출렁다리 개통	
	4분기	· 출렁다리 통신(CCTV, 방송설비) 공사 준공	
2024	1분기	· 동절기 도래에 따른 공사중지(운악산 관광마을 조성공사)	
	2분기	· 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 재착공	
	3분기	· 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 준공 · 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9. - 내용: 사업기간(2018. ~ 2026. → 2018. ~ 2030) 및 세부추진일정 - 사유: 민간분야 사업 인허가 협의 지남으로 변경	
	4분기	· 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 보완공사 완료	

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	1분기	· 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 독려 및 행정지원	
2026	2분기	· 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 인허가완료 및 사업착수	
2029	4분기	· 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 완료	

□ 기대효과

- 조종면 관광거점 생성으로 지역 관광산업 활성화
- 운악산에 새로운 볼거리, 체험거리 조성으로 관광객 유입 증대

□ 위치도



약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

밀리터리 콘텐츠 테마파크 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-5	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	단기	임기 내
추진부서	경제산업국	관광과	관광운영팀장	-	담당자	-
추진현황	□완료 □이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 ■폐기					공정률 -

□ 변경심의 (공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9.)

- 민간사업자 공모에 참여업체가 없고 콘텐츠 개발 용역, 투융자심사 등 행정 절차 기간 소요로 공약사업에서 제외하고 일반 현안업무로 사업추진

□ 추진방향

- 관광객의 요구에 전략적으로 대응하기 위한 수용태세 및 콘텐츠 개발
- 밀리터리 테마공원에 국한되지 않고 관광시장의 변화에 대비한 전략 대응
- 테마공원을 중심으로 기존 관광자원과 신규 개발자원, 유망자원들과의 연계개발을 통해 지역경제의 시너지 효과 도모

□ 사업개요

- 사업명: 밀리터리 테마공원 조성사업(문화체육관광부 지원)
- 위치: 가평군 조종면 현리 2-26번지 일원
- 사업량: 85,610㎡(군유지)
 - 공공분야: 기반시설(도로, 주차장 등), 문화시설(한울마당, 초아마당) 휴양시설(공연장, 잔디마당, 전망대 등)
 - 민자분야: 관광사격 및 서바이벌체험장(3,764㎡), 콘텐츠 문화체험장(3,859㎡) ATV바이크체험장(3,199㎡)
- 사업기간: 2014. 1. ~ 2020. 6.
- 사업비: 5,190백만원(국 2,595, 군비 2,595) *공사비 4,981백만원, 토지보상비 209백만원

□ 사업추진계획

- (공원개방) 민자분야인 밀리터리 테마 체험시설이 미조성으로 공원이 미개방 된 상태이나, 지역주민 및 관광객의 휴식 공간 제공을 위해 공원을 개방하고 민자 분야 토지에 대해서는 별도로 콘텐츠 개발 추진

- (토지매각) 민자 유치를 위해 미 조성된 체험시설부지 3개소(관광사격 및 서바이벌체험장 3,764㎡, 콘텐츠 문화체험장 3,859㎡, 유보지 6,500㎡)의 토지를 민간 사업자에게 매각하여 사업의 성공적인 추진 유도

- 토지 매각 시 공공성 침해 우려 방지를 위한 최소 운영 가이드라인 제시
- 토지 매각 시 낙찰자 토지사용 제한: 지구단위계획 변경 불허

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	
2022 하반기	공원개방 및 콘텐츠 검토	· 지역주민이 일상적인 공원으로 이용할 수 있도록 개방 · 콘텐츠 아이디어 발굴 및 투자의향 업체 의견 조취	30	
2023	민자 유치	· 민간사업부분 토지매각 및 민자유치	50	
2024	콘텐츠 운영	· 운영준비 및 개시	20	

□ 추진실적

- 2022. 9.19.: 공원개방
- 2022.11.24.~12.22.: 민간운영사업자 공모 (참여업체 없음)
- 2023. 4.24.: 민간운영사업자 유치를 위한 기업체 방문 ((주)제이엠로보틱스)
- 2023. 6.28.: 민간운영사업자 사업제안서 제출 ((주)제이엠로보틱스)
 - 제안내용 : 인공지능 미래체험관, 스마트바이오팜, 글램핑장 조성
- 2023. 12.7.: 민간운영사업자 사업 제안 현안회의 ((주)고려종합건설)
 - 제안내용 : 그린스마트타운 건축 설계

□ 향후계획

- 관광트렌드 변화에 대응하기 위한 테마파크 콘텐츠 개발 용역, 이에 따른 투융자심사 등 행정절차 이행이 필요하여 공약사업에서 제외하고 일반 현안업무로 사업추진

□ 기대효과

- 관광인프라가 전무한 조종면 지역의 체험활동, 휴식 레저를 즐길 수 있는 다목적 복합공간의 조성
- 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화에 기여

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

신선봉(울업산) 일대 산악관광지 개발계획 수립

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-7	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	단기	임기 내
추진부서	경제산업국	관광과	관광기획팀장	김순만(2065)	담당자	이상용(2508)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 100%

□ 추진방향

- 북한강 천년 뱃길 연계 설악면 산악관광거점 개발 지역경제 활성화 및 지역균형발전 제고
- 신선봉 케이블카 민자유치사업을 통하여 설악면을 산악관광거점으로 개발
 - ※ 민선8기 공약사업으로 울업산 산악관광지와 신선봉 케이블카 사업계획을 수립

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2023.
- 사업위치: 설악면 울업산 일대
- 사업규모: 산악관광지 조성 1식
- 소요예산: 43백만원 / 개발비용(사업예산) 74,000백만원(민자)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	43	43							
국비									
도비									
군비	43	43							
기타									

○ 사업내용

- 신선봉 산악관광지 기본계획 구상 및 타당성 조사(2022년 학술연구용역)
- 민자투자유치 촉진활동(2023년~2024년)
- 사업추진방식 결정(BTO, BOO 등)
- 산악관광지 1단계 자연체험시설(등산로정비, 산악체험시설 등) 조성
- 산악관광지 2단계 산림어트랙션시설(전망대, 로프웨이, 짚와이어 등) 민자유치

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022	계획 구상 및 타당성 조사	· 기본계획구상 및 타당성 조사 학술연구 분석	30	30
2023	사업추진방식 결정	· 사업 추진방식 결정(BTO, BOO), 자체검토 완료 - 민간투자방식 즉, ‘민간제안사업’으로 검토	70	70
2024 ~2025	절차 이행	· 행정절차 이행(도시관리계획 등) · 민간사업자 모집	-	-
2026 ~2027	발주 및 시공	· 관광지조성, 궤도(케이블카) 시공 · 준공 및 활용	-	-

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2022	3분기	· 목적지 토지 관련 협조(HJ레저개발, 피노키오 이태리 마을) · 기본계획구상 및 타당성 조사연구 완료	
	4분기	· 민자유치 전담직원지정: 1명(관광전문위원)	
2023	1분기	· 전략사업 대책회의(케이블카 전문가 초청) · 산악관광 콘텐츠 개발 회의(산악관광 어드벤처 전문가 초청)	
	2분기	· 신선봉·청평호수 케이블카 설치 민자유치 촉진 활동, 협조(HJ레저개발)	
	3분기	· 민자유치 기업체 제안설명서 검토	
	4분기	· 신선봉(울업산) 일대 산악관광지 개발계획 수립완료	
2024	1분기	· HJ통일재단 한주그룹 방문 신선봉 케이블카 사업 민자투자 설명	
	2분기	· 경기북부 대개발 관광콘텐츠 보고(경기도) · 케이블카 사업 민자유치 기업간 협조회의(한주그룹, 뿌띠프랑스)	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 원활한 사업추진을 위하여 토지소유자 등의 민간사업자 참여 독려

□ 향후계획

구 분	향후계획		비 고
2025	2분기	· 경기도 투자통상과 컨설팅 및 자문	
	3분기	· 민간기업 사업제안방식 사업추진 (BOO 방식 등)	

□ 기대효과

- 설악면 산악관광지 개발 후 인근 관광지 관광벨트화를 통한 지역경제 활성화
- 북한강 천년벚길과 연계하여 신선봉 산악수상관광 개발 활성화
- 신선봉 지역균형발전으로 설악면민 지역가치 향상 인식 제고

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

북한강 수변 관광특구 지정 신청

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-8	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	관광과	관광기획팀장	김순만(2065)	담당자	지수정(2098)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 80%

□ 추진방향

- 국내·외 관광환경 변화에 능동적 대응 및 가평군과 춘천시의 상생발전과 관광브랜드 가치 제고
- 관광특구 지정을 통한 관광 가평 이미지 제고 및 외국인 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2020. 12. ~ 2025. 12.
- 사업위치: (가평군) 가평군 자라섬 및 가평읍 도심 일원, 달전리~금대리공유수면 (춘천시) 남이섬 및 경강, 강촌 일원, 방하리 일원 공유수면
- 사업규모: 23,568,479㎡(특구 지정)
- 소요예산: 130백만원(군비) ※ 기투자
- 사업내용: 북한강 수변 관광특구 지정

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	80
2022 하반기	관광특구 지정 신청서 보완	· 관광특구 지정 신청서 보완	30	30
2023	관광특구 지정 신청서 보완 및 협의	· 관광특구 지정 신청서 보완	25	25
2024		· 관광특구 지정 추진 협의 (가평군, 춘천시, 경기도, 강원도, 문화체육관광부)	25	25
2025	관광특구 지정 완료	· 경기도-문화체육관광부 협의 완료 · 관광특구 지정 완료	20	

□ 추진실적

구 분		추진실적	비고
2022	3분기	· 춘천시 업무협약(용도지역 및 구역 구분 도면 작성, 진흥계획 적정성 보완 등)	
	4분기	· 지정신청 보완 (경기도)	
2023	1분기	· 보완사항 합동점검 (경기도, 강원도) · 사전 협의 (문체부, 경기도, 강원도) · 구역 조정 협의 (가평군, 춘천시)	
	2분기	· 관계기관 회의 (경기도, 강원도, 가평군, 춘천시) · 방문 협의 (문체부, 가평군)	
	4분기	· 관계기관 회의 (경기도, 강원도, 가평군, 춘천시) · 관련 회의 (경기도, 강원도, 가평군, 춘천시) · 지정 신청 추가 보완 자료 제출	
2024	1분기	· 실무 협의(경기도, 강원도, 가평군, 춘천시) · 실무 협의(문화체육관광부, 경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)	
	2분기	· 지정 신청 재보완 서류 제출 · 관계기관 회의(경기도, 강원도, 가평군, 춘천시) · 지정 신청 보완자료 제출 · 실무 협의(경기도, 가평군)	
	3분기	· 지정 신청 재보완 요청(경기도→가평군) · 지정 신청 재보완 자료 제출(가평군→경기도) · 문화체육관광부 협의 결과 통보 및 추가 보완 요구(경기도→가평군) · 관계기관 회의(경기도, 강원도, 가평군, 춘천시) · 추가 보완 요구에 대한 의견 제출 요청(경기도→가평군) · 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9. - 내용: 사업기간(~2024. 6. → 2025. 12.) 및 세부추진일정 - 사유: 관광특구 지정 신청서 보완 및 관계기관 협의에 장기간 소요	
	4분기	· 추진방향 검토 의견 제출(가평군→경기도) ※ 전문기관 자문 의견에 따른 관광특구 지정 요건 입증 불가 · 행정절차 중단 및 일건서류 반송 알림(경기도→가평군)	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 춘천시 공동 추진한 북한강 수변관광특구 지정 신청은 문화체육관광부 지정 불가 결정으로 공약사업 추진은 폐기하고, 가평군 단독 지정, 범위 등을 검토한 후 추진 방향 결정 예정

□ 향후계획

- 가평군 단독 관광특구 지정 신청의 필요성과 효과성 등을 검토하여 추진 여부 결정

□ 기대효과

- 관광특구 지정에 따른 관광도시 지역 이미지 확대
- 관광소비(생산, 소득, 취업, 세수 유발) 및 민간투자 증가

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

북한강 천년벚길 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-11	관광	차별화된 문화관광, 새로운 성장	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	관광과	수상관광팀장	신동원(2175)	담당자	강상민(2664)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 40%

□ 추진방향

- 경춘선 복선전철 및 서울-춘천고속도로 개통 등 우리 군의 교통여건은 점차 개선 중이나 방문하는 관광객은 크게 증가하지 않아 새로운 테마관광사업 개발이 필요하며
- 우리 군의 주요 관광지는 산재 되어 있어 접근성 및 연계가 미흡한 바 북한강을 이용한 수상관광루트를 개발하여 북한강 권역의 주요관광자원(자라섬, 남이섬, 뿌띠프랑스, 물미연 꽃마을 등)을 연계하는 북한강 천년벚길 조성사업을 추진하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2020. ~ 2025.
- 사업위치: 가평군 북한강(청평호) 일원
- 소요예산: 52,400백만원(군비 15,000백만원, 민간 37,400백만원)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	52,400		52,400	15,625	21,546	12,200	3,029		
국비									
도비									
군비	8,600		8,600	625	6,546		1,429		
기금	6,400		6,400			4,800	1,600		
민간	37,400		37,400	15,000	15,000	7,400			

- 사업내용
 - 벚길 40km 및 육상 순환루트 조성, 북한강 수변 주요 관광지를 연결하여 시너지 효과를 극대화 하고 신규 관광자원 발굴 및 확대
 - 수변생태관광 활성화를 위한 다목적 선착장 6개소 조성
 - 친환경 선박 건조 및 운항(전기추진선 등 선박 3척 건조)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	40
2023	사업비 확보 및 착공	· 공공 다목적 선착장 착공	35	35
2024	기반시설 완료	· 북한강 천년벚길 1단계 운항 실시 · 공공 다목적 선착장 완공	50	5*
2025	사업 개시	· 북한강 천년벚길 2단계 운항 실시	15	

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2022	3분기	· 경기도 해양수산물 방문협의 및 가평군 의회 사업장 방문	
	4분기	· 친환경 전기선박 진수식 · 시범운항 실시 (2회, 162명 탑승)	
2023	2분기	· 운영방안 수립 연구용역 착수 · 자라꽃섬나루 다목적 선착장 착수	
	4분기	· 공약이행평가단 제3차 회의 / 2023.11.16. - 내용: 다목적 선착장 7→6개소(공공선착장 4→3, 민간선착장 3) - 사유: 복장포구 인근 수상레저종합센터 건설사업을 위한 학술연구용역 추진중으로 효율적인 사업 추진(중복투자방지)	
2024	2분기	· 자라꽃섬나루 인양 협의((주) 남이섬) · 북한강 천년벚길 가평크루즈 출항식 · 자라나루 선착장 완공 · 1단계 운항(자라섬~남이섬~송산리)	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 자라나루 선착장 조성에 이어 호명, 물미연꽃나루를 조성하여야 하나, 민간 선박의 건조 및 투입 지연 등으로 공공선착장의 건설 시기를 적절히 조정
(조속한 선박 건조 및 투입을 위하여 남이섬, 청평페리 등과 협의 중)

□ 향후계획

- 2025.12.: 북한강 천년벚길 전 구간 운항 실시

□ 기대효과

- 친환경 선박 도입을 통한 청정한 북한강 이미지 조성
- 행락철 가평으로 진입하는 주요도로의 정체에 구애받지 않고 북한강 물길을 이용한 자유로운 이동 및 관광지 연계를 통한 관광객의 만족도 향상 및 지역경제 활성화 도모

□ 참고사진



농 업 정 책 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
2개 사업						100%	
I -6	글로벌 가평농업 프로젝트	가평군	신규	2026 (임기내)	이행후 계속	100	금회 완료
I -7	직거래장터 활성화	가평군	신규	2026 (임기내)	이행후 계속	100	

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

글로벌 가평농업 프로젝트

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-6	농업	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	농업정책과	농산유통팀장 박민정(4771)	담당자	권서영(4772)	
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 관내 농식품·신선농산물 수출 품목 발굴·육성
- 신선농산물을 재배하여 수출에 참여하고 있는 농가, 작목반, 생산자 단체 또는 국산 농축수산물을 주원료로 사용하는 생산·수출하는 식품 가공업체에 대해 수출농산물 포장재, 물류비 및 농자재, 공동선별비 등 지원하여 수출 확대 도모
- 농식품 수출관련 이론교육, 컨설팅 및 벤치마킹

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 관내
- 사업규모: 농가, 작목반 생산자 단체 등
- 소요예산: 364백만원 ※ (공약실천계획서: 383백만원) 농식품 해외마케팅 지원사업 경기도 직접수행으로 47백만원 등 감소

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	364	56	308	62	27	146	33	40		
국비										
도비	150	28	122	31	11	46	14	20		
군비	214	28	186	31	16	100	19	20		
기타										

○ 사업내용

- 수출 확대를 위한 수출 관련 교육 실시
- 품목별 수출용 포장에 소요되는 박스 등 지원
- 신선농산물 수출단지의 노후시설 및 장비 구입 지원

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	농식품류 수출 실시	· 가공업체 수출포장재 및 물류비 지원	25	25
2023 ~ 2026 상반기	신선농산물 및 가공 식품류 수출 확대 지원	· 수출과정 농가교육 실시 · 수출품목 발굴 육성 · 고품질 수출농산물 생산지원 · 수출에 따른 포장재	75	75

□ 추진실적

○ 수출 현황

구 분	업체	품목	수출량	수출국가	비 고
계			4,974		
2022	(주)우리술	막걸리	983	미국, 중국, 일본, 호주	
	GH내추럴	홍삼제품	30	미국, 베트남	
2023	(주)우리술	막걸리	1,636	미국, 일본, 중국, 캄보디아	
	GH내추럴	홍삼제품	45	미국, 베트남	
2024	(주)우리술	막걸리	2,200	미국, 일본, 중국, 베트남	
	GH내추럴	홍삼제품	80	미국, 베트남	

○ 수출 포장재 지원

구 분	업체	사업비	보조	자부담	품목	비 고
계		198	99	99		
2022	(주)우리술	120	60	60	막걸리 페트병 및 박스 지원	
	GH내추럴				녹용홍삼프리미엄 및 흑마늘즙 파우치 박스 지원	
2023	(주)우리술	42	21	21	막걸리 페트병 및 박스 지원	
	GH내추럴				녹용홍삼프리미엄 및 흑마늘즙 파우치 박스 지원	
2024	(주)우리술	36	18	18	막걸리 페트병 및 박스 지원	
	GH내추럴				녹용홍삼프리미엄 및 흑마늘즙 파우치 박스 지원	

○ 농식품 해외마케팅 지원사업

구 분	사업내용	위탁기관		비 고
계			사업비 143 (보조 123, 자부담 20)	
2024	농식품 해외 판촉·홍보 지원	(주)우리술	미국 LA ZION 한인마트 판촉행사 진행 막걸리 인지도 제고	
		GH내추럴	미국 Home shopping world(LA) 홍보판촉 추진 및 라디오, 신문지면 광고 진행	
	맞춤형 해외 마케팅 지원	(주)우리술	미국 바이어 초청으로 신제품 시음 및 상담 미국 전역 유통 협의 / 상하이 박람회 참가로 소비자 관심도 증가	
		GH내추럴	파리 박람회 참가로 프랑스 유통처 에이스와 OEM 제조 상담	

○ 수출농가 역량강화 교육

- 2023년 참석자: 수출희망 업체 및 농가 10여명
- 2024년 참석자: 가평군 포도연구회 작목반(10명), 와인연구회(6명), 가평토마토작목반(3명)



과실류 수출시장 이론 교육 및 2차 가공품 생산·수출 전략 교육

□ **향후계획**

- 농식품 수출포장재 지원사업 추진
- 수출희망 농가 대상으로 국제식품박람회 참가 추진
- 수출희망 신선농산물 발굴 및 확대 추진

□ **기대효과**

- 신선 농산물·농식품 수출화를 통해 판로개척 및 수출경쟁력 강화

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

직거래장터 활성화

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
1-7	농업	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	농업정책과	농산유통팀장	박민정(4771)	담당자	양현숙(4786)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 관광테마 등 소비자 구매 포인트를 활용한 장터 내실화
- 꽃정원, 주요관광지 등 방문객이 많은 장소 직거래 장터 확대 운영
- 小 사업비 高 효율성 온·오프라인 장터 운영

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7 ~ 2026. 6
- 사업위치: 자라섬외 다수
- 사업규모: 100여농가
- 소요예산: 1,007백만원 ※ (공약실천계획서: 650백만원 / 장터 다양화 및 확대로 증가)
직거래 기간제근로자 인건비 1개월 분(3백만원) 삭감

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	1,007		1,007	50	150	270	267	270		
국비										
도비										
군비	1,007		1,007	50	150	270	267	270		
기타										

○ 사업내용

- 자라섬 남도 꽃 정원 가평군 명물 직거래 장터 확대 운영
- 자매결연지 등 직거래 장터 운영
- 방문객이 많은 주요 장소 직거래 장터 개설 운영
- 기관·단체·기업과 함께하는 직거래 장터 운영
- 라이브커머스 등 랜선 온라인 직거래 운영

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	직거래장터 3회	· 가을 자라섬 꽃정원 농특산물 판매장 자라장터 운영 · 한컴 청리움 직거래장터 운영 · 네이버라이브 쇼핑 온라인 직거래 추진	15	15
2023	직거래장터 6회	· 봄·가을 자라섬 꽃정원 농특산물 판매장 자라장터 운영 · 한컴 청리움 직거래장터 운영 · 네이버라이브 쇼핑 온라인 직거래 추진 · 연말맞이 착한직거래 특별전 운영	35	35
2024 ~ 2026 상반기	직거래장터 7~10회	· 자매결연지 등 직거래 장터 운영 · 관내 행사, 축제 개최 시 직거래 장터 운영 · 에덴휴게소 등 다중 집합시설 직거래장터 실시	50	50

□ 추진실적

(단위:회, 백만원)

구 분	2022	2023	2024
개장 횟수(관외)	13(6)	38(21)	51(25)
총 매출액(천원)	666	1,257	1,411
자라섬 꽃축제 (봄/가을)	- 491	318 685	522 622
찾아가는 로컬푸드	175		
명절 기관, 단체 및 직원(설/추석)		32 31	34 46
에덴벚꽃축제		36	36
자매결연지		37	61
네이버 라이브커머스		8	9
온라인직거래		110	
메가쇼시즌1			8
서울동행상회			5
경기푸드박람회			2
추석 관외			46
메가쇼시즌2			13
청평내수면연구소(구)			7

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 자매결연도시 직거래장터 확대 추진
- 관내 주요 지점 직거래장터 실시
- 대도시와 함께하는 특별 기획전 운영
- 마켓경기 입점 농가 확대 추진
- 온라인직거래 라이브커머스 추진

□ 기대효과

- 농가의 판로 확보로 농가소득 증대 및 지역경제 활성화

□ 사진



축 산 정 책 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						100%	
Ⅲ-12	청평 옛 중양내수면연구소 이전부지 주민 개방	가평군	신규	2023 (임기내)	완료	100	

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

청평 옛 중앙내수면연구소 이전부지 주민 개방

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-12	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	신규	단기	임기 내
추진부서	경제산업국	축산정책과	축수산정책팀장	정정순(4761)	담당자	최수경(4758)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 100%

□ 변경내역 (공약이행평가단 제2차 회의 / 2023. 4.11.)

- 공 약 명: 청소년 해양 교육센터 건립 → 청평 중앙내수면연구소 이전부지 주민 개방
- 변경사유: 설계비 확보 노력에도 예산 미반영으로 사업 추진 불투명

□ 추진방향

- 1942년 청평면에 개소하여 지난 80여년간 지역 주민들에게 단절된 중앙내수면연구소 이전부지 내 저수지를 개방
 - ※ 가평군·국립수산물연구원 중앙내수면연구소 간 “연구소 이전부지 내 저수지 임시개방에 따른 운영 업무 협약” 체결
- 연구소 이전에 따른 지역주민들의 상실감을 위로하고 유희부지의 활용에 따른 지역 경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 3. ~ 4.
- 사업위치: 가평군 청평면 청평리 91번지(중앙내수면연구소 이전부지)
- 사업규모: 저수지 14,767㎡
- 소요예산: 30백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	30		30		30				
국비	30		30		30				
도비									
군비									
기타									

○ 사업내용

- 2023. 4월 벚꽃 개화시기 동안 연구소 이전부지 내 저수지 임시개방 행사 운영
- 행사기간 동안 방문객의 안전관리 추진

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	100
2023	개방행사 운영	· 중앙내수면연구소와 운영 업무 협약 체결 · 이전부지 내 저수지 개방행사 운영	100	100

□ 추진실적

구 분	추진실적	비 고
2023	1분기 · 중앙내수면연구소 방문 업무 협의(금산 중앙내수면연구소) · 저수지 개방 관련 국회 방문 및 건의(최춘식 의원실) · 해양수산부 방문 업무 협의(세종시 해양수산부) · 저수지 개방 관련 국회 2차 방문(최춘식 의원실) · 운영 업무 협약을 통한 저수지 임시 개방 결정(중앙내수면연구소) · 임시 개방 운영 업무 협약 체결	
	2분기 · 가평군 안전정책실무조정위원회 개최 · 청평 옛 중앙내수면연구소 벚꽃길 개방(총 방문객 7,028명)	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 청평 중앙내수면연구소 이전부지를 상시개방 및 조속히 활용될 수 있도록 방안 마련

□ 기대효과

- 연구소 개방에 따른 80여년간 가보고 싶어도 가보지 못했던 지역주민들의 소원 성취
- 이전부지 폐쇄가 아닌 주민과 함께하는 지역 경제 활성화 기여

□ 내수면연구소 이전부지 개방 사진



산 림 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
4개 사업						31.2%	
I-9	산림자원 가공산업 육성	가평군	신규	2025 (임기내)	정상추진	5	
III-9	북면 산림생태테마파크 조성	가평군	계속	2025 (임기내)	정상추진	10	
III-10	상면 산림자원 관광레저 바이오밸리 조성	가평군	신규	2026 (임기내)	정상추진	10	
III-13	축령산 생태관광마을 둘레길 조성 (행현2리 중심)	가평군	계속	2023 (임기내)	정상추진	100	

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

산림자원 가공산업 육성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-9	산림	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	산림과	산림정책팀장	정지일(2340)	담당자	김미애(2342)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 5%

추진방향

- 미이용 산림부산물을 활용한 신재생에너지 연료, 축사갈래, 표고톱밥배지로의 활용 및 목재 건조 및 가공시설 설치 등 수집·가공·유통 시스템 구축을 위한 자원화 센터 조성
- 향후 가평군 소각시설 설치 시 발생한 폐열을 활용한 산림자원 가공시설 운영기반 조성

사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2025.
- 사업위치: 가평읍 상색리 509번지 일원
- 사업규모: 미이용 산림자원화 센터 조성
- 소요예산: 3,000백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	3,000		3,000			1,500	1,500			
국비	1,500		1,500			750	750			
도비	150		150			75	75			
군비	450		450			225	225			
기타	900		900			450	450			

- 사업내용
 - 미이용 산림자원화센터 기반(가공 및 건조시설, 작업장 등) 조성 및 자원화 사업에 필요한 기계장비구입을 통한 자원화 시스템 구축

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	5
2023	미이용 산림자원화 센터 조성사업 공모사업 신청 접수	· 공모 신청접수	30	5
2024	미이용 산림자원화 센터 조성사업 추진	· 미이용 산림자원화센터 조성	40	
2025	산림자원화센터 운영 가평군 폐기물 소각 시설과 연계 추진	· 산림자원가공시설 등 운영 · 소각시설 여열을 이용한 스팀, 온수, 건조 등 열원 재활용 · 폐기물 소각시설 설치사업과 사업 연계 추진	30	

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2023	4분기	· 2024년 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모 제출(신청자: 가평군산림조합) · 공모사업 최종선정 결과 탈락	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 산림청은 광역자치단체 별 1개소씩 미이용 산림자원화센터를 조성할 계획으로, 선정 이력이 없는 광역자치단체에게 가산점(우선권) 부여
- 2020년 파주시산림조합이 선정되어 우리군이 추가 선정될 가능성 희박

공모년도	2019	2020	2021	2022	2023	2024
선정지역	전남	경기	충남	전북	경남	경북

□ 향후계획

- 산림청 「2025년 미이용 산림자원화센터 조성사업」 공모계획 공고 시 가평군산림조합과 공모사업 참여 재협의

□ 기대효과

- 미이용 산림부산물을 활용한 신재생 에너지연료 확대 및 가공시설 설치로 산림자원화 기반조성은 물론 가공산업 활성화로 지역 일자리 창출

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

북면 산림생태테마파크 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-9	산림	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	산림과	산림휴양팀장	정선기(2480)	담당자	최영재(2486)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 10%

□ 추진방향

- 북면 계관산을 우수한 자연생태자원 등과 연계·강화하고 접근이 용이한 숲길 조성
- 특색 있고 차별화된 숲길 조성을 통한 볼거리 제공 및 지역경제활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2025. 12.
- 사업위치: 가평군 북면 목동리 산207(임)번지 일원
- 사업규모: 숲길 조성 및 정비(L= 5km)
- 소요예산: 216백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	216		216			16	200		
국비									
도비									
군비	216		216			16	200		
기타									

- 사업내용
 - 북면 생활권 등산로 정비(데크, 전망대 보수)
 - 편의 시설물 설치(쉼터 설치, 안전로프, 안내판 설치)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	10
2024	실시설계용역	· 실시설계용역 추진	10	10
2025	산림생태테마파크 조성	· 공사 추진 및 준공	90	

□ 추진실적

구 분		추진실적	비 고
2022	3분기	· 공약사업 추진 관련 사전 답사	
2023	3분기	· 미·영연방 관광안보공원 조성 타당성조사 연구 및 기본계획 수립 용역 착수 보고회, 주민 설명회 참석(복지정책과 추진)	
2024	4분기	· 공약사항 추진계획 변경 보고 · 공약이행 평가단 현장 실사 · 공약이행평가단 제6차 회의 / 2024. 11. 12. - 내용: 사업기간(~2023. 12. → 2025. 12.), 사업위치, 사업내용, 소요예산 - 사유: 미영연방 관광안보공원 조성사업과 연계 추진하고자 했으나 유사사업이 포함됨에 따라 기존 북면 주민이 이용하는 생활권 등산로 정비 · 조성사업 실시설계용역 착수 [2024. 11. 14.] · 조성사업 실시설계용역 준공 [2024. 12. 19.]	

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

구 분		향후계획	비 고
2025	1분기	· 조성사업 착수	
	4분기	· 조성사업 준공	

□ 기대효과

○ 주민 편의 제공 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사진



약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

상면 산림자원 관광레저 바이오밸리 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-10	산림	자연환경은 더 아름답게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	산림과	산림휴양팀장	정선기(2480)	담당자	이혜란(2481)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 10%

□ 추진방향

- (필요성) 상면지역은 잣나무 숲이 울창한 산림자원을 보유하고 있고 기존 치유의 숲, 환경성질환예방센터 등 산림휴양에 대한 시설을 보유하고 있으나 산림레포츠(레저)와 관련된 시설이 없어 이와 관련된 시설물을 조성하여 관광객 유치 및 지역경제활성화 도모 필요
- 상면지역이 갖고 있는 우수한 산림자원의 특성 및 치유의 숲 등 산림휴양시설과 연계하여 산림레포츠(레저)시설을 조성하여 복합형 산림 관광레저밸리조성
- 상면지역에 접근성, 경관 등을 고려하였을 때 활용가능한 부지는 도유림이므로 파편화되어있는 군유림과 교환 후 사업추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 가평군 상면 상동리 산24-4번지 일대(예정)
- 사업규모: 산림레포츠체험단지 1식(산악승마시설, 산악자전거시설 등)
- 소요예산: 2,700백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,700		2,700		50	80	2,570		
국비	1,250		1,250				1,250		
도비									
군비	1,450		1,450		50	80	1,320		
기타									

○ 사업내용

- 상면 상동리 도유림과 연인산도립공원(가평읍 승안리 산120번지 외 4필지) 내 군유림을 교환하여 사업부지 확보
 - 상면 상동리 산24-4번지(도유림) 일원에 산악승마시설, 산악자전거시설, 산악마라톤시설 등 조성
 - 산림욕장등 조성계획(산림레포츠체험단지) 용역에 의거 부지 임황, 경사도 등을 파악 후 적합한 시설 추가 선정
- ※ 「산림·문화 휴양에 관한 법률」제20조(산림욕장등의 조성) 및 동법 시행령 제9조의4 제1항 관련된 산림레포츠시설임

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	10
2022 하반기	부지 선정	· 산림레포츠단지 적지선정을 위한 연구용역 (도유림 교환 등)	5	5
2023	부지 선정	· 공유재산 교환에 따른 감정평가 등 실시	15	5
2024	조성계획 승인	· 산림레포츠체험단지 조성계획 승인 용역 추진 (「산림·문화 휴양에 관한 법률」제20조 관련)	20	*
2025	설계 및 공사	· 산림레포츠체험단지 조성공사 실시설계용역 · 산림레포츠체험단지 조성공사(1차년도)	30	
2026 상반기	공사 및 준공	· 산림레포츠체험단지 조성공사(2차년도)	30	

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2022	3분기	· 공약사업 추진 관련 사전 답사	
	4분기	· 산림자원 관광레포츠단지 조성방안 용역 착수	
2023	1분기	· 대상지 선정을 위한 현장답사 및 주민의견 청취 · 산림자원 관광레포츠단지 조성방안 용역 준공	
2024	1분기	· 도 산림환경연구소 방문하여 산림레포츠체험단지 조성사업안 협의	
	3분기	· 상동리 산림레포츠시설 설치사업 실시설계 용역 중 · 도 산림환경연구소와 공유재산 교환 협의 진행	
	4분기	· 도 산림환경연구소와 공유재산 교환 불가 통보	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 사업추진을 위해서는 군유림-도유림 교환을 통한 사업부지 확보가 필요하므로, 경기도 산림환경연구소와 협의가 필요함
- 도유림 교환검토 가능한 사업부지 발굴하여 산림환경연구소와 재협의를 필요한 실정임

□ 향후계획

- 상동리 산24-4번지 도유림 일원 현황측량 후 사업부지 선정 협의
- 사업부지 확보를 위한 공유재산 교환 필지 협의(경기도 산림환경연구소)
- 도 산림환경연구소와 공유재산 교환 재협의

□ 기대효과

- 가평군의 수려한 산림자원과 산림레포츠 체험을 통한 힐링 가평 실현 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 기대

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

축령산 생태관광마을 둘레길 조성(행현2리 중심)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-13	산림	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	단기	임기 내
추진부서	경제산업국	산림과	산림휴양팀장	정선기(2480)	담당자	최영재(2486)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 100%

□ 추진방향

- 상면 행현리 마을을 우수한 지역관광·자연생태자원 등과 연계·강화할 수 있는 둘레길 조성 및 정비

□ 사업개요

- 사업기간: 2018. ~ 2023.
- 사업위치: 가평군 상면 행현리 산172-1 일원
- 사업규모: 둘레길 진입로 포장, 쉼터 조성 등(L= 0.7km)
- 소요예산: 420백만원 ※ 확보예산: 총 300백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	420	120	300		300					
국비										
도비										
군비	420	120	300		300					
기타										

○ 사업내용

- 둘레길 진입로 포장(야자매트 설치 등) 및 입구 조형물 설치
- 쉼터 조성 및 야생화 식재
- 물길 조성 및 생태연못 구조 개선 등

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
	계		100	100
2023	실시설계용역 및 축령산 생태관광마을 둘레길 조성 추진	· 2023. 3.~ 4. 실시설계 용역 추진 · 2023. 9.~ 11. 공사 추진	100	100

□ 추진실적

구 분		추진실적	비고
2022	3분기	· 공약사업 추진 관련 사전 답사 · 2023년 본예산 반영 (300백만원)	
	1분기	· 실시설계용역 착수	
2023	2분기	· 실시설계용역 준공	
	3분기	· 사업대상지 산지 일시사용신고 신청 · 축령산 생태관광마을 둘레길 조성사업 추진	
	4분기	· 축령산 생태관광마을 둘레길 조성사업 준공	

□ 기대효과

○ 마을 주민 편의 제공 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사진



건 설 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
6개 사업						47.5%	
V-1	제2경춘국도 건설사업 조기 착공	국 토 부	계속	2026 (임기내)	정상추진	50	
V-2	지방도387호선(내방~연하)도로 개량사업 조기 착공	경 기 도	계속	2026 (임기내)	정상추진	45	
V-3	하천IC~고성간도로 개설사업(호명터널) 확정	국 토 부	계속	2027 (임기외)	정상추진	60	
V-4	국도75호선(가평~목동)확장사업 착공	국 토 부	계속	2028 (임기외)	정상추진	10	
V-5	상판~적목 간 2차선 도로 개설사업 확정	경 기 도	계속	2027 (임기외)	정상추진	60	
V-6	두밀~대보 간 2차선 도로 개설사업 확정	경 기 도	계속	2027 (임기외)	정상추진	60	

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

제2경춘국도 건설사업 조기 착공

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-1	건설	주민안전은 더 세심하게	국토부	계속	중기	임기 내
추진부서	건설도시국 건설과 도로시설팀장 김양섭(2425)					
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	50%

□ 추진방향

- 수도권과 강원도를 연결하는 주요 간선도로인 서울~양양 고속도로와 국도46호선은 만성적인 교통체증으로 인해 내방객 및 지역 주민들이 통행에 큰 불편을 겪고 있어 교통량을 분산하고 가평군 접근성 향상을 위해 제2경춘국도 신설이 절실한 상황임.
- 2019년도 예비타당성조사 면제사업으로 선정되어 추진 중인 「제2경춘국도 건설사업」에 대하여 관련부처인 국토교통부와 지속적인 업무협의를 통해 우리군의 건의사항이 최대한 반영될 수 있도록 당위성과 필요성을 적극 피력하고 사업이 조기에 착공될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2034 ※ (공약실천계획서: 2018 ~ 2029) 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 남양주시 화도읍 금남IC ~ 가평군 청평면, 가평읍 경유 ~ 춘천시 서면 안보리
- 사업규모: 연장(L)=33.6km, 폭원(B)=20.0m (교량 24개소/5.6km, 터널 20개소/13.6km)
- 소요예산: 1,286,200백만원 (국비 100%)
- 사업내용: 제2경춘국도 신설

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	50
2022 하반기	기본설계용역 완료 실시설계용역 발주	· 기본설계용역 완료 · 실시설계용역 발주	30	30
2023	실시설계용역 추진	· 실시설계용역 추진	10	10
2024	실시설계용역 완료 편입용지보상 추진	· 실시설계용역 완료 · 편입용지보상 추진	25	10*
2025	편입용지보상 완료	· 편입용지보상 완료	15	
2026 상반기	공사 착공 및 추진	· 공사 착공 및 추진	20	

*미달성 사유: 총사업비 증액에 따른 행정절차 지연

□ 추진실적

구 분		추진실적	비고
2022	2분기	· 총사업비[1조2,862억원] 협의 완료(기재부-원주청)	
	3분기	· 기본설계용역 완료(원주청) · 기본설계 기술제안 입찰 발주(원주청, 서울청)	
	4분기	· 기본설계 기술제안 입찰 유찰(원주청, 서울청) · 실시설계용역 입찰 발주(원주청, 서울청)	
2023	1분기	· 실시설계용역 착수(서울청-1,2공구 / 원주청-3,4,5공구) · 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 서울청 현장 방문 협의	
	2분기	· 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 주민설명회 및 현장 설명회 개최(서울청) · 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 관련 서울청 방문 협의 · 제2경춘국도 건설사업(3,4공구) 관련 원주청 방문 협의 · 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 주민의견 수렴 및 의견 제출(가평군-서울청) · 제2경춘국도 건설사업(3,4공구) 주민설명회 개최(원주청)	
	3분기	· 「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 면담 실시(3회)	
2024	1분기	· 「서울청 - 제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」간 간담회 실시(3회) · 「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 간담회 실시	
	2분기	· 국회 방문 건의	
	3분기	· 제2경춘국도 관련 국회 토론회 참석 · 「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 간담회 실시 · 「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 간담회 실시(2회)	
	4분기	· 서울지방국토관리청 방문 협의 · KDI 사업계획적정성 재검토 관련 현장방문 회의 참석 · 「서울청-제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 간 현장설명회 실시 · 도로구역결정(변경) 및 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고(3,4공구)	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 총사업비 증액(증 6,486억원)에 따른 기획재정부와 협의 난항으로 사업 지연이 우려됨에 따라 '24. 10. KDI 현장 방문 회의 시 참석하여 총사업비 증액과 사업의 조기 착공에 대한 당위성을 적극 피력함.


□ 향후계획

구 분		향후계획	비고
2025	4분기	· 실시설계 용역 준공(예정)	
2026		· 용지보상 협의 추진(예정)	
2034		· 공사 착공 및 준공(예정)	

□ 기대효과

- 최적의 노선 선정 및 자동차 전용도로 개설을 통한 우리 군 접근성을 향상하여 지역 경제 활성화에 기여
- 행락철 및 주말 서울~양양 고속도로와 국도46호선(경춘국도)의 만성적인 교통 지·정체 해소로 가평군 방문객 및 지역 주민들에게 교통편의 증진

□ 위치도 및 노선도

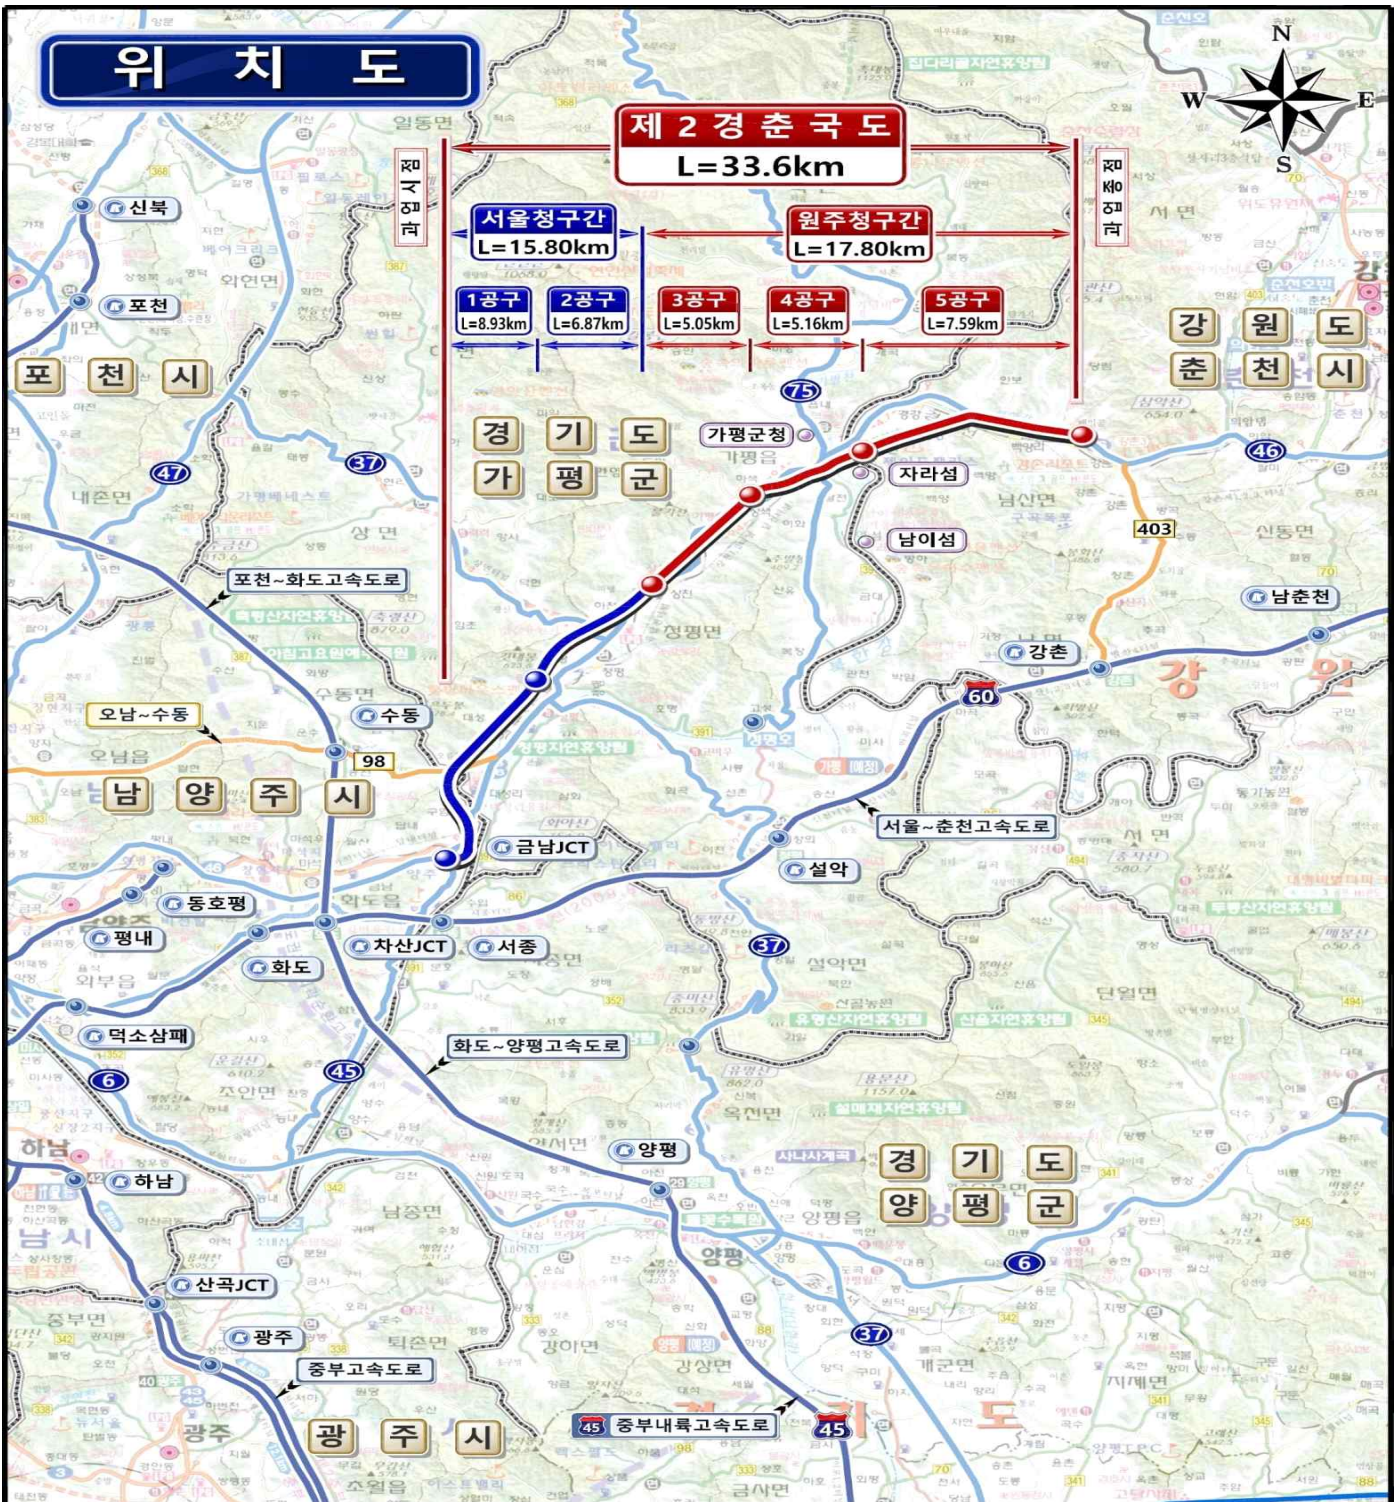

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

지방도387호선(내방-연하)도로 개량사업 조기 착공

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-2	건설	주민안전은 더 세심하게	경기도	계속	중기	임기 내
추진부서	건설도시국 건설과 도로시설팀장 김양섭(2425)					
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	45%

□ 추진방향

- 지방도 387호선은 도로 폭이 협소하고 평면 및 종단선형이 불량하여 사고위험이 상존함에 따라 교통사고 위험을 예방하고 도로 이용자의 통행 편의를 증진하며 나아가 수도권 제2순환고속도로와 연계 구축을 통한 지역 접근성 향상을 위해 도로 개량(터널화)이 필요한 실정임.
- 「제3차 경기도 도로건설계획」에 반영되어 추진 중인「지방도 387호선(내방-연하) 도로 개량사업」에 대해서 관련 부처인 경기도와 적극적인 업무 협의를 통해 가평군 건의 사항이 최대한 반영될 수 있도록 당위성을 피력하고 공사가 조기에 착공될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함.

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2034 ※ (공약실천계획서: 2018 ~ 2028) 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 가평군 상면 상동리 ~ 남양주시 수동면 내방리
- 사업규모: 연장(L)=2.6km, 폭원(B)=10.0m (터널 1개소/0.9km)
- 소요예산: 48,100백만원 (도비 100%)
- 사업내용: 지방도387호선 선형 개량(터널 개설)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	45
2022 하반기	기본설계용역 및 실시설계용역 착수	· 기본설계용역 및 실시설계용역 착수	10	10
2023	기본설계용역 및 실시설계용역 추진	· 기본설계용역 및 실시설계용역 추진	20	20
2024	기본설계용역 및 실시설계용역 완료	· 기본설계용역 및 실시설계용역 완료	20	15*
2025	편입용지보상 추진	· 편입용지보상 추진	20	
2026 상반기	편입용지보상 완료 공사 착공 및 추진	· 편입용지보상 완료 · 공사 착공 및 추진	30	

□ 추진실적

구 분		추진실적	비고
2022	3분기	· 기본 및 실시설계용역 착수(경기도), 착수보고회 개최(경기도)	
2023	1분기	· 1차 주민설명회 개최(상면사무소)	
2024	2분기	· 「경기 동부 SOC 대개발」 시·군 간담회 시 건의 · 주민설명회 개최(상동리 마을회관) · 국회 방문 건의	
	3분기	· 경기도 방문 업무 협의(2회) · 3차 주민설명회 개최(상면사무소)	
	4분기	· 경기도의회 정책 정담회 시 건의	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 당초 상동리 4반 마을 주민들이 종점부 기본설계 노선(안)에 대하여 민원을 제기하였으나 경기도에서 재검토한 노선(안)을 주민설명회(3차) 시 제시한 결과, 주민들이 적극 찬성함.
- 또한 부족 설계용역비에 대해서는 관계부서에서 ‘25년 본예산’에 신청하였으나 행정절차(예비타당성조사, 중앙투자심사 등) 지연에 따라 본예산에 미반영됨.
- 다만, 실시설계용역이 원활히 진행하고 있어 공정상 큰 문제는 없을 것으로 판단됨에 따라 상기 부족예산이 ‘25년 제1회 추경예산’에 반영될 수 있도록 국회, 경기도의회 등에 지속적으로 건의 노력하겠음.

□ 향후계획

구 분		향후계획	비고
2025	4분기	· 기본 및 실시설계용역 준공(예정)	
2026	4분기	· 용지보상 협의 추진(예정)	
2034		· 공사 착공 및 준공(예정)	

□ 기대효과

- 수도권제2순환고속도로와 유기적이고 효율적인 간선도로망을 구축하여 접근성 향상을 통한 지역경제 활성화에 기여
- 평면 및 종단선형이 불량한 위험도로 개량으로 도로이용자 안전사고 예방
- 교통량 분산을 통한 국도46호선의 만성적인 교통 지체현상을 해소하여 내방객 및 지역주민들에게 교통편의 제공

□ 위치도 및 노선도



약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

하천IC~고성 간 도로 개설사업(호명터널) 확정

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-3	건설	주민안전은 더 세심하게	국토부	계속	장기	임기 외
추진부서	건설도시국 건설과 도로시설팀장 김양섭(2425)					
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	60%

□ 추진방향

- 국도37호선‘신천-삼회’구간은 도로의 평면선형 불량으로 교통사고가 지속적으로 증가되고 있으나 북한강 및 인접 산지 법면부로 인해 기존 국도의 선형개량이 어려움
- 또한 연계되는 국도46호선 및 서울~양양 고속도로의 상습 지정체로 지역주민과 관광객의 불편이 가중되고 있는 실정임
- 이에 국도37호선‘신천~삼회’구간을‘하천IC~가평대교’구간으로 노선을 변경하여 국도의 고유 기능인 지역 간 이동성 제고 및 청평호의 수려한 자연경관 훼손을 방지하고 나아가 청평호 주변도로의 통과교통량 전환으로 국도46호선의 만성적인 교통 정체를 해소하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2030 ※ 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 청평면 하천리 하천IC ~ 청평면 고성리 고성교차로(가평대교)
- 사업규모: 연장(L)=7.4km, 폭원(B)=10.0m (터널 3개소/5.1km)
- 소요예산: 107,300백만원(국비 100%) ※ 공약실천계획서: 99,100백만원
- 사업내용: 국도37호선 노선변경 및 개설

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	60
2022 하반기	타당성 조사 및 검토	· 국도37호선 노선변경 타당성 조사 및 검토	20	20
2023		· 국도37호선 노선변경 타당성 조사 및 검토 · 제6차 국도·국지도 5개년계획에 반영토록 지속 건의	20	20
2024	타당성 조사 및 검토 국도 5개년계획 건의	· 제6차 국도·국지도 5개년계획에 반영토록 지속 건의	20	20
2025		· 제6차 국도·국지도 5개년계획에 반영토록 지속 건의	20	
2026 상반기	국도 5개년계획 반영	· 제6차 국도·국지도 5개년계획 반영	20	

□ 추진실적

구 분		추진실적	비고
2023	1분기	· 당정협의회 건의 · 국회의원 요구자료 제출(최춘식 국회의원) · 「제6차 국도·국지도 5개년 건설계획」 수요조사 자료 제출(가평군→경기도) · 가평군 광역도로사업 서울청 현장 방문 시 건의	
	2분기	· 현안사업 건의(가평군→지역구 국회의원) · 경기북부특별자치도 설치 관련 가평군 사업 건의(가평군→경기도) · 제3차 국토부장관 간담회 가평군 현안사항 건의 · 가평군 광역도로사업 서울청 방문 건의 및 당정협의회 건의	
2024	1분기	· 국가도로망 계획 대응 경기도 전략 수립용역 착수보고회 참석 · 국회 국토교통위원회 방문 건의	
	2분기	· 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 건의(가평군→경기도) · 「북한강 권역 경기북부 대개발 관광콘텐츠 개발」 사업 건의(가평군→경기도) · 국회 방문 건의(3회)	
	3분기	· 경기도 시·군 현장간담회 시 건의 · 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 선정(경기도)	
	4분기	· 서울지방국토관리청 방문 건의 · 「경기북부 시군 비전 순회 간담회」 참석 · 「경기 동부권 SOC 대개발 구상 설명회」 참석 ※ 현재 지선국도 노선지정에 대하여 국토교통부와 기획재정부 협의 중	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 상기 사업은 현재까지 국도로 미지정된 노선으로서 B/C 등이 부족하여 단기간 내 사업확정이 어려울 것으로 판단되지만,
- 「제6차 국도·국지도 5개년 건설계획」 사업으로 서울지방국토관리청에 건의하였으며, ‘23. 5. 서울지방국토관리청을 방문·건의한 결과, 국도로 미지정된 노선이므로 우선 노선지정이 선행되어야 함에 따라, ‘노선지정을 위한 지선국도 지정 사업’ 및 ‘제6차 국도·국지도 5개년계획(2026~2030) 사업’ 두 가지 안으로 국토교통부에 신청하기로 **협의하여 추진 중임.**
- 상기 숙원사업이 우선 지선국도 노선으로 지정되어 교두보를 마련하고 나아가 「제6차 국도·국지도 5개년 건설계획」에 반영될 수 있도록 국회 및 관련부처에 지속적으로 건의 노력하겠음.


□ 향후계획

- 관계기관 지속 건의 예정(2025. 1월~)

□ 기대효과

- 국도37호선 노선을 변경하여 설악~청평 간 단축도로(터널) 개설로 교통량을 분산시켜 교통 지·정체 해소 및 지역 간 접근성 향상 도모
- 불합리한 국도37호선 노선변경으로 내방객 및 지역주민들에게 안전사고 예방 및 교통편의 제공

□ 위치도 및 노선도

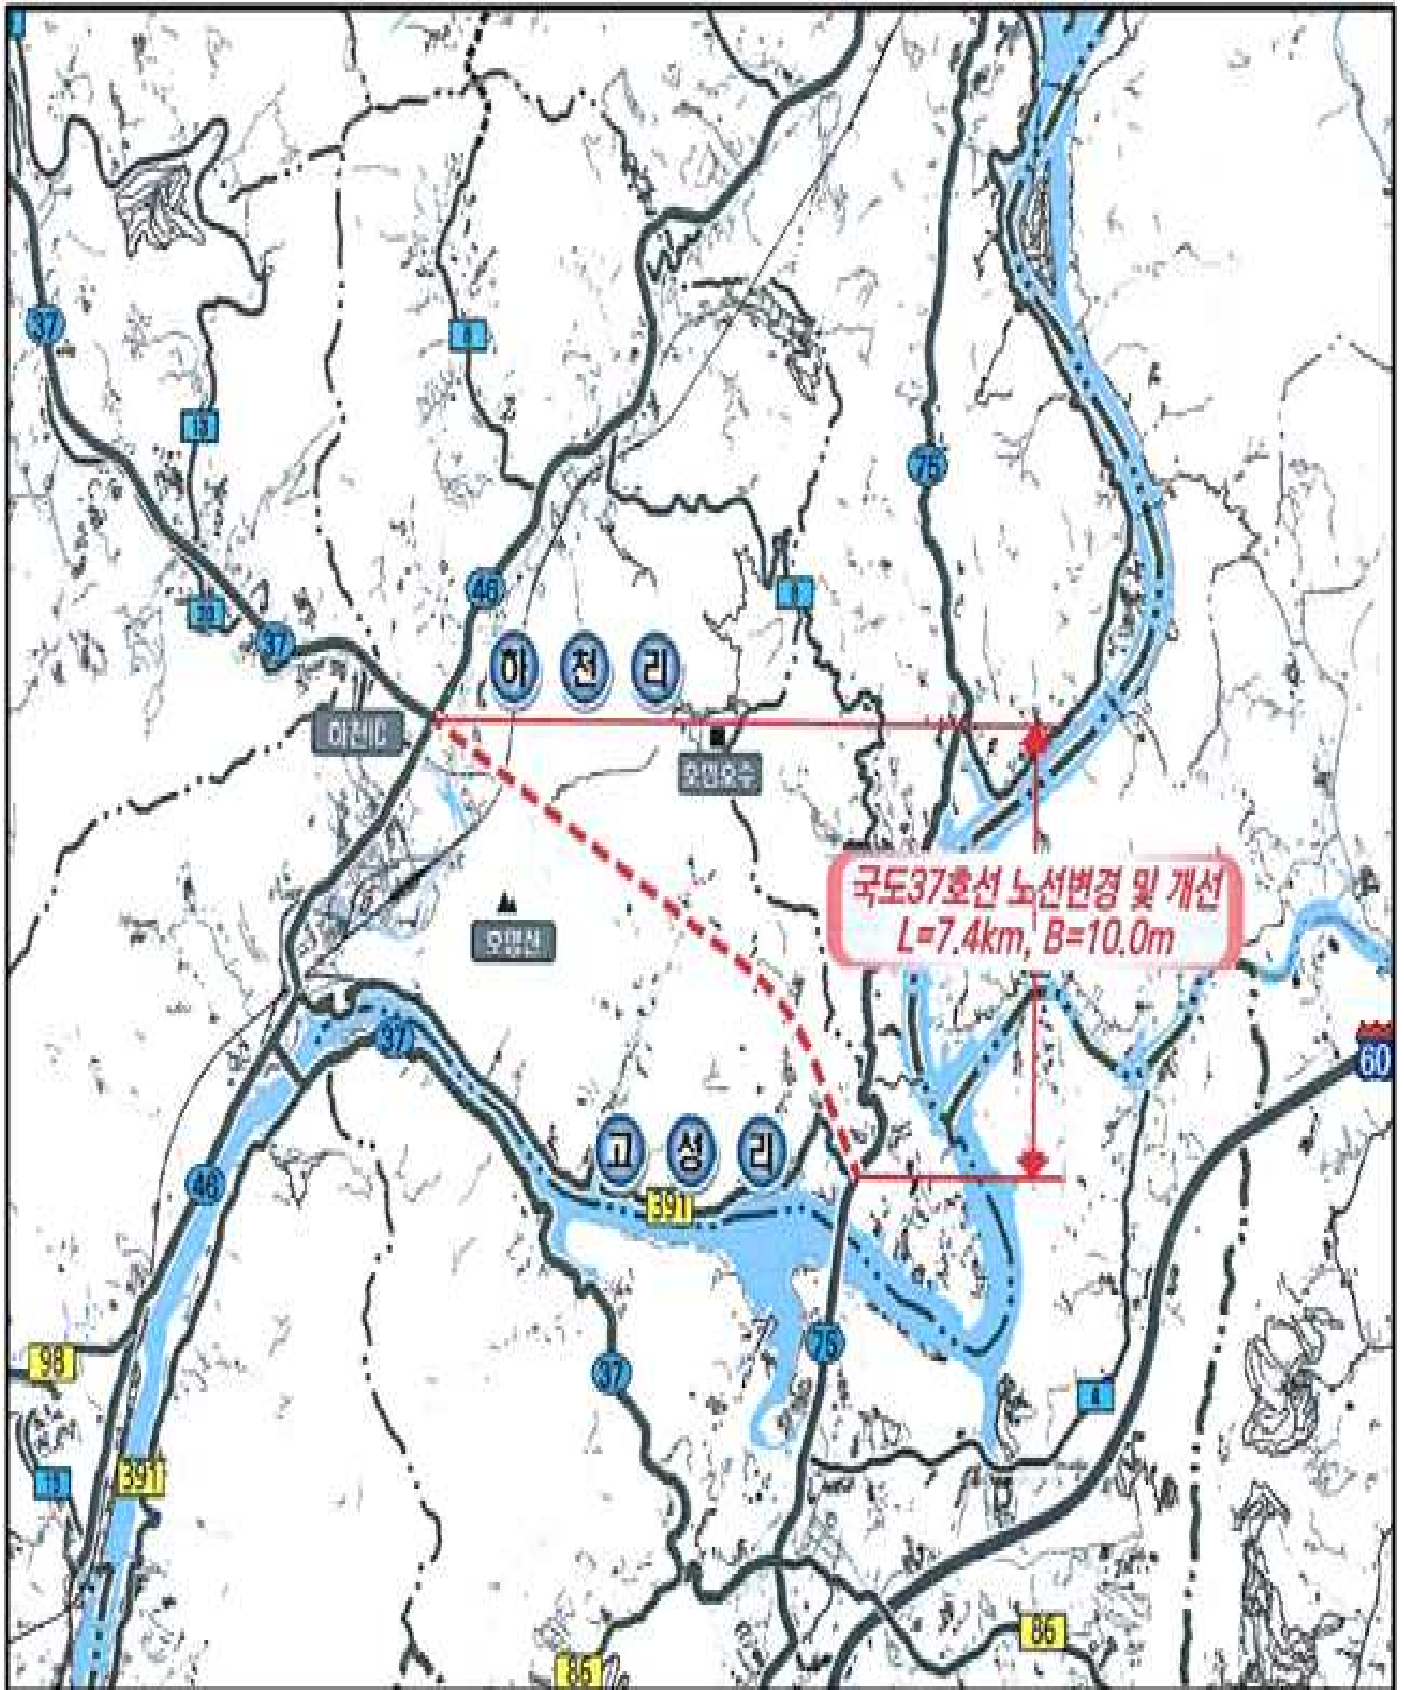

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

국도75호선(가평~목동) 확장사업 착공

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-4	건설	주민안전은 더 세심하게	국토부	계속	장기	임기 외
추진부서	건설도시국 건설과 도로시설팀장 김양섭(2425)					
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	10%

□ 추진방향

- 국도75호선‘가평~목동’구간은 가평읍과 북면을 연결하는 유일한 간선도로로 행락철 및 주말마다 만성적인 교통 체증으로 인해 지역 주민들이 생활에 큰 불편을 겪고 있어 기존 국도 확장 및 개량 사업 추진이 절실한 상황임
- 「제5차 국도·국지도 5개년계획」에 반영되어 현재 추진 중인「국도 75호선(가평-목동) 확장사업」에 대하여 관련부처인 국토교통부와 적극적인 업무협의를 통해 가평군의 건의사항이 최대한 반영될 수 있도록 필요성과 당위성에 대하여 적극 피력하고 공사가 조기에 착공될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2035 ※ (공약실천계획서: 2018 ~ 2030) 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 가평읍 마장리 농업기술센터 진입로 입구 ~ 북면 목동리 목동삼거리
- 사업규모: 연장(L)=7.3km, 폭원(B)=15.0m
- 소요예산: 40,000백만원 (국비 100%)
- 사업내용: 국도75호선 확장 및 개량

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	10
2022 하반기	타당성 조사 및 검토	· 국도75호선 4차로 확장사업 타당성 조사 및 검토	10	10
2025	기본설계용역 및 실시설계용역 착수	· 기본설계용역 및 실시설계용역 추진	20	
2026	기본설계용역 및 실시설계용역 완료	· 기본설계용역 및 실시설계용역 완료	20	
2027	편입용지보상 추진	· 편입용지보상 추진	20	
2028	편입용지보상 완료, 공사 추진	· 편입용지보상 완료 · 공사 추진	30	

□ 추진실적

구 분		추진실적	비고
2022	3분기	· 사업계획 변경 건의(가평군→국토부장관, 국토위 국회의원, 지역구 국회의원)	
2023	1분기	· 당정협의회 건의 · 사업 조속 추진 건의(가평군→서울지방국토관리청)	
	2분기	· 현안사업 건의(가평군→지역구 국회의원) · 경기북부특별자치도 설치 관련 가평군 사업 건의(가평군→경기도) · 제3차 국토부장관 간담회 가평군 현안사항 건의 · 가평군 광역도로사업 서울청 방문 건의 · 당정협의회 건의	
	3분기	· 국토부 방문 건의	
	4분기	· 국회 방문 건의(2회)	
	1분기	· 국회 국토교통위원회 방문 건의 · 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3.19. - 내용: 사업기간(~2028 → 2030) 및 연도별 목표 - 사유: 예산 미확보됨에 따라 연도별 목표 달성에 차질이 발생하여 사업기간 변경	
2024	3분기	· 국회 방문 건의(3회)	
	4분기	· 서울지방국토관리청 방문 건의 ※ 25년도 국토교통부 예산에 기본 및 실시설계용역비(2억원) 확보	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 국도75호선 가평~목동 구간은 가평읍과 북면을 연결하는 유일한 간선도로로 국토교통부에서
확정한 2차로 개량사업으로 추진 시 만성적인 교통체증 해소에 대한 근본적인 해결책이
될 수 없고 장기간 고통 받고 있는 가평 지역 주민들의 생활 불편을 조속히 해소하기 위해
신속한 사업추진이 절실한 상황임.
- 이에, 가평군에서는 사업효과의 극대화를 위해 서울지방국토관리청에서 기본 및 실시설계
용역 추진 시점에 마장리부터 노루목고개 3.7km 구간만 우선 4차로 확장사업으로 변경하는
안을 건의할 계획임.


□ 향후계획

- 관계기관 지속 건의 예정(2025. 1월~)

□ 기대효과

- 기존 국도 확장을 통한 만성적 교통 체증 및 통행 불편 해소
- 지역 간 접근성 향상으로 지역경제 활성화를 도모하고 주민 편의 증진
- 제2경춘국도 통과노선 배제에 따른 가평읍, 북면 지역주민들의 불만 해소

□ 위치도 및 노선도

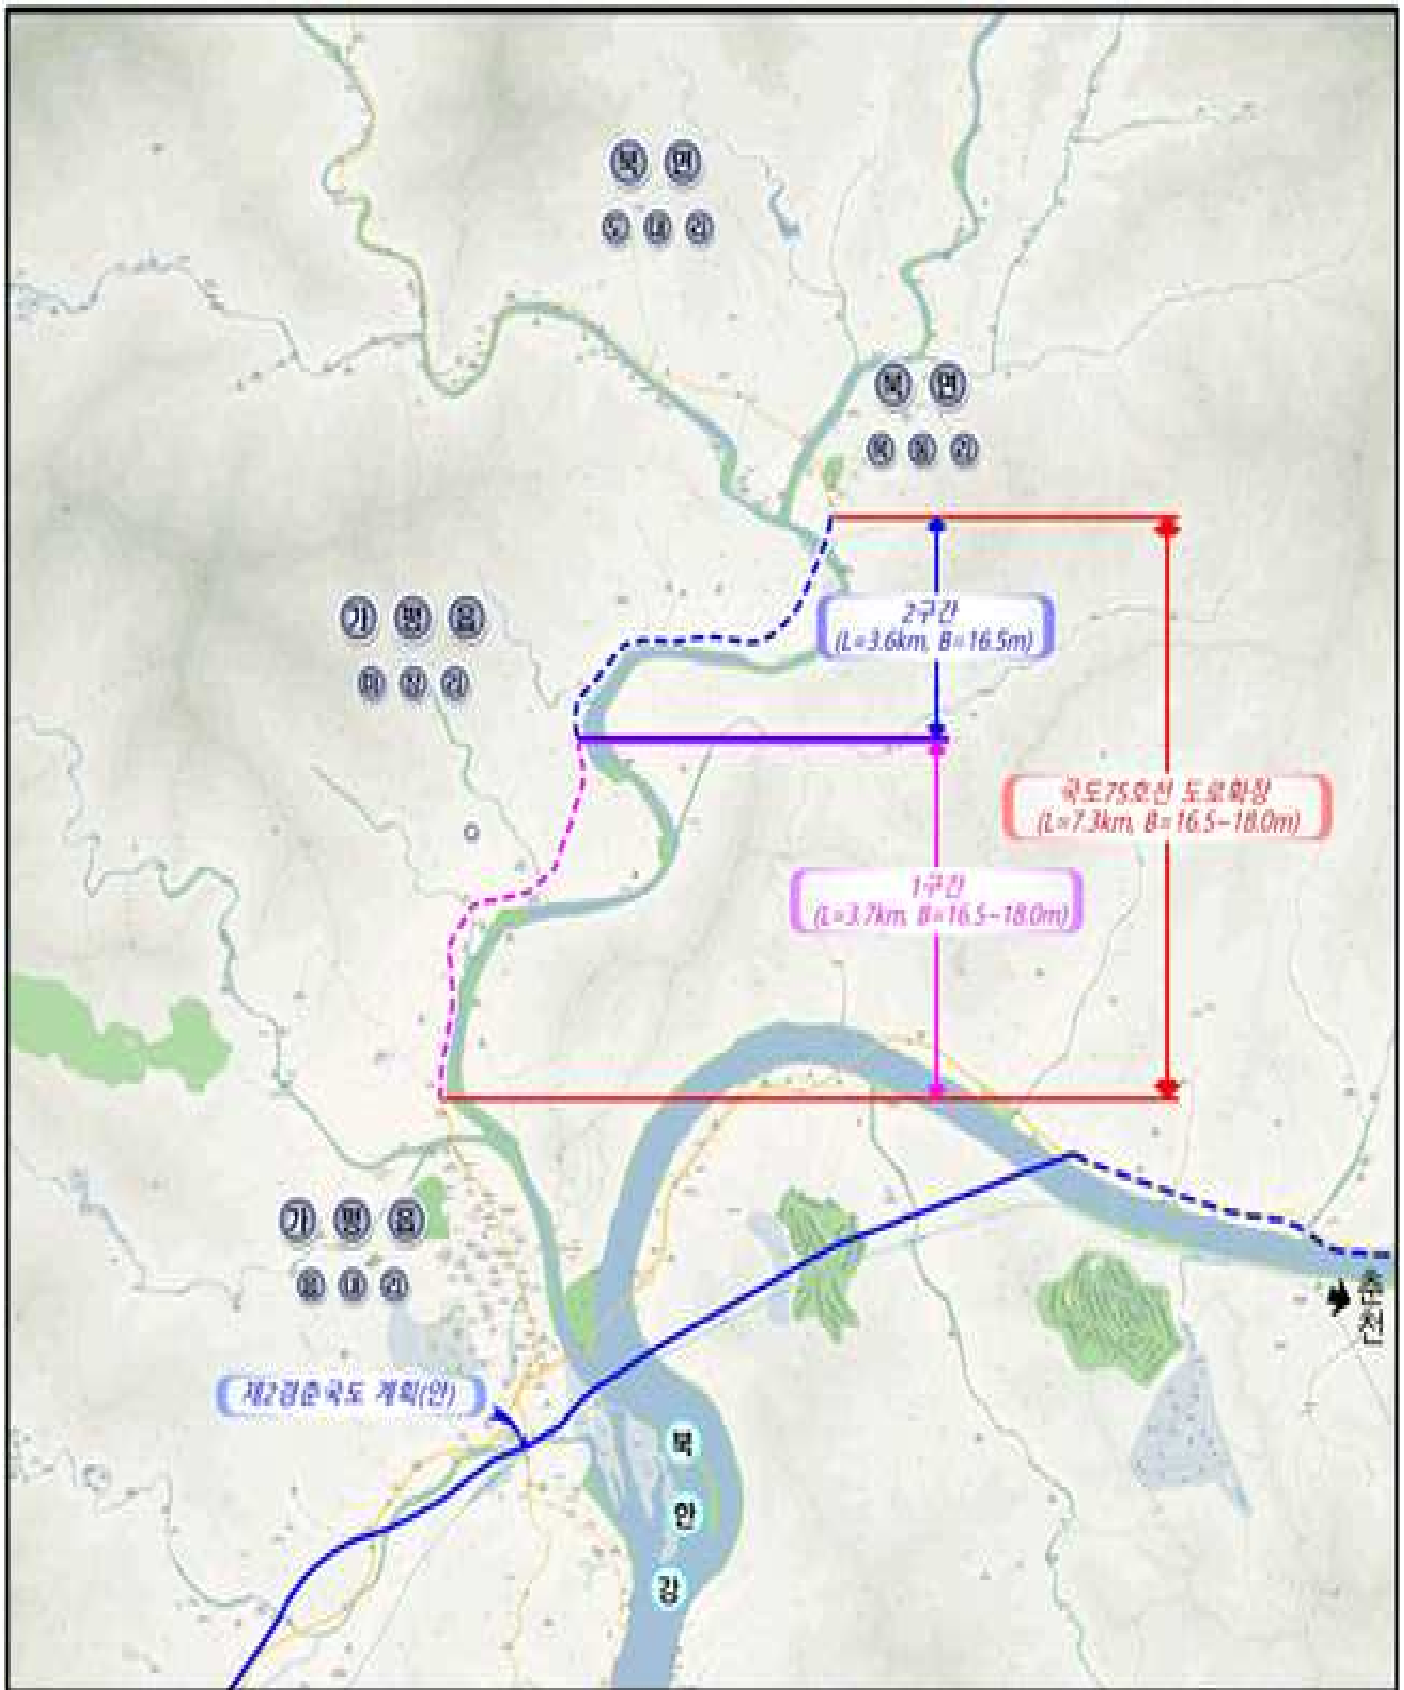

약속 V
도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

상판~적목 간 2차선 도로 개설사업 확정

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-5	건설	주민안전은 더 세심하게	경기도	계속	장기	임기 외
추진부서	건설도시국 건설과 도로시설팀장 김양섭(2425)					
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	60%

□ 추진방향

- 가평군 북면에서 조종면 상판리 구간의 단절된 노선에 대하여 순환 교통망 연계 구축을 통한 지역 간 이동 편의 증진을 위해 상판-적목 간 지방도 노선 지정 및 2차선 도로 신설이 필요한 상황임
- 이에 본 노선에 대한 사업타당성 근거 마련 후 경기도에 적극적으로 당위성과 필요성을 피력하여 「제4차 경기도 도로건설계획(2026~2030)」에 반영될 수 있도록 건의 추진하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2017 ~ 2030 ※ 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 북면 적목리 강씨봉휴양림 ~ 조종면 상판리 귀목
- 사업규모: 연장(L)=6.4km, 폭원(B)=10.0m (터널 2개소/3.78km, 교량 4개소/130.0m)
- 소요예산: 155,446백만원 (도비 100%)
- 사업내용: 상판-적목 간 지방도 노선 지정 및 도로 신설

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	60
2022 하반기	타당성 조사 및 검토	· 상판-적목 간 도로신설 타당성 조사 및 검토	20	20
2023	타당성 조사 및 검토도로건설계획 건의	· 상판-적목 간 도로신설 타당성 조사 및 검토 · 제4차 경기도 도로건설계획에 반영토록 지속 건의	20	20
2024	도로건설계획 건의	· 제4차 경기도 도로건설계획에 반영토록 지속 건의	20	20
2025	도로건설계획 건의	· 제4차 경기도 도로건설계획에 반영토록 지속 건의	20	
2026 상반기	도로건설계획 반영	· 제4차 경기도 도로건설계획에 반영	20	

□ 추진실적

구 분		추진실적	비고
2022	3분기	· 현안사업 건의(가평군→경기도지사, 지역구 국회의원)	
2023	2분기	· 경기북부특별자치도 설치 관련 가평군 사업 건의(가평군→경기도)	
	3분기	· 경기북부특별자치도 비전 추진 전략 도로분야 선정 ※ 격자형 도로망 : 동서축 노선으로 상판-적목 노선 선정	
2024	1분기	· 제4차 경기도 도로건설계획 수립 용역 착수보고회 참석 · 제4차 경기도 도로건설계획 수요조사 자료 제출(가평군→경기도)	
	2분기	· 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 건의(가평군→경기도) · 「북한강 권역 경기북부 대개발 관광콘텐츠 개발」 사업 건의(가평군→경기도) · 국회 방문 건의	
	3분기	· 경기도 시·군 현장간담회 시 건의 · 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 선정(경기도) · 「경기북부 대개조 프로젝트」 선제적 추진 발표(경기도) · 경기도 방문 건의	
	4분기	· 경기도 현장 방문 시 건의 · 「경기북부 시군 비전 순회 간담회」 참석 · 「도·시군 도로분야 정책 간담회」 참석 · 「경기 동부권 SOC 대개발 구상 설명회」 참석	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당 노선은 「자연환경보전법」에 따라 생태·경관 보전지역으로 지정 고시되어 환경적 보전 가치가 많은 지역으로 도로개설로 자연환경 훼손이 이루어질 경우 환경단체 등에 노출되어 다수의 민원으로 사업 추진에 난항이 예상되지만,
- 해당 도로가 개설 될 경우 순환도로망이 구축되어 조종면-북면 간 이동시간 단축 및 교통량 분담 효과 등의 긍정적인 면이 크므로 가평군에서 추진 중인 「광역교통망 수립 용역」으로 본 노선에 대한 사업 타당성 근거를 마련함.
- 「제4차 경기도 도로건설계획(2026~2030)」에 반영될 수 있도록 경기도에 지속적으로 건의하여 추진할 계획임.
 ※ 현재 경기도에서 조속한 사업 추진을 위해 ‘24년도 1회 추경예산에 타당성 조사 용역비(8억)을 확보하여 경기 북부 발전 방안인 「경기 북부 대개발사업」의 일환으로 상기 노선에 대하여 타당성 조사를 추진 중임.


□ 향후계획

- 관계기관 지속 건의 예정(2025. 1월~)

□ 기대효과

- 가평군 동서관통도로 구축에 따른 지역 접근성 향상 및 가평군 순환도로 구축에 따른 조종면 ~ 북면 간 접근성 향상
- 지역 간 이동거리(시간) 단축에 따른 도로이용자들의 간접비용 감소와 관광객 및 지역주민들의 불편 해소를 통한 지역경제 활성화 효과 기대

□ 위치도 및 노선도

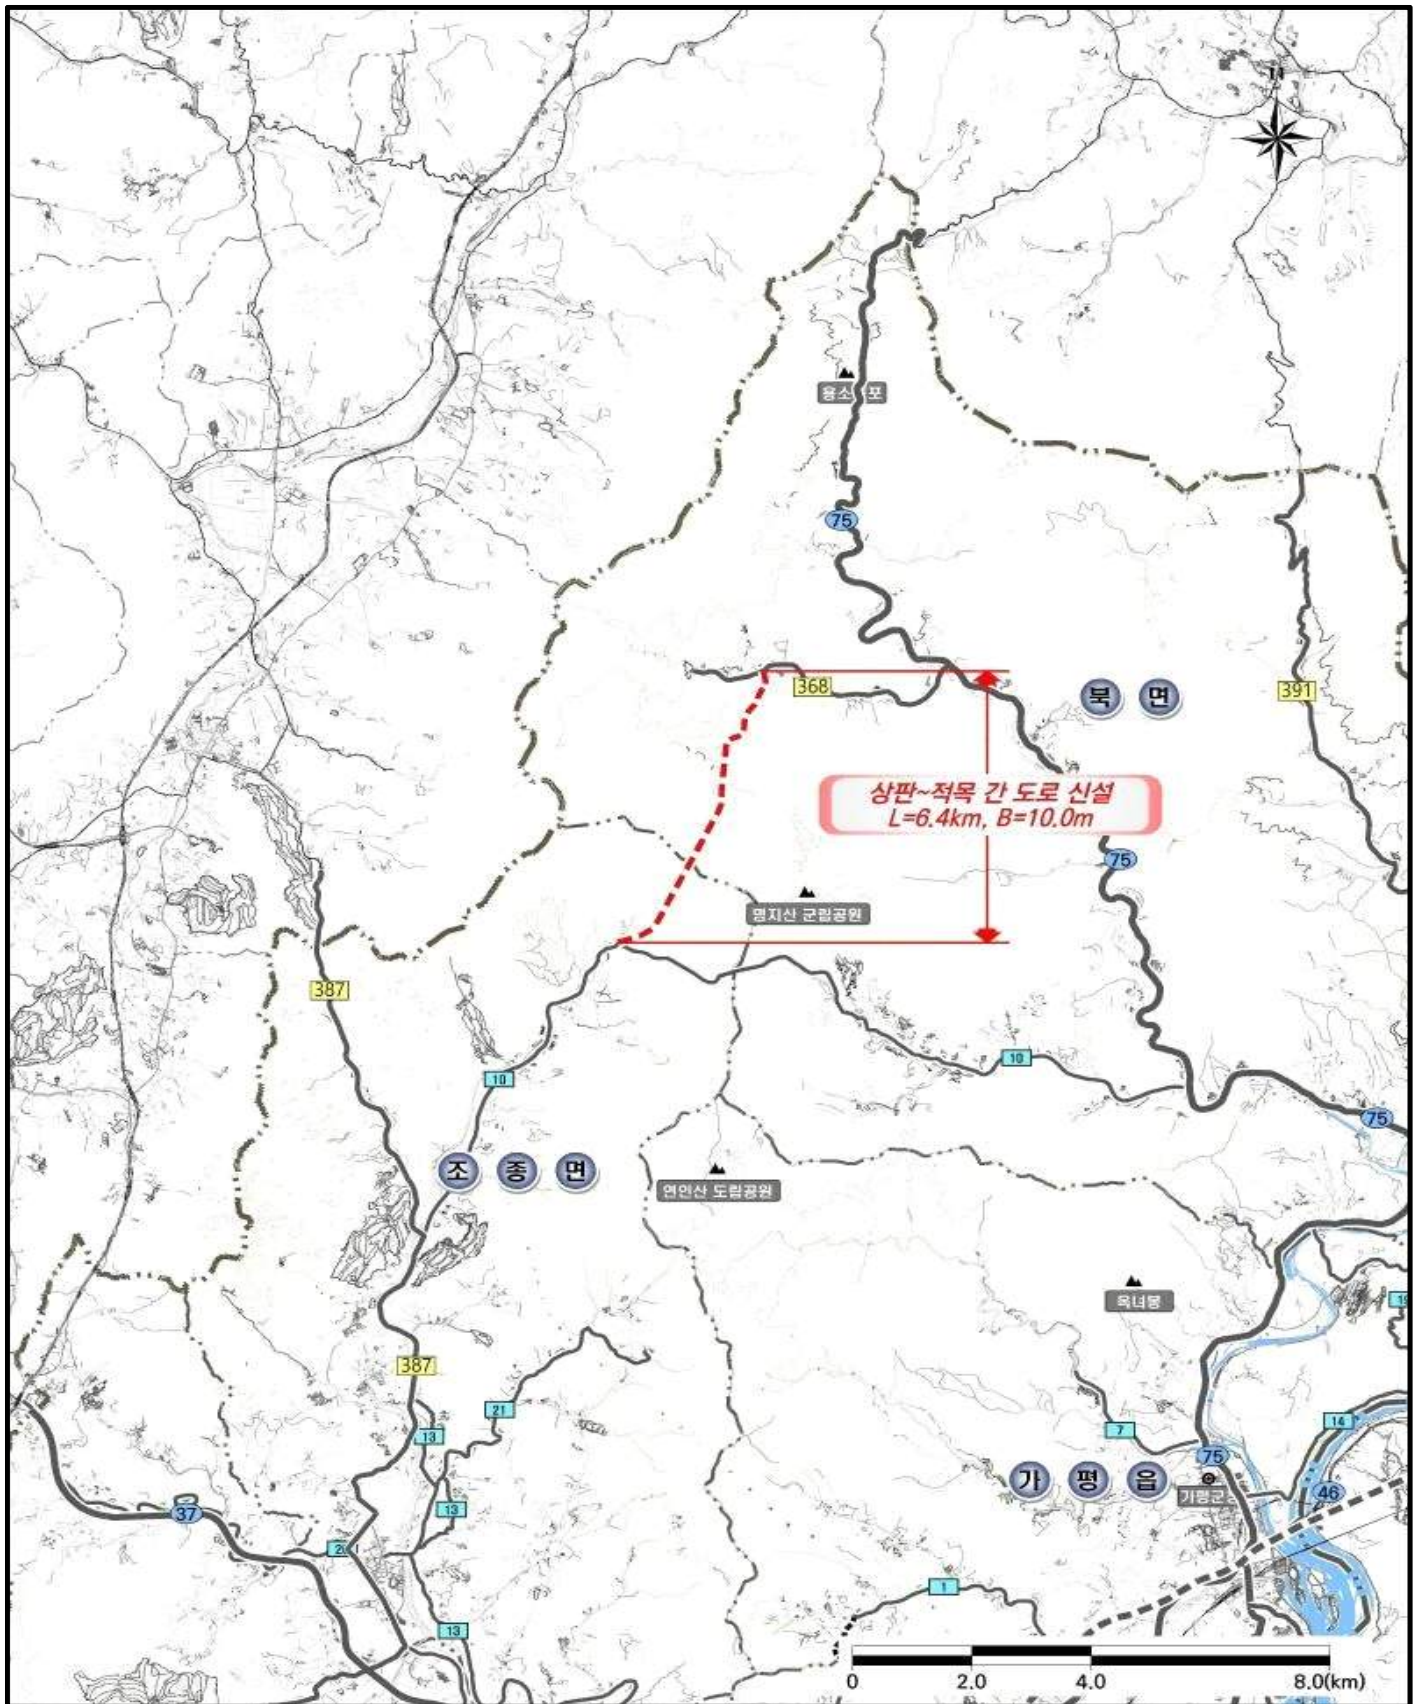

□ 추진실적

구 분		추진실적	비고
2022	3분기	· 장기미추진 지방도사업 정비방안 수립용역 착수(경기도)	
	4분기	· 장기미추진 지방도사업 정비방안 수립용역 착수보고회 개최(경기도) · 현안사업 건의(가평군—경기도지사, 지역구 국회의원)	
2023	1분기	· 당정협의회 건의 · 장기미추진 지방도사업 정비방안 검토의견서 자료 제출(가평군—경기도) · 현안사업 건의(가평군—경기도 행정2부지사, 경기도의원)	
	2분기	· 현안사업 건의(가평군—지역구 국회의원) · 경기북부특별자치도 설치 관련 가평군 사업 건의(가평군—경기도) · 당정협의회 건의	
	3분기	· 경기북부시장군수 협의회 사업 추진 건의 · 경기북부특별자치도 비전 추진 전략 도로분야 선정 ※ 격자형 도로망 : 동서축 노선으로 지방도364호선(가평-현리) 노선 선정	
	4분기	· 장기미추진 지방도사업 정비방안 수립 고시(경기도) ※ 지방도364호선 가평-현리 도로개설사업 재추진(재검토) 결정. · 현안사업 건의(가평군—경기도 부지사)	
2024	1분기	· 제4차 경기도 도로건설계획 수립 용역 착수보고회 참석 · 제4차 경기도 도로건설계획 수요조사 자료 제출(가평군—경기도)	
	2분기	· 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 건의(가평군—경기도) · 「북한강 권역 경기북부 대개발 관광콘텐츠 개발」 사업 건의(가평군—경기도) · 국회 방문 건의	
	3분기	· 경기도 시·군 현장간담회 시 건의 및 경기도 방문 건의 · 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 선정(경기도) · 「경기북부 대개조 프로젝트」 선제적 추진 발표(경기도)	
	4분기	· 경기도 현장 방문 시 건의 · 「경기북부 시군 비전 순회 간담회」 참석 · 「도·시군 도로분야 정책 간담회」 참석 · 「경기 동부권 SOC 대개발 구상 설명회」 참석	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 경기도에서는 ‘22. 6월 장기 보류되고 있는 「지방도364호선 가평-현리 노선」에 대하여 경제성 등이 부족하다는 이유로 일몰사업을 염두에 둔 재검토 용역을 착수하였으나
- 건설과에서는 자체적으로 노선을 분석하여 투자사업비를 대폭 절감시킨 합리적인 대안을 경기도에 제시하고 사업의 당위성을 적극 피력하는 등 사업 재추진에 각별히 신경을 쓴 결과, 최종적으로 가평군에 꼭 필요한 지방도 개설사업 재추진을 관철시키는 큰 성과를 거둠.
- 「제4차 경기도 도로건설계획(2026~2030)」에 반영될 수 있도록 경기도를 지속적으로 방문, 사업의 시급성 등을 적극 피력하여 사업이 조속히 추진될 수 있도록 적극 노력하고자 함.
※ 현재 경기도에서 조속한 사업 추진을 위해 ‘24년도 1회 추경예산에 타당성 조사 용역비(8억)을 확보하여 경기 북부 발전 방안인 「경기 북부 대개발사업」의 일환으로 상기 노선에 대하여 타당성 조사를 추진 중임.


□ 향후계획

○ 관계기관 지속 건의 예정(2025. 1월~)

□ 기대효과

- 가평군 동서관통도로 구축에 따른 지역 접근성 향상으로 지역균형발전 도모
- 수도권제2순환고속도로 및 지방도387호선 연계교통망 구축으로 교통량을 분산하여 국도46호선의 만성적인 교통 지체해소 및 내방객과 지역주민들에게 교통편의 증진 도모

□ 위치도 및 노선도

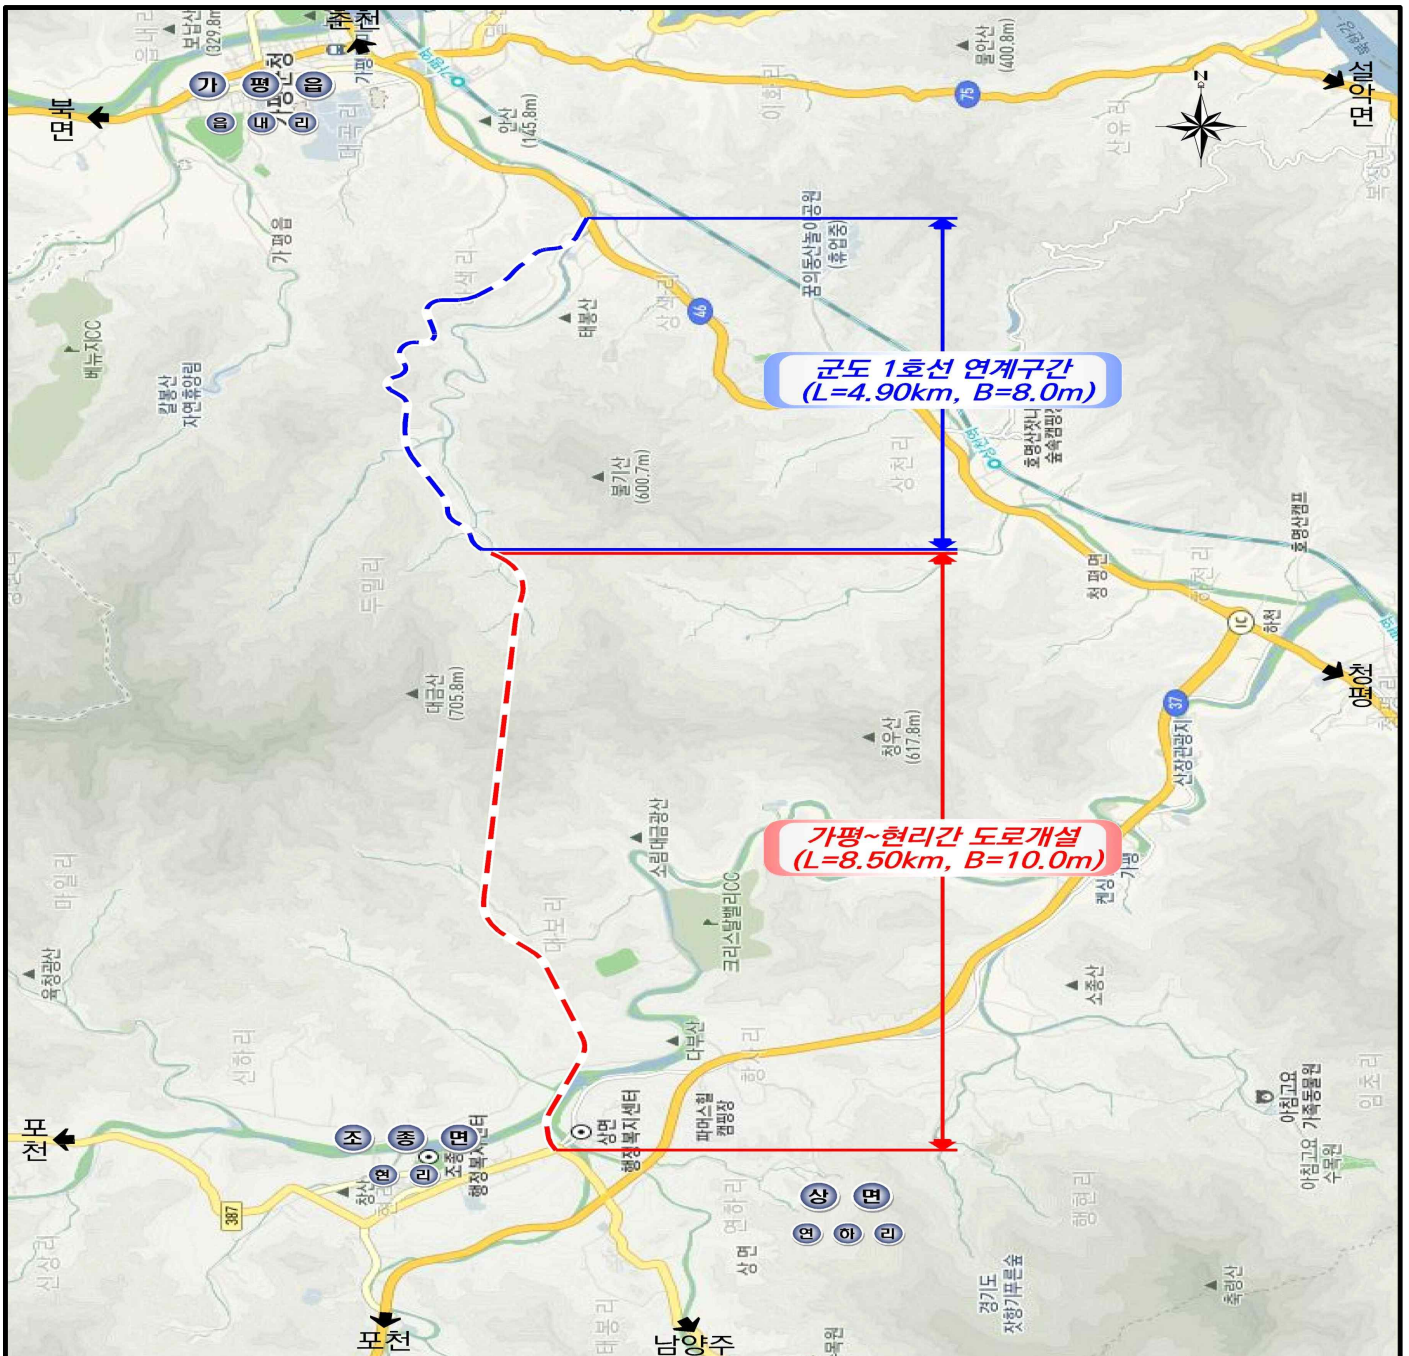

환경정책과

번호	사업명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
3개 사업						100%	
IV-6	가평군 재정여건 개선을 위한 한강수계관리기금 추가확보	가평군	신규	2026 (임기내)	이행후 계속	100	
V-9	전기차 충전 인프라 확대	가평군	신규	2026 (임기내)	이행후 계속	100	
VII-3	환경부 대응 환경정책자문위원회 설치·운영	가평군	신규	2026 (임기내)	이행후 계속	100	

약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.

가평군 재정여건 개선을 위한 한강수계관리기금 추가확보

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅳ-6	환경	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	환경정책과	한강수계팀장	윤다영(2445)	담당자	김미애(2447)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 한강수계기금 추가확보를 통한 가평군 재정여건 개선 및 균형있는 지역발전 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 계속
- 사업위치: 가평군 일원
- 사업규모: 한강수계관리기금 대상사업 (주민지원, 친환경청정, 하수도, 기타분야)
- 확보계획: 100,980백만원 ※ (공약실천계획서: 102,495백만원) 친환경(평생학습관) 사업 규모 축소로 3,956백만원 감소

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	100,980		82,980	14,909	17,314	17,189	15,568	18,000	18,000	
국비										
도비										
군비										
기타	100,980		82,980	14,909	17,314	17,189	15,568	18,000	18,000	기금

○ 사업내용

- 주민지원사업(특별지원), 친환경 청정사업의 공모신청으로 사업비 추가 확보
- 사업비 증액을 위한 법률개정 요구

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	공모사업 선정 추진	· 부서별 공모사업 신청 · 사업비 증액을 위한 법률 개정 검토	-	-
2023	공모사업 선정 추진 신규사업 추가 발굴	· 부서별 공모사업 신청 및 추가사업 발굴 · 사업비 증액을 위한 법률 개정 요청	35	35
2024	공모사업 선정 추진	· 부서별 공모사업 신청 · 사업비 증액을 위한 법률 개정 요청	25	65
2025			25	
2026 상반기			15	

□ 추진실적

○ 한강유역환경청공모사업

구분		사 업 명	기금확보액(백만원)	비 고
계		4개 사업	2,332.3	2022년 3분기
2023	특별지원	설악 반다비 문화체육센터 건립	1,000.0	기금:지방비=7:3
		청평면 대성리 오수관로 설치사업	412.3	
		보납산-늪산 생태통로 연결사업	200.0	
	친환경 청정	친환경 평생학습관 건립	720.0	기금:지방비=6:4
구분		사 업 명	기금확보액(백만원)	비 고
계		2개 사업	5,577.0	2023년 4분기
2024	특별지원	청평면 종합사회복지회관 건립	3,400.0	
	친환경 청정	친환경 평생학습관 건립	2,177.0	
구분		사 업 명	기금확보액(백만원)	비 고
계		3개 사업	1,980.0	2024년 4분기
2025	특별지원	청평 폐철길 둘레길 조성사업	800.0	
	친환경 청정	친환경 평생학습관 건립	800.0	
		친환경 산림문화 활성화 지원센터 건립	380.0	

○ 2024. 5.: 친환경 청정사업 사업비 1,000백만원 추가확보(3,177백만원)

※ 2024년 한강수계관리기금 총 18,642백만원 확보 및 공약 이행

○ 2024.12.: 친환경 청정사업(친환경 평생학습관건립) 사업비 감액(3,177백만원→1,724백만원)

◇ 2024.7.3. 한강수계관리기금 18,642백만원 확보에 따른 공약사업 이행 완료보고를 하였으나, 친환경청정사업(친환경 평생학습관건립) 사업규모 축소에 따른 사업비 감액(1,453백만원)

○ 2024년 기금사업비 확보 현황(최종 17,189백만원 확보)

사업분야	사 업 명	2022년	2023년	2024년			비고
				본예산	5월	12월(최종)	
	계	14,909	17,314	17,487	18,642	17,189	백만원
주민지원사업	주민지원사업(일반지원)	4,386	4,171	3,988	3,988	3,988	
	주민지원사업(특별지원)	-	1,612	3,400	3,400	3,400	
	주민지원사업 평가 및 DB지원	72	81	69	81	81	
하수도분야	환경기초시설 설치	3,622	2,703	457	457	457	
	환경기초시설 운영	6,443	7,296	7,173	7,173	7,173	
	수질자동측정감시장치 설치	-	330	-	-	-	
친환경청정	친환경청정사업	-	720	2,177	3,177	1,724	
기 타	오염총량관리사업	132	130	146	146	146	
	비점오염저감사업	21	42	49	49	49	
	댐 부유물 운반처리 비용	43	31	28	28	28	
	하천변 쓰레기 수거사업	190	198	-	143	143	

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

- 한강수계관리기금의 많은 비중을 차지하는 주민지원사업과 하수도분야 지원 규모 확대 등 지속적 건의
- 2026년도 한강수계관리기금 공모사업비(우수주민 특별지원사업 및 친환경 청정사업) 확보 추진
 - 사업 부서와의 협력을 통해 우수주민 특별지원사업 및 친환경 청정사업 발굴 및 공모: 2025. 1.~ 9.

□ 기대효과

- 상수원관리지역 주민의 생활환경개선 및 각종 수질개선사업 지원을 통한 팔당상수원 수질 보전 및 가평군 지역발전 도모

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

전기차 충전 인프라 확대

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-9	환경	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	환경정책과	대기관리팀장	김민모(2440)	담당자	남가운(2443)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 전기차 충전 인프라 확대로 전기차 보급 촉진 및 친환경 도시 구축
- 기존 내연 기관차량의 효과적인 전기차 전환 유도로서 차량에서 배출되는 대기오염물질 저감 및 탄소중립 실현

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 계속
- 사업위치: 가평군 관내
- 사업규모: 20대/년
- 소요예산: 비예산
- 사업내용: 전기자동차 충전시설 확충

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	20대	· 공공부분 전기차 충전시설 확대	20	20
2023	20대	- 전기자동차 충전인프라 구축사업 지원 신청(환경부, 경기도) - 전기자동차 충전인프라 구축사업 재원마련을 위한 기금 등 신청	20	20
2024	20대	- 한국전력공사 등 전기차 충전시설 설치를 위한 관련기관 협업 추진	20	60
2025	20대	· 민간 공중이용시설 전기차 충전시설 확대 - 충전시설 설치 의무대상 기숙시설에 대한 충전시설 설치 추진	20	
2026 상반기	20대	- 신규 건축물의 전기차 충전시설 등의 설치 안내 및 권고	20	

□ 추진실적

구 분		추진실적	비고
2022	4분기	- 경기도 전기차 충전인프라 구축 지원사업 선정 - 급속 충전시설 / 설악면 공영주차장(1) / 총 1대 - 전기차 충전시설 설치 의무 대상 공공·공중이용시설 설치 현황 파악 및 설치 안내 - 총 86개소(공공기관 48, 공중이용시설 21, 공동주택 17)	
2023	1분기	- 전기자동차 공용 완속충전시설 설치 신청 홍보 안내 - 공동주택, 사업장, 대규모 주차장 등 소유 및 운영 주체 모두 신청 가능	
	2분기	- 한국전력공사 공용 전기차 충전소 구축 사업 수요 신청(5개소) ※ 타당성 조사 결과 최종 미선정 - 경기도 전기차 충전인프라 구축 지원사업 선정 - 듀얼 충전시설 / 가평군 보건소(1), 청평역 공영주차장(1), 운악산 공영주차장(1), 산장관광지(1), 상면 생활체육공원(1) / 총 5대	
	3분기	- 환경부 공공급속충전시설 설치 사업 선정 - 급속 충전시설 / 가평군 눈썰매장(1), 북면 생활체육공원(1), 음악역1939 주차장(3), 조종면 청소년문화의집(2) / 총 7대	
2024	1분기	환경부 전기자동차 공공급속충전시설(5개소) 및 경기도 전기자동차 충전인프라 구축사업 설치(6개소) 신청	
	2분기	- 경기도 전기자동차 충전인프라 구축사업 선정 - 급속(듀얼) 충전시설 / 상천역 공영주차장 / 총 1대	
	3분기	2025 경기도 전기자동차 충전인프라 구축사업 설치 신청(가평군청 외 5개소)	
	4분기	전기차 충전시설 총 613개소 확보(전년대비 174개소 증)	

○ 관내 전기차 충전시설 설치현황

구분	유형	임기 전	임기 중				민선8기 증감	비고
		'22.6.	'22.12.	'23.12.	'24.6.	'24.12.		
계		187	235	439	515	613	426(증)	(단위:대)
민간		154	202	364	439	521	367(증)	
공공	급속	7	9	36	47	50	43(증)	
	듀얼	22	16	17	17	19	3(감)	
	완속	4	8	22	12	23	19(증)	

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

- 충전시설 미설치 공공 및 다중이용시설 충전시설 설치 추진
- 충전시설 설치 지원 홍보 및 안내를 통한 민간 충전시설 보급 확대 등

□ 기대효과

- 차량 운행 중 CO2 및 대기오염물질 배출이 없는 전기자동차의 보급 확대로 대기환경 개선 및 친환경 도시 구축
- 친환경 관광도시 이미지 제고로 관광산업 및 지역경제를 활성화함은 물론 친환경 도시 브랜드 창출

약속Ⅶ 군민의 눈높이에서 일 잘하는 가평군이 되겠습니다.

환경부 대응 환경정책자문위원회 설치 · 운영

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅶ-3	환경	주민참여는 더 활발하게	가평군	신규	단기	임기 내
추진부서	건설도시국	환경정책과	환경정책팀장	정상호(2240)	담당자	정재현(2241)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 100%

□ 추진방향

- 군정 발전을 위한 환경규제 및 갈등요인 해결을 위해 환경부 대응 환경정책자문위원회 설치
- 환경활동가 등 학식과 경험이 풍부하고 군민의 신망이 두터운 사람을 위원으로 위촉하여 환경정책자문위원회의 설치 및 운영

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 하반기 ~ 계속
- 사업규모: 위원회 구성(20명 이내)
- 소요예산: 53백만원(군비) ※ 공약실천계획서: 비예산

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	53		53		24	7	11	11		
국비										
도비										
군비	53		53		24	7	11	11		
기타										

- 사업내용: 환경정책자문위원회 설치 및 운영

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022. 하반기	위원회 설치 및 구성	· 위원회 설치계획 수립 · 위원회 관련 조례 제정 및 시행	50	50
2023. 상반기 이후 계속	위원 선정 및 활동	· 자문위원 선정 등 위원회 구성 및 위촉 · 위원회 개최 및 운영	50	50

□ 추진실적

구 분		추진실적	비고
2022	4분기	· 「가평군 환경정책자문위원회 설치 및 운영조례」 제정 및 시행	
2023	1분기	· 가평군 환경정책자문위원회 위원 선정 및 위촉 완료	
2024	1분기	· 가평군 환경정책자문위원회 위원 2명 추가 위촉	
	2분기	· 가평군 환경정책자문위원회 위원 1명 해촉	
	3분기	· 가평군 환경정책자문위원회 위원 1명 추가 위촉(총 18인)	

○ 가평군 환경정책자문위원회 운영 결과

차 수	일 자	참석현황	주요안건
계	5회		
‘23년 1차	‘23.02.24.	14/16	· 공동위원장 및 부위원장 선출 · 가평군 환경계획(안) 보고 및 자문
‘23년 2차	‘23.05.25.	10/16	· 토지 등 매수 및 수변녹지 조성·관리 업무처리지침 개정 · 한강수계관리기금 운용규칙 개정 · 2024년 공공하수도분야 신규 국고보조사업 신청
‘23년 3차	‘23.09.12.	10/16	· 가평군 2050탄소중립녹색성장위원회 기능 대행 · ‘24년 한강수계관리기금 공모사업 신청
견학	‘23.10.31	9/16	· 금강유역 물 관리 및 생태공원 견학 및 간담회
‘23년 4차	‘23.12.14.	8/16	· ‘24년 환경정책자문위원회 자문안건 추진 보고 및 자문
‘24년 1차	‘24.03.29.	10/18	· ‘25년 한강수계관리기금 공모사업 신청 · ‘25년 공공하수도 분야 신규 국고보조사업 신청 · ‘23년 가평군 기후위기 적응대책 이행점검 심의
‘24년 2차	‘24.06.26.	12/17	· 하수처리구역 내(內) 수변구역 해제 건의 · ‘25년 한강수계관리기금 특별지원 공모사업 신청
‘24년 3차	‘24.09.27.	10/18	· 2025년 우수주민지원 특별지원사업 선정결과 보고 · 한강수계 상수원관리지역 주민지원사업 대상자 확대 안건 자문 · 한강수계 상수원관리지역 주민지원사업 광역사업 수립기준 확대 안건 자문
견학	‘24.11.06.	12/18	· 강원지역 물 관리 및 공공하수처리시설 등 견학
‘24년 4차	‘24.12.16.	12/18	· 2024년 환경정책자문위원회 자문안건 추진결과(계획) · 가평군 탄소중립·녹색성장 기본계획 중간보고 · 2024년 가평군 탄소중립지원센터 사업성과 평가

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 기대효과

- 특별대책지역, 수변구역 등 규제 및 급변하는 환경정책 대응 역량 강화
- 역량 있는 민간 자문위원과의 환경정책 네트워크 구축

자 원 순 환 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						55%	
V-10	친환경 자원회수시설(소각) 설치	가평군	신규	2028 (임기외)	정상추진	55	

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

친환경 자원회수시설(소각) 설치

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-10	환경	주민안전은 더 세심하게	가평군	신규	장기	임기 외
추진부서	건설도시국	자원순환과	자원시설팀장	최석준(2530)	담당자	이근용(2534)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 55%

□ 추진방향

- 입지: 「폐기물시설촉진법」에 따른 입지 선정으로 투명성 확보
- 시설: 안정적·친환경·자원회수에 유리한 시설의 설치
- 운영: 안전한 시설 운영을 통하여 주민의 휴식, 재생산 공간으로 활용

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 3. ~ 2028. 12.
- 사업위치: 가평읍 상색리 산67-3번지 일원(최종후보지)
- 사업규모: (소각규모) 85톤/일 (생활폐기물 70톤/일 + 하수슬러지 15톤/일)
- 소요예산: 69,623백만원 ※ 폐기물처리시설 국고보조금 표준공사비 적용

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	69,623		14,575			90	200	14,285	55,048
국비	21,901		4,585					4,585	17,316
도비	15,533		3,252					3,252	12,281
군비	32,189		6,738			90	200	6,448	25,451
기타									

○ 사업내용

- 2023.: 입지타당성 조사 및 환경영향평가를 통한 입지 분석, 사업추진방식 결정
- 2024. ~ 2026.: 입지선정, 부지매입, 민간투자사업자 선정, 자원협의를, 관련인허가
- 2026. ~ 2028.: 소각시설 설치공사 및 시험가동

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	55
2022 하반기	입지 후보지에 대한 평가 실시	· 2022.08: 후보지 입지타당성 조사 용역 계약 · 2022.08: 전략환경영향평가 계약심사 및 계약	10	10
2023	입지선정 절차 진행	· 2023.05: 3차 입지선정위원회 개최 · 2023.06: 4차 입지선정위원회 개최 · 2023.08: 5차 입지선정위원회 개최 · 2023.08: 전략환경영향평가 초안 작성 완료 · 2023.08: 주민의견수렴(공람 및 주민의견제출) · 2023.10: 주민설명회 개최 · 2023.10: 전략환경영향평가서 협의(한강유역청) · 2023.12: 사업추진방식 결정	30	30
2024	입지선정, 민간투자사업 적정성 검토	· 2024.01: 민간투자사업 제안서 접수 · 2024.04: 전략환경영향평가서 협의(한강유역청) · 2024.04: 폐기물처리시설(소각)입지 결정·고시 · 2024.06: 제안서 검토 의뢰(PIMAC 및 검토기관)	15	15
2025	사업시행자 선정	· 2025.04.: 민간투자사업 추진결정 · 2025.04.: 제3자 제안 공고 · 2025.11.: 실시협약 체결 및 사업시행자 지정	15	
2026 상반기	공사 착공	· 2026.03: 통합환경허가 완료 · 2026.03: 실시계획 승인 · 2026.06: 공사 착공	10	
임기후	공사 준공	· 2028.12: 공사 준공	20	

※ 비율은 행정소요기간과 예산 투자율 등을 검토하여 산정

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2022	3분기	· 입지선정위원회 개최: (1차)입지후보지 검토, (2차)타당성조사기관 선정 · 전략환경영향평가 용역 착수 · 입지타당성조사 용역 입찰 공고	
	4분기	· 입지타당성조사 용역 착수	
2023	2분기	· 입지선정위원회 개최: (3차)대체후보지 2개소 선정, (4차)입지후보지 배점기준 결정	
	3분기	· 입지선정위원회 개최: (5차)후보지 평가 및 최종후보지 선정 · 전략환경영향평가서 초안 제출 (가평군 → 한강유역환경청)	
	4분기	· 전략환경영향평가 초안 공람 및 주민설명회 개최 · 전략환경영향평가서(초안) 의견 회신(한강유역환경청 → 가평군) · 사업추진 방식 결정을 위한 소통회의 개최(민간투자사업 추진)	
2024	1분기	· 민간투자사업 사업제안서 접수 및 보완 요청 · 전략환경영향평가서 제출 (가평군 → 한강유역환경청)	

구 분		추진 실적	비고
		· 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3.19. - 내용: 공약명(구: 친환경 열순환 재생자원 소각로 설치), 사업기간, 소요예산, 사업규모 등 - 사유: 행정절차 이행 소요기간, 규모 변경 및 환경부 단가 인상, 타당성 조사 결과 반영	
	2분기	· 전략환경영향평가 협의 완료 · 주민설명회 개최 · 자원회수시설(소각) 입지 결정·고시 완료 · 민간투자사업 사업제안서(보완) 접수	
	3분기	· 민간투자사업 사업제안서 검토 의뢰(공공투자관리센터)	
	4분기	· 민간투자사업 사업제안서 검토 중지(주민편익시설 포함 필요) · 민간투자사업 사업제안서 검토 재착수(주민편익시설 포함 완료)	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 소각시설 설치에 대한 부정적 인식 및 상생리 태양광 발전시설 등으로 인근 지역주민들의 반발 제기
 - ▶ 지역주민 인식전환을 위해 타 지자체 유사시설 견학 및 지역주민 지속적 협의 추진 등을 통한 지역인 유대 강화

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	3분기	· 적격성 조사 및 제안서 검토 완료(공공투자관리센터) · 민간투자사업 추진에 대한 군의회 동의 및 추진 결정	
	4분기	· 제3자 제안 공고	
2026	1분기	· 우선협상대상자 선정	
	2분기	· 실시협약 체결 및 사업시행자 지정	
	3분기	· 통합환경허가 완료 및 실시계획 승인 · 공사 착공(2026. 9.)	
2029	1분기	· 공사 완료(2029. 1.)	

□ 기대효과

- 위생매립장의 추가 확보가 현실적으로 어려운 상황에서 소각시설 설치를 통해 가용기간을 연장함으로써 생활폐기물의 안정적인 처리
- 「폐기물관리법」 개정으로 2026년 생활폐기물의 직매립 금지 등 변화하는 환경정책에 대응
- 생활폐기물의 안정적 처리기반 확보 및 자원의 재활용 기여
- 하수슬러지의 안정적인 자체 처리와 생활폐기물의 외부 위탁에 소요되는 비용 절감

도 시 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
4개 사업						73.25%	
Ⅳ-1	명품주거단지 1만호 건설(군인아파트 등) 목표로 주거문제 해결	민간	신규	2026 (임기내)	이행후 계속	100	금회 완료
Ⅳ-2	북면도시공원 야간 경관 조성	가평군	계속	2023 (임기내)	완료	100	
Ⅳ-3	수도권정비계획법 자연보전권역 규제 완화	가평군	신규	2026 (임기내)	정상추진	55	
V-8	청평역, 상천역 역세권 활성화 (기반시설 확충)	가평군	계속	2027 (임기외)	정상추진	38	

약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.

명품주거단지 1만호 건설(군인아파트 등) 목표로 주거문제 해결

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅳ-1	도시	주민안전은 더 세심하게	민간	신규	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	도시과	도시계획팀장 박상민(2350)	담당자	김도혁(2463)	
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 100%

□ 추진방향

- 주거지역내 주택건설사업을 통한 양질의 주택 제공
- 시가화 개발을 통한 계획적인 개발계획 수립

□ 사업개요


- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 가평읍, 설악면, 청평면 일원
- 사업내용: 도시개발사업(공동주택) 및 주택건설사업계획승인
- 사업내용: 총 22개소, 10,332세대 / 주택건설사업 (※ 5개소, 1,578세대)
 - 가평읍: 13개소, 5,611세대(※ 4개소, 1,158세대)
 - 설악면: 4개소, 2,744세대(※ 1개소, 420세대)
 - 청평면: 5개소, 1,977세대
- 소요예산: 2,256,600백만원(전액민자) ※ 공약실천계획서: 2,325,600백만원

구분	총사업비	임기 내						임기 후	비고
		소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	2,256,600	2,256,600	100,000	1,000,000	600,000	331,000	225,600		
국비									
도비									
군비									
기타	2,256,600	2,256,600	100,000	1,000,000	600,000	331,000	225,600		

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
	10,500세대	계	100	100
2022 하반기	2,000세대	씨티호반청평, 신천2지구, 신천3지구	13.5	13.5
2023	3,000세대	센트럴파크, 달전2지구, 대곡1·2지구	18	18
2024	3,000세대	읍내지구, 청평3지구, 달전5·6·7지구 하색1·2지구, 디엘본	36	36
2025	1,500세대	청평역세권2지구, 청평2지구, 신천4지구, 대곡3지구, 읍내3지구	23	23
2026 상반기	1,000세대	달전4지구, 청평5지구	9.5	9.5

□ 사업절차



□ 추진실적

구분	사업명	위치	세대수	진행상황	향후계획	비 고
			10,332	9,950		
1	씨티호반청평	청평리 731-18 (청평댐)	292	실시계획인가	착공, 준공	2023.05.실시계획인가
2	신천2지구	신천리 79 (설악고등학교)	302	실시계획인가	착공, 준공	사업인정협의예정
3	신천3지구	신천리 산45-1 (디엘본뒤)	1,040	착공	준공	2025.12.준공
4	청평역세권2지구	청평리 135 (안전유원지)	401	구역지정	실시계획인가~준공	2022.07.구역지정완료
5	센트럴파크	읍내리 457-5 (가평군청 앞)	205	준공		2022.08.준공
6	청평2지구	청평리 산14-1 (청평고등학교)	351	구역지정	실시계획인가~준공	2022.12.구역지정완료
7	신천4지구	신천리 산64 (구 아울렛)	982	구역지정	실시계획인가~준공	2023.08.구역지정완료
8	달전2지구	달전리 산40 (현충탑)	499	실시계획인가	착공, 준공	2024.03.실시계획인가
9	하색1지구	하색리 24 (북경장 뒤)	545	구역지정	실시계획인가~준공	2023.09.구역지정완료
10	하색2지구	하색리 48 (북경장 뒤)	554	구역지정	실시계획인가~준공	2023.09.구역지정완료
11	대곡지구	대곡리 291-6 (이편한)	472	준공		2023.08.준공
12	대곡2지구	대곡리 390-2 (자이)	526	준공		2023.08.준공
13	읍내지구	읍내리 224 (힐스테이트)	451	준공		2023.11.준공

구분	사업명	위치	세대수	진행상황	향후계획	비 고
			10,332	9,950		
14	청평3지구	청평리 산81-18 (청평중학교)	551	착공	준공	2023.11.실시계획인가
15	달전5지구	달전리 285 (넥스빌 옆)	260	구역지정		주택건설사업승인
16	달전6지구	달전리 284-7	372	착공	준공	주택건설사업승인
17	달전7지구	달전리 353	321	구역지정		주택건설사업승인
18	대곡3지구	대곡리 산24-5 (이편한 위)	499	구역지정	실시계획인가~준공	2023.08.구역지정완료
19	읍내3지구	읍내리 255 (힐스테이트 옆)	415	구역지정	주택건설사업계획승인	2023.08.구역지정완료
20	디엘본	신천리 산45-27	420	착공	준공	2025.12.준공
21	달전4지구	달전리 494 (달전교차로)	492	구역지정	실시계획인가~준공	2024.08.구역지정완료
22	청평5지구	청평리 617-13 (아랫삼거리)	382	수용통지	구역지정~준공	2023.08.제안수용통지

□ 추진상 문제점 및 대책

- 최근 주택건설 자금조달의 어려움으로 일부 사업 추진 지연

□ 향후계획

- 1만호 명품주택 건설 목표 완성을 위한 지속적 행정지원

□ 기대효과

- 양질의 주거공간 조성을 통한 수도권 인구 유입 및 지역 경제 활성화에 따른 생활 인구 증가
- 공공기여시설 기부채납에 따른 관내 기반시설 확보
- 대규모 공사로 인한 지역경제 활성화

약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.

북면도시공원 야간 경관 조성사업

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅳ-2	도시	주민안전은 더 세심하게	가평군	계속	단기	임기 내
추진부서	건설도시국	도시과	도시개발팀장	전창영(2370)	담당자	임재범(2371)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

□ **추진방향**

- (필요성) 수려한 자연경관으로 다수의 관광객이 방문하고 있는 북면지역 내 도시공원에 대하여 관광명소로 조성하여 날로 침체되는 지역경제 활성화에 기여
- 북면 행정복지센터와 인접한 목동 근린공원에 대하여 지역주민의 휴식처와 더불어 관광명소로 거듭날 수 있는 계기 마련

□ **사업개요**

- 사업기간: 2021. 4. ~ 2024. 4.
- 사업위치: 북면 목동리 목동근린공원 일원
- 사업규모: 야간경관시설이 접목된 타워전망대 설치 1개소(H=30m, D=18m)
- 소요예산: 5,036백만원(공사비 4,836 / 설계및감리비 200)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	5,036	3,000	2,036		2,036				
국비									
도비	2,800	2,800							
군비	2,236	200	2,036		2,036				
기타									

- 사업내용
 - 관광휴게실(관망탑) / 지상 1층 (건축면적=212.61㎡, 연면적=212.61㎡)
 - 관광조명 설치 1식 (LED등 43개 설치)
 - 엘리베이터 1개소, 그네 설치 2개소, 난간 및 게이트 설치

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2023		· 2023. 4: 전망대 철골구조물 현장반입 및 설치 · 2023. 5: 경관조명 및 엘리베이터 설치 · 2023. 6: 주공정 완료 · 2023.10.: 부대시설 설치 후 사업완료	100	100
2024		· 2024. 4.: 도색작업 등 마무리 공정 진행 후 사업완료		

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2022	2분기	· 전망대 설치 전체분, 1차분 계약체결	
	3분기	· 1차분 공사 착공, 전기공사 계약체결 및 착공	
2023	2분기	· 기초 설치 완료, 전망대 철골구조물 현장반입 및 설치	
	4분기	· 전망대 주요 철골구조물 및 부대설비 등 설치	
2024	1분기	· 마무리 도색작업 진행 · 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3.19. - 내용: 사업기간(2021. 4. ~ 2023. 6. → 2024. 4.) - 사유: 진입로 설치, 데크계단 설치 및 공사 중지에 따른 사업기간 변경	
	2분기	· 사업 준공 · 안내판, 미끄럼방지 패드 등 안전시설물 설치공사 실시	
	3분기	· 전망대 시설물 개방	

□ 기대효과

- 목동 근린공원 내 야간경관시설이 접목된 전망대 설치를 통한 지역 명소 조성으로 관광객들에게 볼거리와 즐길거리를 제공하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사진



약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.

수도권정비계획법 자연보전권역 규제 완화

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅳ-3	도시	주민안전은 더 세심하게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	도시과	도시계획팀장 박상민(2350)	담당자	윤성문(2351)	
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 55%

□ 추진방향

- 가평군은 인구소멸지역으로 수도권의 과밀인구화는 상반되므로 수도권에서 제외될 수 있도록 추진
- ※ 대안: 수도권의 인구소멸대상 지역인 연천, 강화와 협력하여 수도권에서 제외 추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 가평군 전역
- 사업규모: 관련 규정 (수도권정비계획법 시행령) 개정
- 소요예산: 비예산
- 사업내용
 - 인구소멸지역에 해당되는 지역과 협력하여 수도권에서 제외될 수 있도록 지속적 건의

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	55
2022 하반기	수도권 규제 문제점 제기	수도권 규제개선 건의	5	5
2023	수도권규제 완화 공감대 형성		25	25
2024			25	25
2025			25	
2026 상반기	수도권규제 개선 절차 진행		20	

□ 추진실적

구 분		추진실적	비고
2022	3분기	· 수도권규제 개선 건의자료 전달 (국토부교통부장관 면담)	
	4분기	· 수도권규제 문제점 제출 및 상담 (달리는 국민신문고) · 경기북부 발전 학술포럼 개최 (제3차 수도권정비계획의 평가와 개선방안) · 연천·강화·가평 국회의원 결의문 채택	
2023	1분기	· 불합리한 규제개선 과제 제출(산업단지위 심의시 수도권정비위 심의 면제) · 수도권정비계획법령 관련 제도개선 건의사항 제출(국토부교통부장관 면담)	
	2분기	· 인구감소지역의 수도권 규제 제외 및 자연보전권역 행위제한 규모 완화 건의(경기도 제출)	
	3분기	· 수도권 규제의 합리적 조정을 위한 자연보전권역 시·군 단체장 회의 추진 및 제도개선 건의(국토부 제출)	
2024	2분기	· 자연보전권역 규제개선 간담회 제도개선 건의사항 제출 (경기도 제출)	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 수도권(자연보전권역) 규제완화는 비수도권지역의 반발 및 타 권역의 무관심으로 시행령 개정도 어려운 상황으로 가평, 연천, 강화, 옹진 및 자연보전권역 시·군과 연대하여 규제완화의 불가피성 피력

□ 향후계획

- 수도권규제 개선 필요성의 공감대 형성을 위한 지속 건의

□ 기대효과

- 다양한 유형의 주택공급으로 주거의 질 향상 및 주택 공급난 해소
- 산업단지 규모 확대에 따른 규모의 경제 실현으로 수질오염 방지시설 등 기반시설 일괄설치 및 산업단지 분양가 인하
- 산업단지 내 공장 유도로 개별입지공장 설치 억제

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

청평역, 상천역 역세권 활성화 (기반시설 확충)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-8	도시	주민안전은 더 세심하게	가평군	계속	장기	임기 외
추진부서	건설도시국	도시과	도시재생팀장	이진어(2460)	담당자	박성호(2461)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 38%

□ **추진방향**

- 역세권 기반시설 조성사업의 현실적 재정여건 및 주변상황을 고려하여 주요도로 우선 시행
- 역세권 지구단위계획 재정비 결과로 단계별 집행계획에 따라 사업추진

□ **사업개요**

- 사업기간: 2022 ~ 2027
- 사업위치: 청평역·상천역 신역사 일원
- 사업규모: 청평: 도로 3개소(L=1,130m), 상천: 도로 1개소(L=650m)
 - ※ 청평: 도로 3개소 중 도로 2개소(L=550m) 공사완료, 도로 1개소(L=580m) 보상중
 - ※ 상천: 도로 1개소(L=650m) 보상중
- 소요예산: 총사업비 37,450백만원(청평: 23,200, 상천: 14,250)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	37,450	23,940	13,510	1,000	1,500	2,060	1,350	3,000	4,600	
국비										
도비										
군비	37,450	23,940	13,510	1,000	1,500	2,060	1,350	3,000	4,600	
기타										

- 사업내용
 - 지구단위계획 구역 내 주요 간선도로를 조성하여 지역개발 활성화

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진 계 획			목표이행률	공정률
계					100	38
2022 하반기	실시계획인가 고시	· 청평 중로2-5호선 공사 완료 · 연말까지 보상계획 공고			5	5
구 분		청평 중로 2-1호선	청평 중로 2-7호선	상천 중로 1-8호선		
2023	보상 추진	· 보상 완료		· 보상 추진	10	8
2024	보상 및 공사추진	· 공사 완료	· 보상 추진	· 보상 추진	25	25
2025	보상 추진			· 보상 추진	20	
2026	보상 및 공사추진		· 보상 추진	· 공사 추진	20	
2027	공사 완료		· 공사 완료	· 공사 완료	20	

□ 추진실적

구 분		추진실적				비 고
		청평 중로 2-5호선	청평 중로 2-1호선	청평 중로 2-7호선	상천 중로 1-8호선	
2022	2분기	준공				
2023	2분기		손실보상 협의 요청(2·3차)			
	3분기		수용재결 신청			
	4분기		보상 완료			
2024	1분기	· 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3.19. - 내용: 사업기간(~2025 → 2027), 사업규모(중로3-2호선 제외), 소요예산 - 사유: 주민 의견 적극 수렴 및 지역 접근성과 이동 편의성을 향상시키고자 내부도로(중로3-2) 제외 및 외곽순환도로 우선 개설				
	2분기		착공	손실보상 협의 요청(1차)	보상 추진 (일부필지 보상완료)	
	3분기		준공	일부토지 보상완료 (6필지)	일부토지 보상완료 (2필지)	
	4분기			소규모재해영향평가 · 환경영향평가 착수		

□ 추진상 문제점 및 대책

- 2025년 상천 역세권 예산 미반영으로 추경 확보 예정

□ 향후계획

- 청평 상천 역세권 공사 완료(2027. 12.)

□ 기대효과

- 기반시설 확충을 통한 지구단위계획구역 내 발전의 기틀 마련
- 도시계획도로 장기 미집행시설 해소로 인한 주민들의 불편해소

□ 위치도(청평)



□ 위치도(상천)



교 통 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
4개 사업						82.5%	
Ⅲ-6	드론 아카데미 확대 운영	가평군	계속	2026 (임기내)	이행후 계속	100	금회 완료
Ⅳ-4	GTX-B 노선 가평 연장 확정	국토부	신규	2026 (임기내)	완료	100	
Ⅳ-5	대중교통 시스템 및 노선확충 (7000노선 : 잠실-청평-가평)	국토부 경기도	계속	2026 (임기내)	정상추진	60	
V-7	읍면별 도심지 주차장 확충 추진	가평군	계속	2026 (임기내)	정상추진	70	

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

드론 아카데미 확대 운영

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-6	관광	지역문화는 더 다채롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	교통과	교통행정팀장	라주희(2202)	담당자	강윤경(2208)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 100%

□ **추진방향**

- 기초 및 전문가 수준이상 교육과정이 가능한 드론 양성교육기관과의 업무협약 운영
- 각종 현장에서 활용 가능한 드론 전문자격 취득 및 교육 확대로 취업기회 강화 등

□ **사업개요**

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 가평군 설악면 위곡리 3-4 (한컴 아카데미 청리움)
- 사업규모: 초경량비행장치 교육기관과의 협약을 통한 드론 아카데미 확대 운영
- 소요예산: 303백만원 ※ (공약실천계획서: 320백만원) 25년 예산 반영(기취득자 운영 활용 삭감)에 따른 감소 등

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	303	110	193		32	51	20	90		
국비										
도비										
군비	303	110	193		32	51	20	90		
기타										

- 사업내용
 - 드론 교육 프로그램 설계 및 운영계획 수립
 - 드론 교육기관 운영방안(용역) 검토 및 협약기관 선정 등

□ **연도별 목표 및 추진계획**

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2023 하반기	추진계획 수립 및 검토	· 현장조사 및 관련 법규·기관 협의 검토 등 (사업 타당성 및 가능성 사전 검토 등)	30	30
2023 ~임기내	운영방안 검토(용역 등) ⇒ 용역발주 및 협약추진	· 드론 아카데미 확대 운영추진 (가평군민 및 직원 드론교육 추진 등)	70	70

□ 추진실적

구 분		추진실적	비고
2022	3분기	· 한컴아카데미 교육장 방문 및 제7021부대 사단사령부와의 실무 미팅 · 가평경찰서와의 실무 미팅 - 민·관·군·경 드론자격취득 교육 지원 및 아카데미 운영방안 모색	
	4분기	· 드론 활성화지원 홍보물 등 구입(고글 안전모 등 7종 1,300천원)	
2023	2분기	· 드론업무 총괄 부서 지정 회의(부군수 지시사항) 결과 교통과 업무 전담 추진	
2024	2분기	· 공공분야 드론 조종인력 양성사업에 따른 드론 자격(1종) 취득(1명)	

□ 교육과정

구 분	군민 대상 드론 입문 교육				공직자 대상 드론 전문 교육	비고
	모집인원	신청인원	교육인원	수료인원	자격 취득인원	
	144	157	142	133	23	
2022	48	53	48	44	7	
2023	48	46	46	46	5	
2024	48	58	48	43	11	

□ 추진상 문제점 및 대책

- ‘기 취득자 활용 운영’의 사유로 2025년 공직자 자격 취득 예산은 삭감되었으나, 재난·재해 대응지원 등 공공분야에 기존 취득자 23명을 활용하여 행정 수요 대응

□ 향후계획

- 가평군민 대상 드론 입문 교육 지속 추진

□ 기대효과

- 드론산업의 전문 인력 양성을 통해 새로운 일자리 및 취업 기회 확대 등

□ 사진



약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.

GTX-B 노선의 가평 연장 확정

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
IV-4	교통	주민안전은 더 세심하게	국토부·경기도	신규	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	교통과	교통행정팀장	라주희(2202)	담당자	문기환(2203)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

□ 추진방향

◆ GTX(Great Train Express) : 수도권 전역을 1시간 내에 연결할 수 있는 수도권광역 급행철도

☞ B노선(남양주~송도) 경기도 남양주시 화도읍에서 출발하여 서울시 중랑구·동대문구·중구·용산구·영등포구·구로구와 경기도 부천시, 인천광역시의 부평구·남동구를 거쳐 송도국제도시까지 80.1km를 운행한다. 운행 노선은 마석역(기점)~평내호평역~별내역~망우역~청량리역~서울역~용산역~여의도역~신도림역~당아래역~부평역~인천시청역~송도역(종점)의 13개 역으로 계획되어 있다. 2019년 8월 예비타당성 조사를 통과하였다. 총 사업비는 5조9038억원이 소요된다.

- (필요성) 경춘국도 차량집중으로 인한 상습적 지·정체로 서울 접근성이 떨어지고, 각종 규제에 인하여 정체된 지역균형발전 도모 및 관광 활성화를 위해 GTX-B 노선의 가평, 춘천 연장 필요
- (추진방향) 수도권광역급행철도GTX-B(인천 송도~남양주 마석) 노선의 마석~가평(청평역·가평역)~춘천(강촌역·춘천역)까지 연장구간을 기본계획에 포함시키기 위해 가평군·춘천시가 사전타당성조사 용역 추진 등 공동 대응 체계 확립

□ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업위치: 남양주 마석~가평~춘천
- 사업규모: GTX-B 노선 남양주 마석~춘천 노선 연장(55.7km)
- 소요예산: 500백만원(가평군 250 + 춘천시 250) ※확보예산: 총 250백만원 (2022년: 250백만원)
※ 용역발주: 332.5백만원(가평군 50%) / 기간: '22. 7.15 ~ '23. 4.10(9개월)
- 사업방법: GTX-B 연장 사전타당성 용역추진 등(협상에 의한 경쟁입찰 / 춘천시 도로과)
- 사업내용(*주요 추진현황)

주 체	사 업 내 용	비 고
가평군	• “가평군·춘천시 협업 GTX-B 노선 연장 사전타당성 조사 공동용역”추진 ※ 용역기간: '22. 7월 ~ '23. 4월(9개월) / 춘천시 발주 과업내용: GTX-B 노선 가평(가평역·청평역)~춘천 연장에 따른 검토 요구 (용역결과) GTX-B 노선을 남양주 마석~가평~춘천까지 연장할 수 있도록 춘천시와 협력하여 중앙부처(*2023. 4월경 국토교통부)에 건의 등	

주 체	사 업 내 용	비 고
경기도	‘22. 4월 경기도지사 “GTX 플러스 프로젝트” 공약 발표 및 ‘22. 9월 제2회 추경 기본구상 용역 발주비용 12억 요구 ⇒ 예산 편성 후 ‘22. 10월부터 1년간 용역 추진(GTX-B+: 마석~가평 연장) ⇒ 제5차 국토부 국가철도망계획 반영 요구(건의)	
국토부	‘22. 7월 “수도권 광역급행철도(GTX) 확충 통합기획 연구용역” 착수보고회 개최 (한국교통연구원, (주)태조엔지니어링, (주)유신컨소시엄 / ‘23. 6월 용역완료) ※ 국토부 “GTX 추진단” 발족 (사업팀: GTX A-B-C 추진 / 기획팀: GTX연장·신설 전담) ⇒ ‘23. 1월 GTX-B 노선 민자구간 협상대상자 지정 : 대우건설 컨소시엄(주)	

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	GTX-B 노선연장 타당성 조사용역	· 가평군·춘천시 협업 GTX-B(마석~춘천)노선 연장 사전 타당성 조사 공동용역(추진 중) - 사업비: 500백만원(가평 250, 춘천 250) - 용역기간: 2022. 7.~ 2023. 4.(9개월) ※ 2022. 5월 우리 군 용역비 250백만원 완납(송금) (☎ 춘천시 도로과 도로시설팀 033-250-3159)	20	20
2023	GTX-B 노선연장 확정(공동건의)	· 가평군·춘천시 공동 협의 건의(‘23년 4월) ※ 노선연장 용역결과 국토교통부 공동건의(방문) (관련부처: 국토교통부 철도정책과, 코레일) · 국회의원 등 각종 기관방문 협조 요청(공동대응) (강원도 춘천시와 연계하여 공동 대응전략 추진)	80	80
2024				
2025				
2026 상반기				

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2022	3분기	· 용역 착수보고회 개최(춘천시청/ 건설도시국장, 교통과장 등 3명 참석) - 용역기간: 2022. 7.15. ~ 2023. 4.10.까지(9개월) - 주요내용: 가평(청평역·가평역)·춘천연장에 따른 기술적 검토 등 ⇒ 국가철도망계획 및 시설사업기본계획에 용역 결과 반영(춘천시+가평군 공동대응)	
2023	1분기	· 당정협의회 현안사항 건의 · 용역 중간보고회	
	2분기	· 용역 최종보고회 · 용역 중지(연장): 국토부 용역 완료시까지 · 용역 추진 현황 국토부 건의 등(춘천시) · 용역 추진 현황 군의회 보고 및 국회의원 자료 제출 등 · GTX+기본구상 연구용역 간담회(경기도) 참석	

구 분		추진 실적	비고
	4분기	· 춘천시 담당부서와 간담회 · 제5차 국가철도망 구축계획 건의사업 목록제출(경기도)	
2024	1분기	· 춘천시 담당부서와 2차 간담회 실시(춘천시) · GTX-B 연장노선 사전타당성조사 공동용역 최종보고서 납품전 검토회의(춘천시)	
	2분기	· 국토교통부 철도국(신속개통기획단) 관계자 면담 · GTX-B 노선 확정 완료 보고 · 제5차 국가철도망(2026~2035) 사업계획서 제출 · GTX-B노선 가평~춘천 연장관련 회의개최(가평군) - 참석자: 경기도, 강원도, 춘천시, 가평군	
	3분기	· GTX-B노선 연장 타당성 검증용역 실시 요청(가평·춘천 → 국토교통부) - 국토교통부 → 국가철도공단 (용역기간: 2024.10. ~ 2025. 5.) · GTX-B노선 가평~춘천 원인자부담 추진을 위한 관련기관 회의 - 참석자: 국토교통부, 경기도, 강원도, 가평군, 춘천시, 국가철도공단	

□ 추진상 문제점 및 대책

- GTX-B 노선 연장시 가평군 원인자 부담금의 재정부담 ⇒ 경기도 재정지원 지속 건의

□ 향후계획

- GTX-B 노선 조기추진을 위해 춘천시와 공동대응 지속추진

□ 기대효과

- 각종 규제로 정체된 지역균형 발전 및 관광 활성화 도모
- 수도권 1시간이내 진출입 가능에 따른 인구유입 및 다양한 문화욕구 충족 등

약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 1,000만의 자족도시를 완성하겠습니다.

대중교통 시스템 및 노선 확충

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
IV-5	교통	주민안전은 더 세심하게	경기도	계속	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	교통과	교통행정팀	라주희(2202)	담당자	김명조(2220)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 60%

추진방향

- 1330-44번 버스의 종점 변경을 통하여 잠실행 노선 확보 및 교통 인프라 강화
- ※ 기존: 7000번(잠실-청평-가평) 증회 → 변경: 1330-44번(잠실-청평-현등사) 종점 변경

사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업위치: 잠실-청평-현등사 (기존: 잠실-청평-가평)
- 사업규모: 1일 12회 운행
- 소요예산: 382백만원 ※ (공약실천계획서: 1,648백만원 / 경기도 공공버스 노선입찰로 보조금 교부 계획)
국가사무 이관에 따른 사업비를 변경으로 39백만원 등 증가

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	382		382		90	114	178		
국비	189		189		45	57	87		
도비	57		57		13	17	27		
군비	136		136		32	40	64		
기타									

- 사업내용(기존: 7000번 버스)

1330-44번 버스 종점 변경(청량리 → 잠실)

- 1330-44번 1일/12회 운행
- 현등사~잠실(잠실역 5번출구) 운행 시간 약 210~250분 가량 소요 예상(배차간격: 90~120분)
- 해당 노선은 2024년 12월 대광위* 광역버스 준공영제 사업으로 이관 및 관리

*대도시권광역교통위원회

- 1330-44 노선 운송 손익(2024년 11월 운행손실금 산정 연구용역) (단위: 원)

노선	연간운송수입	보조금			연간운송원가	운송손익	비고
		수도권환승할인	청소년할인	계			
1330-44	679,044,534	27,393,142	5,933,813	33,326,955	1,065,781,078	-353,409,589	

- ※ 現 운송손익 적자운영 원인 : 이용객 수 저조(장시간 소요 및 기존 전철노선 대체가능)
- 1330-44번 노선 평균 이용객 수 현황(2024년 11월 기준)

노선	구간	1일 평균 이용객(명)	1회 평균 이용객(명)	이용률(%)	비고
1330-44	현등사-청량리-현등사	816	68	-	

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	60
2022 하반기	현행 유지 (운행 횟수 5회)	· 1대 차량, 1일 5회 운행	-	
2023	증차(증회)	· 1대 차량, 1일 5회 운행(평일이 아닌 날은 4회) · 추후 이용자수 여건에 맞춰 대도시권광역교통위원회 (대광위)와 사업계획변경(증회) 사전협의 추진	100	60
2024				
2025				
2026 상반기				

□ 추진실적

구 분	추진실적		비고
2023	4분기	· 국토부 대도시권광역교통위원회(이하 대광위)에 노선 확충 요청 - 7000번 버스(가평-청평-설악-잠실) 노선 증차 요청 - 신규 노선(가평-청평-잠실) 신설 요청 - 신규 노선(가평-청평-수서역) 신설 요청	
2024	2분기	· 국토부 대광위 방문(선정 결과 확인 및 가평군 의견 제시) · 대광위 노선위원회 심의 결과 ⇒ “기각”	
	3분기	· 경기도 공공버스과 미팅(1330-44번 노선 변경 협의) · 여객자동차 운송사업 계획 변경 협의 결과 ⇒ 서울시 “부동의”	
	4분기	· 광역버스 국가사무 이관 협상(해당노선 이관 및 노선 변경 관련) 회의 참석 - 노선 변경(종점 변경) 계획 관련 협의	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 기존 대광위 노선에 비해 상대적으로 운송사업계획 변경 협의가 용이한 경기도 공공버스 노선의 종점 변경(청량리→잠실)을 통해 잠실행 노선을 확보할 예정이었으나, 노선 변경 협의 과정에서 서울시에서 “부동의” 함에 따라 24년 내 1330-44번 노선의 종점 변경은 어려움
- 1330-44번 노선이 국가사무로 이관됨(24. 12.)에 따라 대광위와 광역버스 국가사무 이관 관련 협상 회의에서 종점 변경과 관련된 사항에 대하여 공감대를 형성하였고, 25년에 노선변경(종점변경)을 추진하도록 협의 예정

□ 향후계획

- 대도시권광역교통위원회에 지속적인 기존 노선 증차/증회 및 종점 변경 요청

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

읍면별 도심지 주차장 확충 추진

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-7	교통	주민안전은 더 세심하게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	교통과	교통시설팀장 김태랑(2259)	담당자	은지혜(2281)	
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	70%

□ 추진방향

- 읍면 도심지 내 부족한 주차 공간 확보를 통하여 원활한 교통 소통과 주민불편 해소
- 주민의견과 이용객의 접근성을 고려한 주차장 입지 선정 후 절차 진행

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 관내
- 사업규모: 읍면별 도심지 주차장 조성
- 소요예산: 22,101백만원 ※ 가평읍 레일바이크, 조종면 시가지 사업구역 변동에 따른 706백만원 증가

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	22,101	1,675	20,411	5,471	5,849	3,204	5,887		
국비									
도비	8,649	1,500	7,149	2,500	3,649	1,000			
군비	13,452	175	13,277	2,971	2,200	2,219	5,887		
기타									

- 사업내용 ※ 총사업비(보상비 / 공사비)

구분	사업명	사업기간	사업위치	총사업비(백만원)	사업규모
계			5개소	22,101 (15,088 / 6,998)	부지면적 : 19,306㎡ 주차면수 : 462대
가평읍	어린이음악놀이터 옆 공영주차장 조성	2022~24	가평읍 대곡리 243-14 일원	2,910 (2,215 / 695)	부지면적 : 2,852㎡ 주차면수 : 43대
	경춘선 폐선부지 (레일바이크) 옆 공영주차장 조성	2023~25	가평읍 읍내리 354-5 일원	4,591 (2,950 / 1,641)	부지면적 : 3,709㎡ 주차면수 : 107대
청평면	청평 공영주차장 (1구역) 조성	2022~24	청평면 청평리 455-13 일원	5,345 (3,791 / 1,554)	부지면적 : 2,980㎡ 주차면수 : 60대
	청평 공영주차장 (2구역) 조성	2022~24	청평면 청평리 79-133 일원	4,255 (2,632 / 1,623)	부지면적 : 6,586㎡ 주차면수 : 165대(대형 11)
조종면	조종면 시가지 공영주차장 조성	2022~25	조종면 현리 274-10 일원	5,000 (3,500 / 1,500)	부지면적 : 3,179㎡ 주차면수 : 87대

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분		목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계				100	70
2022 하반기		청평 공영주차장(2구역) 실시설계	· 2022.12. : 실시설계용역 착수	10	10
		어린이음악놀이터 옆 공영주차장 실시설계	· 2022. 9. : 부지 매입 완료 · 2022.12. : 실시설계용역 착수		
2023		청평 공영주차장(1구역) 착공	· 2023. 6. : 실시설계용역 및 실시계획인가 완료 · 2023. 7. : 국유지(2필지) 토지보상 · 2023. 8. : 공사 착공	40	40
		청평 공영주차장(2구역) 착공	· 2023. 5. : 국유재산 매입 협의 · 2023. 7. : 실시설계용역 및 실시계획인가 완료 · 2023. 8. : 공사 착공 · 2023.12. : 공사 준공(토목)		
		어린이음악놀이터 옆 공영주차장 착공	· 2023. 5. : 실시설계용역 완료 · 2023. 6. : 공사 착공		
		레일바이크 옆 공영주차장 실시설계	· 2023.12. : 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 착수		
		조종면 시가지 공영주차장 실시설계	· 2023. 4. : 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 착수		
2024		· 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3. 19. - 내용: 구역별 사업기간, 사업규모, 소요예산 - 사유: 행정절차 이행 기간 및 사업 규모 변경		30	20*
		청평 공영주차장(1구역) 준공	· 2024. 4. : 공사 준공		
		청평 공영주차장(2구역) 준공	· 2024. 4. : 공사 준공 · 2024. 5. : 국유재산 매입 완료		
		레일바이크 옆 공영주차장 실시설계	· 2024. 7. : 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 완료 · 2024.10. : 손실보상 · 2024.12. : 문화재조사		
		조종면 시가지 공영주차장 준공	· 2024. 4. : 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 완료 · 2024. 7. : 손실보상 · 2024. 8. ~ 12. : 공사 착공 및 준공		
2025		레일바이크 옆 공영주차장 준공	· 2025. 3. ~ 7. : 공사 착공 및 준공	20	

□ 추진실적

구 분		추진실적					비고
		가평읍		청평면		조종면	
		어린이음악놀이터	레일바이크	1구역	2구역	시가지	
2022	4분기	· 실시설계 용역 착수					
2023	1분기	· 道 주차환경 개선사업선정 (도비 확보 180백만원)			· 실시설계 용역 착수		

구 분		추진 실적					비고
		가평읍		청평면		조종면	
		어린이음악놀이터	레일바이크	1구역	2구역	시가지	
	2분기	· 실시설계 용역 완료 · 공사 착공				· 군계획시설 (주차장) 결정 · 실시설계 용역 착수	
	3분기			· 경기도 계약심사 완료 · 공사 착공			
	4분기	· 조성공사 (통신)준공	· 군계획시설 (주차장) 결정 · 실시설계 용역 착수		· 공사(토목) 준공		
2024	1분기	· 조성공사 (토목)준공	· 道 주차환경 개선사업선정 (도비 확보 1,000백만원)		· 공사(통신) 준공	· 道 주차환경 개선사업선정 (도비 확보 1,000백만원)	
	2분기		· 군계획시설 (주차장) 결정 및 고시	· 공사(전기) 준공 · 공사(통신) 준공 · 공사(토목) 준공		· 주민설명회 개최	
	3분기					· 군계획시설 (주차장) 결정 입안	
	4분기	· 조성공사 (전기)준공	· 군계획시설 (주차장)사업 실시계획인가 신청	· 군계획시설 (변경)인가 고시 · 연결계단 설치공사 준공			

□ 추진상 문제점 및 대책

- 2025년 가평읍 레일바이크 사업비 4,500백만원 본예산 미반영으로 추진완료 시기 지연
- 국가철도공단 내부행정절차 진행에 따른 폐선부지 매수 지연
⇒ 매수 전 무상사용허가를 득해 공사 정상 추진(2024. 5. 매수 완료)

□ 향후계획

- 「주차장법」 제3조에 따른 주차장 수급 실태조사 결과와 읍·면 주차장 조성 건의 등 검토하여 그 외 도심지 주차장 추가 확충

□ 기대효과

- 공영주차장 조성으로 도심지 주차난 해소를 통한 주민불편해소

□ 사진



가평읍 어린이음악놀이터 옆



가평읍 레일바이크 인근



청평면 1구역(청평농협 뒤)



청평면 2구역(중앙내수면연구소 옆)



조종면 시가지(조종초교 앞)

보 건 정 책 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						25%	
VI-1	경기도의료원 가평병원 유치	가평군	신규	2026 (임기외)	정상추진	25	

약속VI 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

경기도의료원 가평병원 유치

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
VI-1	보건	주민안전은 더 세심하게	가평군	신규	장기	임기 외
추진부서	보건소	보건정책과	보건행정팀장	윤정숙(2810)	담당자	조혜영(2811)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	25%

□ 추진방향

- 지리적 특성으로 의료불균형 해소에 한계가 있으며, 의료서비스 향상을 위하여 병원급 이상의 공공 의료기관 확보(응급의료분야 의료취약지: 가평, 동두천, 양평, 여주, 연천)
- 24시간 응급진료 및 공공진료가 가능토록 추진함으로서 지역 간 의료격차 해소

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 6. ※ 공약실천계획서: 2022. 8. ~ 2026. 7.
- 사업위치: 가평군 청평면 일원 예정
- 사업규모: 건물신축 1동 (6,275.3㎡)
- 소요예산: 45,604백만원 ※ 공약실천계획서: 30,130백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	45,604		25,030	45			10,000	14,985	20,574	
국비	10,627		5,881					5,881	4,746	
도비	2,657		1,471					1,471	1,186	
군비	32,320		17,678	45			10,000	7,633	14,642	
기타										

○ 사업내용

시 설	세 부 내 용	비 고
진료시설	725.3㎡ (치과, 한방과, 일반내과, 일반외과, 산부인과, 소아과, 정형외과 등)	
응급시설	245.7㎡ (응급실, 처치실, 당직의사실 등)	
진료지원시설	378㎡ (방사선실, 임상병리실 등)	
병동시설	941.4㎡ (1인실, 2인실, 4인실, 간호사실 등)	
사무시설	975.7㎡ (회의실, 사무실, 원무과, 전산실 등)	
보건사업활동시설	712.3㎡ (결핵관리실, 구강보건실, 건강증진실 등)	
서비스시설	670㎡ (세탁실, 식당 등)	
기타시설	1626.9㎡ (공유면적, 기계실, 선택시설 등)	

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	25
2022 하반기	기본계획 수립 및 부지선정	· 추진 방침 결정 및 기본계획 수립 · 타당성조사 용역 실시 · 부지 선정	10	10
2023	사전절차 이행	· 가평병원 설립 계획 확정(연구용역 완료) · 사전 행정절차 이행 · 설립, 운영 관련 조례 등 법령 제정·정비 · 부지매입 협의	20	15*
2024	부지매입 및 설계완료	· 부지매입 · 사업예산 확보: 국·도비 확보 · 군 계획 결정 및 실시계획 인가 · 기본 및 실시설계	20	
2025	착공	· 시공업체 선정 및 계약 · 공사착공	40	
2026 상반기	진행	· 공사진행	10	

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2022	3분기	· 기관 방문 건의(경기도 공공의료과/설립 필요성 제기)	
	4분기	· 의료원 유치를 위한 민·관 추진위원회 위촉 및 민간(유관기관) 간담회 - 가평 의료원 유치 방향, 민간부분 공조, 군민 서명 운동 협조 · 기관 방문 건의(경기도 보건건강국/유치 건의)	
2023	1분기	· 의료원 유치를 위한 범 군민 서명 운동 및 지역사회 홍보 · 경기도의료원 유치 범 군민 건의문 및 서명부(28,028명) 전달 - 경기도의료원 가평병원 설립 필요성(경기도지사 군수님 면담) · 민·관 추진위원회 벤치마킹 및 회의(청송군, 경기도의료원포천병원) · 의료원 유치 및 설립 추진방향 경기도 (보건)의료원 기관 방문	
	2분기	· 의료원 타당성 조사 연구용역 추경 편성 및 용역 시행(한국능률협회컨설팅)	
	3분기	· 기관 방문 협의(경기도 보건의료과 및 경기도의회 보건복지위원회) · 총괄 업무 사무인계인수[성과관리팀 보건정책과] · 타·지자체 의료(병)원 건립 및 운영 현황 벤치마킹 - 연천군보건의료원(8. 10.), 정선군립병원(8. 11.), 삼척의료원(8. 22.) · 2023년 제4차 정기지방재정 「중앙」투자심사의뢰서 제출 · 기관 방문 협의(경기도 군협력담당관) - 의료원 건립부지(구, 국군청평병원)관련 국방부 등 유관기관 협조 요청 - 구)국군청평병원 부지 현장 확인 및 유관기관 협조 방안 논의 · 의료원 건립 부지 매입 및 지역 의료기관 상생 협의 - 건립 부지(구, 국군청평병원) 매입(환지) 협의(수도기계화보병사단 사단장)	

구 분		추진 실적	비고
2024		- 병원 건물·시설 2개층 활용, 상생 협업 요청(HJ매그놀리아국제병원장, 경영이사) · 강원대학교병원 방문 논의(운영 방안) - 가평군 응급의료 지원 방향 논의(강원대학교병원 기획조정실장, 기획예산과장) · 단양군 보건소 벤치마킹(2024년 보건의료원 개원 예정) · 건립 부지 매입을 위한 국방부 및 경기도 협조 요청 - 구)국군청평병원 매입 및 환지 요청(국방부), 상생협업체 안건 제출(경기도) · 국방부 시설관리본부(북부시설단) 가평군 보건소 방문 실무 협의 - 구)국군청평병원 부지 매입(환지)관련 실무 협의(북부시설단 팀장)	
	2분기	· 건립 부지 선정위원회 위촉장 수여 및 회의 개최 · 「(가칭)가평병원 건립 후보지 입지분석 용역」 재개 (중지일: '23.7.12.) · 기관 방문 협의(국토부, 행안부/부지 매입 절차 업무 협의) · 「(가칭)가평병원 건립 후보지 입지분석 용역」 최종보고회 개최 · 舊)국군청평병원 부지 활용방안 국방부(경기북부시설단)와 논의 및 현장 확인 · 국방부 소유 건립 후보지 매입 절차 관련 부서(도시과, 안전재난과) 간담회	
	3분기	· 제2회 건립부지 선정위원회 개최 - [최종: 舊)국군청평병원(청평리 259번지 일원)] · 「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 실시	
	4분기	· 「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 중간보고회 개최	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 부지 매입을 위한 사전 행정절차(공유재산 심의, 지방재정투자심사 등) 이행기간 소요
⇒ 의료기관 건립 「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 완료후 건립 및 부지매입 추진
- 건립에 필요한 부지 매입비, 건립비 등 국,도비 예산 확보 어려움
⇒ 공모사업, 지방소멸대응기금 등 공공의료기관 건립에 필요한 재정 확보를 위하여 관계 부처와 지속적 업무 협의

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	1분기	· 「가평군 공공의료기관 구축 타당성 조사 용역」 완료	
	4분기	· 사전 행정절차 이행 등 부지 매입 병행	

□ 기대효과

- 24시간 응급의료 체계 구축 및 미충족 의료서비스 제공으로 의료 불균형 해소하여 공공의료 서비스 질 향상
- 감염병 및 재난 등 공중보건 위기 발생 시 위기 대응 역량 강화

소 득 개 발 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						100%	
I-8	가평군 스마트팜 기술보급 사업 추진	가평군	계속	2026 (임기내)	이행후 계속	100	금회 완료

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

가평군 스마트팜 기술보급 사업 추진

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-8	농업	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	농업기술센터	소득개발과	원예특작팀장	박명산(2890)	담당자	김주형(2883)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 100%

□ 추진방향

- 지역농업 특성에 적합한 작목별 스마트팜 단지 확대 보급
- 농업인의 IT 활용능력 향상 및 전문 농업인 양성
- 농가 순회 자체지도로 농업기술센터와 농업인의 소통 강화

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 스마트팜 설치지원 과학적 농업실천 시설(채소, 화훼) 및 과수, 축산 현장
- 사업규모: 3개분야/연
- 소요예산: 1,953백만원 ※ (공약실천계획서 2,593백만원) 국도비사업 신청(470백만원) 대비 확보(390백만원) 80백만원 감소

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	1,953	683	1,270	190	40	100	390	550		
국비	485	110	375	50		50	195	80		
도비	306	197	109	27	12			70		
군비	995	285	710	95	20	50	195	350		
기타	167	91	76	18	8			50		

○ 사업내용

- 분야별 스마트팜 시설 및 장치 지원
- 환경조절시스템(온습도 등), 관수시스템, 자동화 시설 등 설치
- 스마트장치 활용능력 향상을 위한 농업인 교육
- 분야별 담당자 스마트팜 시설 및 재배관리 지도

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	사업 완료 및 활용관리 지도	- 채소, 화훼, 축산분야 4개 사업 - 시설원에 스마트팜 기술보급 시범사업(1개소, 0.3ha) - 이상기상 대응 원예작물 안정생산 기술 시범사업(3개소, 1.1ha) - ICT활용 화훼재배 기반구축 시범사업(2개소, 0.2ha) - 기후변화 및 가축전염성 질병예방 사육환경 개선 시범사업(2개소)	10	10
2023	분야별 사업 확보 - 시설채소·화훼, 과수, 축산	- 스마트팜사업(국·도비) 신청 - 국·도비, 자체사업 추진	16	16
2024		2023년 스마트팜 기술보급 추진(2개사업)	20	74
2025		시설원에 스마트팜 기술보급 시범사업(1개소), ICT활용 화훼재배 기반구축 시범사업(1개소)	26	
2026 상반기		2024년 스마트팜 기술보급 추진(1개사업) - 무인 방제 활용 과수 종합관리기술 구축 시범(1개소)	28	

□ 추진실적

구 분	추진실적				비 고
2022	4분기	- 스마트팜 4개사업(190백만원) 설치 완료, 시설 유지 및 재배관리 지원 - 양액 자동 장치제어 시스템, 시설하우스 차열·차광막, 농업용 전기히트펌프, 차량통제시스템·대형환풍시설·이동식 착유기			
2023	4분기	2023년 스마트팜 기술보급 사업: 2개사업(도비)			
		구 분	사업명	사업비	비 고
		계		40	백만원
		1	시설원에 스마트팜 기술보급 시범사업 - 스마트기기 활용 시설하우스 환경모니터링 (온·습도, CO2센서, 천·측창개폐 등) - 관수자동화시설 원격제어시스템 등	20	1개소 0.2ha
		2	ICT활용 화훼재배 기반구축 시범사업 온실개폐 및 시설환경(난방, 보광, 관수) 복합 제어시스템(All-In-One) 등 설치 지원	20	1개소 0.2ha
2024	4분기	- 시설하우스 스마트영농 기술교육 추진(계속) (경기도 농업기술원 연계, 1농가) - 시설토마토 스마트팜 재배농가 기술* 자문위원 농가지원 완료 * 양액배지(온도, 습도, pH등) 관리, 양액조제, 입식소독 등 토마토 양액재배 관리기술			
		2024년 스마트팜 기술보급 사업: 1개사업(국비)			
		구 분	사업명	사업비	비 고
		계		100	백만원
		1	무인 방제 활용 과수 종합관리기술 구축 시범 사업자 선정 원격 에어포그 무인방제 시스템(분사장치, 제어기 등)	100	
2025	1분기	2025년 국·도비 4개사업(390백만원) 예산 확보 완료 2025년 경기도지역균형발전사업 “임대형 스마트팜 기반 조성”(9,400백만원) 신청			

□ 사진(ICT활용 화훼재배 기반구축 시범)



공기열히트펌프 컨트롤러



공기열히트펌프 냉난방기

□ 사진(무인방제 시스템)



장비 설치 및 시연



무인방제시스템 가동장면

□ 추진상 문제점 및 대책

- 가평 농업인구의 영세화 및 노령화에 따른 신기술의 보수적 수용, 대부분 고가인 스마트 농업 장비 및 시설 투자의 경제적 부담 발생 등으로 스마트농업 추진의 어려움 다소 발생
 - 보조금액 증액·상향 등을 통한 농가의 경제적 부담 경감 및 예산지원과 연계한 농가교육 확대 및 교육프로그램 개발 필요
- 시설업체 영세화, 스마트 장비 유지관리 서비스 지원기술 미비 및 농가의 데이터 수집·분석 능력의 한계 발생
 - 기술업체들의 프로그램 연계화 및 수집된 데이터의 농업기술센터 등 기관과의 연계를 통한 농가별 적합한 가공된 데이터분석 제공 기능 개발 필요
 - 스마트팜 특화작목 생산기반 조성을 위한 기금 투자사업, 공모 투자사업 발굴 등 국·도·군비 예산확보를 위해 적극 대응 중

□ 향후계획

구 분	향 후 계 획			비 고
2025	· 경기스마트팜 지원사업 작목별 농가맞춤 컨설팅(비예산) - 사업내용: 시설딸기 및 화훼 신축시설 재배농가 스마트 농업활용 재배기술 교육 - 교육내용: 양액공급 자동화시설, 안개분무, 다겹보온커튼 및 알루미늄스크린, 보광등, 환기팬 등 · 원예분야 ICT활용 시설·장비 시범사업 농가 스마트영농 기술지도 추진(비예산) 1) 시설딸기(2개소 0.6ha), 시설토마토(9개소 3.5ha) 및 시설화훼(2개소 0.4ha) 재배농가에 양액공급 및 온실개폐자동화시설, 안개분무시설, 농업용 전기히트펌프 등 설치 2) 과수(사과) 농가(2개소 2.0ha)에 라이다 센싱 데이터기반 분사노즐 개별제어기술, 사과 에어포그 무인방제시스템 등 · 2025년 스마트팜 기술보급 시범(국비 390백만원) 4개 사업 추진			
	구 분	사 업 명	예산확보	비 고
	계		390	백만원
	1	· 데이터 기반 생산모델 보급 : 데이터 분석을 통한 환경 및 생육 제어기기 등	200	
	2	· 포도 과수원용 맞춤형 다목적 스마트 방제기 보급 시범 : 포도 다목적 스마트 방제기 등	50	
	3	· 시설과채류 순환식 수경재배 양액 재활용 기술 보급 시범 : 배액여과살균장치, 배액희석장치, 원수저장탱크 등	80	
	4	· 시설원예 미세버블 양액 살균 기술 시범 : 미세버블 발생장치, 산화 반응조, 여과장치, 배관자재 등	60	

□ 기대효과

- 디지털 기반기술 지원으로 농가 재배환경 편리성 증진 및 노동력 절감
- 이상기온 및 급격한 환경변화 등에 대한 효과적 대응 및 관리가능
- 고품질 생산 및 상품성 향상으로 농가 소득 증대와 농업경쟁력 강화
- 초기시설투자에 대한 부담완화로 스마트농업 진입장벽 완화 및 확대

평 생 교 육 사 업 소

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
2개 사업						77.5%	
Ⅱ -5	평생학습관 건립 및 교육사업 프로그램 편성 운영	가평군	계속	2026 (임기내)	정상추진	55	
Ⅱ -6	청소년문화의집 프로그램 운영	가평군	계속	2026 (임기내)	이행후 계속	100	금회 완료

약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

평생학습관 건립 및 교육사업 프로그램 편성 운영

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
II-5	교육	지역문화는 더 다채롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	평생교육사업소		평생학습팀장	정선영(4676)	담당자	박경원(2476) 김범수(4678)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	55%

추진방향

- 성인 취미·교양 교육을 넘어서 지역성장에 기여하는 지속가능발전 목표의 지표에 부합한 범분야별·생애별 특성화 교육기관으로서 지역 인적자원 육성 및 강화 역할 수행
- 강의 공간·체험실습 공간·편의시설 공간 등을 갖춘 종합시설로서 계획 및 추진

사업개요

- 사업기간: 2020 ~ 2026
 - 사업위치: 가평읍 읍내리 885번지 일원
 - 총사업비: 23,000백만원
 - 공사비 17,057백만원, 감리비 2,017백만원, 보상비 2,387백만원, 용역비 등 1,539백만원
 - 별도편성: 교육프로그램 운영 관련 연간 사업비(1,260백만원*), 착공식 행사운영비
- *가평군 인재육성재단 설립 타당성 연구(2022, 경기연구원) 기준

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	23,000	3,700	19,300		5,477	13,823			
국비									
도비	17,875	1,500	16,375		4,069	12,306			
군비	3,005	2,200	805		688	117			
기타	2,120		2,120		720	1,400			

- 사업내용: 부지면적 7,450㎡, 연면적 4,657.02㎡
- 도입시설 건축(안) ※ 문화공연 시설은 인근 유사시설 활용으로 제외

층 별	주 요 시 설
지상4층	바리스타체험실, 카페공간, 조리제빵실, 생활스포츠실
지상3층	교육생태지원실, 강의실, IT실, 영상편집실, 크리에이티브실, 준비실, 음악실, 음악감상실, 음악창작교육실, 양재실
지상2층	강의실(3), 스터디실, 대기실, 동아리실(3), 커뮤니티실, 뷰티건강실습실, 준비실(2), VR/AR체험실, 체험존(2)
지상1층	로비, 반려동물실습실, 숙직실
지하1층	사무실(2), 회의실, 상담실(2), 휴게실, 창고, 아이돌봄실, 수유실, 휴게음식점, 소매점, 기계실, 전기실, 발전기실

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	55
~2022 상반기	토지매입 및 실시설계 • 평생학습관 운영계획 수립	- 경기도 지방투자심사 및 공유재산관리계획 승인, 중기지방재정계획 반영 - 실시계획인가 및 수용재결(읍내리 885외 5필지 매입) - 평생학습관 운영계획 수립 용역 발주('22. 5.)	30	30
2022 하반기	투자심사 재검토 및 평생학습관 운영계획 수립용역 완료	- 사업비 증액에 따른 중앙투자심사 재심사 요청('22.3.) - 중앙투자심사 재검토 통보('22.6.)에 따라 재검토 내용 연구용역 반영 및 재분석 실시 ('22. 7. 사업규모 및 운영수지 재분석) - 평생학습관 운영계획 수립 용역완료('22.12.) - 중앙투자심사 재검토 사항의 분석에 따른 사업 규모축소로 재심사 미대상으로 확인(30% 미만), 중앙투자 심사 재심사 절차 제외('22.12.) - 민선8기 공약사업 계획 변경('22.12.군수방침결재)	5	5
2023 상반기	실시설계 변경추진 및 관련 협의	- 설계 변경에 따른 변경계약 체결('23.4.) - 실시설계 변경 추진('23. 1. ~ 6.) 및 경기도 지역균형 발전위원회 기본계획 변경, 친환경청정사업 계획 변경 - 설계의 경제성 등 검토, 예비인증(녹색건축, 에너지효율) 등 재협의('23. 6.)	10	10
2023 하반기	건설기술심의 등 행정절차완료 및 공사발주	- 경기도 건설기술심의 완료('23. 7. ~ 8.) - 조달청 원가 심사('23. 9. ~10.) - 공사 계약 및 발주('23.11.)	5	5
2023 하반기 ~2025 하반기	공사진행 및 공사준공, 교육 프로그램 운영 준비	- 공사 진행('23.11. ~ '25.10.→'24. 3. ~ '26. 6.) - 공사 준공('25.11.→'26. 6.예정) - 교육 프로그램 운영(안) 확정 ('25. 6.) - 수강생, 강사 모집('25. 8. ~ 12.)	50	5
2026 2.~	평생학습관 개관 및 운영	- 평생학습관 개관('26. 2.→'26. 8.) - 상·하반기 정기 교육프로그램 운영('26. 2.~)	-	

□ 추진실적

구 분	추진실적	비 고
2022	1분기 실시설계 결과 사업비 증가에 따른 중앙투자심사 의뢰 (당초 총사업비 180억원 ⇒ 300억원)	
	2분기 중앙투자심사 재심사 결과 “재검토” 통보(사업규모 및 운영수지 재분석)	
	4분기 - 중앙투자심사 재검토사항 「평생학습관 운영계획 수립 용역」 반영 - 사업규모 축소 운영 제시 (연면적 6,849.03㎡ ⇒ 4,632.19㎡) 『가평군 평생학습관 건립사업』 변경 추진계획 수립(사업규모 축소 반영)	
2023	2분기 - 가평군 평생학습관 건립사업 기본 및 실시설계 용역 변경계약 체결 - 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 용역 발주	
	3분기 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 완료	

구 분		추진 실적	비고
2024		· 녹색건축물 관련 예비인증 재인증 완료	
		· 경기도 건설기술심의 신청	
	4분기	· 경기도 건설기술심의 완료	
		· 2024년도 한강유역환경청 친환경청정사업 선정 2,177백만원 예산 확보	
2024		· 조달청 공사계약 의뢰 완료	
		· 건축협약(허가) 완료, 전기·통신·소방공사 개찰 완료	
	1분기	· 공사계약 완료 및 착공	
		· 공사 중지(건설사업관리 및 전기감리용역 계약 지연)	
2024		· 공약이행평가단 제4차 회의 / 2024. 3. 19.	
		- 내용: 소요예산(30,000→23,010백만원), 사업규모(연면적 6,849.02㎡→4,657.02㎡)	
		- 사유: 중앙투융자심사 재검토의견을 반영해 사업 규모 축소	
2024	2분기	· 공사 재착공	
	4분기	· 현재 사업 공정률 55% (기초 토공사 진행 중, 공사기준 공정률 5%)	

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2025	1분기	· 공사 착공(25. 3월)	
	4분기	· 교육프로그램 운영 계획(안) 확정	
2026	1분기	· 수강생 및 강사 모집(~26. 8월)	
	3분기	· 공사 준공(2026. 8월) 및 평생학습관 개관, 교육 프로그램 운영	

□ 기대효과

○ 사회변화에 대응하는 전 군민의 역량, 행복지수, 의식수준 향상을 통하여 가평군 전체의 생동감과 지역경쟁력 극대화와 군립대학역할 수행

□ 위치도 및 조감도



약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

청소년문화의집 프로그램 운영

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
II-6	교육	지역문화는 더 다채롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	평생교육사업소		청소년팀장	문소영(2465)	담당자	최효진(2466)
추진현황	☐ 완료 ☒ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 청소년의 욕구 및 수요를 반영한 프로그램 운영 및 개발
- 청소년 이용 활성화 및 신규 이용자 참여 확대

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 계속
- 사업위치: 가평읍, 설악면, 조종면
- 사업규모: 권역별 청소년문화의집 프로그램 운영(가평·북면/ 설악·청평/ 상면·조종)
- 소요예산: 2,165백만원 ※ 국도비 사업(청소년참여위원회 등) 폐지 및 본예산 삭감으로 189백만원 감소

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	2,165		2,165	398	507	429	352	479		
국비	5		5	3	2	-	-	-		
도비	105		105	45	30	30	-	-		
군비	2,055		2,055	350	475	399	352	479		
기타										

○ 사업내용

- 청소년을 위한 건전한 문화·예술 프로그램 운영
- 청소년의 진로개발 및 자질향상을 위한 프로그램 운영
- 4차 산업혁명 관련 메이커(3D펜, 3D프린터, 드론 등) 프로그램 운영
- 그 밖에 건전한 청소년 활동을 위하여 필요한 사업 운영

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	추진계획	프로그램 만족도 평균	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	· 프로그램 만족도 조사 및 청소년운영위원회의 모니터링으로 기존 프로그램 개선·발전	83점	20	20
2023	· 청소년 욕구조사를 통해 청소년의 의견을 반영한 신규 프로그램 개발	86점	20	20
2024	· 참여대상 확대를 위한 프로그램 개발 및 홍보강화	89점	20	20
2025	· 타 시군 우수 프로그램 벤치마킹	92점	20	40
2026 상반기	· 경쟁력 있는 프로그램 운영·개발을 위한 예산 지원	95점	20	

□ 추진실적

구 분	추진 실적	비고	
2022	· 프로그램 만족도 조사 완료		
2023	· 청소년 욕구 조사를 통한 청소년의 의견을 반영해 신규 프로그램 개발 지원 · 가평군 청소년문화의집 사업계획 수립 및 사업비 교부 · 프로그램 만족도 조사 및 모니터링 실시 · 퇴촌청소년문화의집 및 덕풍청소년문화의집 특화시설 및 프로그램 벤치마킹 방문		
2024	· 가평군 청소년문화의 운영 활성화 추진 계획 수립 및 시설장 간담회 개최 · 가평군 청소년육성위원회 개최(9개 동아리 사업 및 1개 어울림마당 대상자 선정) · 1분기 군·위탁재단·청소년문화의집(3개소)·청소년상담복지센터 간담회 개최 · 가평군 청소년참여위원회 위원(19명) 위촉 및 위촉장 수여 · 가평군 가평청소년문화의집 플레이 패스 시설 설치 및 운영(벤치마킹) · 청소년운영위원회의 의견 반영을 통한 신규 프로그램(청소년국제교류 유스어스 등) 개발·발굴 및 예산 반영·지원 · 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9. - 내용: 소요예산(12,938→2,354백만원) - 사유: 프로그램 운영 추진방향에 맞게 청소년문화의집 인건비·운영비 제외		
(누적) 프로그램 운영실적	구 분	프로그램 운영	참여인원
	합 계	총 75개	33,723명
	가평청소년문화의집	참여활성화 및 미래역량강화 등 31개	8,471명
	설악청소년문화의집	참여활성화 및 미래역량강화 등 20개	5,800명
	조종청소년문화의집	참여활성화 및 미래역량강화 등 24개	19,452명

□ 추진상 문제점 및 대책

- 가평군 건축 재정운영에 따른 본예산 삭감 및 국·도비 사업 폐지 등으로
전년 대비 기존 및 신규 프로그램 발굴 및 추진 축소

□ 향후계획

- 가평군 청소년문화의집 프로그램 운영(연중) 및 만족도 조사, 매월 모니터링 실시

□ 기대효과

- 청소년의 역량증진을 도모하여 경쟁력 있는 청소년 육성
- 올바른 청소년상 정립에 기여하고 건강한 사회 구성원 양성

□ 사진



가평군 가평청소년문화의집



가평군 설악청소년문화의집



가평군 조종청소년문화의집

상 수 도 사 업 소

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						30%	
V-11	상수도 사회기반시설 증진	가평군	신규	2026 (임기내)	정상추진	30	

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

상수도 사회기반시설 증진

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-11	환경	주민안전은 더 세심하게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	상수도사업소 수도시설팀장 김중열(4420)					
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	30%

□ **추진방향**

- 지역개발에 필수요소인 상수도의 시설용량 부족으로 지역발전 저해요소로 대두되고 있음
- 이에, 수도정비기본계획에 따라 가평군 통합 취·정수장 3,000㎥/일 증설계획임
(향후 2030년까지 7,000㎥/일 추가증설)

□ **사업개요**

- 사업기간: 2023. 6. ~ 2026. 6.
- 사업위치: 가평통합취·정수장(가평읍 달전리 산 55-4번지)
- 사업규모: 가평통합정수장 취·정수시설 증설(19,000㎥/일 → 22,000㎥/일)
- 소요예산: 18,059백만원 ※ 2025년 가내시 예산 반영

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	18,059		18,059		1,000		4,582	12,477		
국비			-							
도비	14,500		14,500				3,700	10,800		
군비	3,559		3,559		1,000		882	1,677		
기타			-							

- 사업내용
 - 3,000㎥/일 증설(시설용량: 19,000㎥/일→22,000㎥/일)
 - 1. 방사상집수정 2개소 개발(22,000㎥/일)
 - 2. 정수장 시설 부분 증설 등(배수지 등)
 - 3. 건설사업관리용역 1식(18개월)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	30
2023	실시설계용역 추진	· 수도정비기본계획 승인(환경청) · 가평통합정수장 증설공사 실시설계용역 용역 착수	10	10
2024	설계완료 및 공사 발주	· 가평통합정수장 증설공사 실시설계용역 용역 준공 · 가평통합 취정수장 증설공사 인가추진 및 발주	20	20
2025	공사 시행	· 가평통합 취·정수장 증설공사 시행	40	
2026	공사 시행 및 준공	· 가평통합 취·정수장 증설공사 시행 · 시설 시운전 및 준공	30	

□ 추진실적

구 분	추진실적		비 고
2023	1분기	· 수도정비기본계획 승인(환경청) · 가평통합 취·정수장 증설공사 실시설계용역 계약업체 입찰 의뢰(조달청)	
	2분기	· 용역업체 계약체결 · 실시설계용역 착수	
	4분기	· 하천점용허가(원주시방환경청)	
2024	1분기	· 시추조사 및 착정조사 완료	
	2분기	· 경기도 지역균형발전사업 공모 신청(선정)	
	3분기	· 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9. - 내용: 사업기간(2023. 6. ~ 2026. 1.→2026. 6.), 소요예산(1단계), 사업내용(증설 10,000톤 → 1단계 3,000톤 / 2단계 7,000톤) - 사유: 수도정비기본계획에 따른 단계별 사업 추진에 따라 1단계 반영	
	4분기	· 취수시설 증설공사 및 건설사업관리용역 입찰의뢰(조달청) · 일반수도사업인가(한강유역환경청)	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 대규모 투자사업으로 적기에 공정추진을 위한 사업비(도비) 확보가 어려워, 예산지원기관(경기도)과 지속적인 협의 실시

□ 기대효과

- 안정적인 수돗물 공급에 따른 지역균형발전 및 인구유입 활력 증진

□ 위치도



하 수 도 사 업 소

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						41.4%	
V-12	하수도 사회기반시설 증진	가평군	신규	2028 (임기외)	정상추진	41.4	

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

하수도 사회기반시설 증진

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-12	환경	주민안전은 더 세심하게	가평군	신규	장기	임기 외
추진부서	하수도사업소		하수관로팀장 하수시설팀장	김기철(4455) 이현호(4440)	담당자	강상민(4459) 김명환(4448)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	41.4%

□ 추진방향

○ 하수도법 제6조에 따라 수립한 가평군 하수도정비 기본계획에 따른 단계적 공공하수도 확충사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2028
- 사업위치: 가평군 공공하수처리구역 일원
- 사업규모: 총 18개 사업
 - 하수처리장 용량 증설 10,320톤/일(7개 사업)
 - 하수관로 정비 258.62km(11개 사업)
- 소요예산: 346,254백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	346,254	122,954	223,300	13,475	11,194	27,808	85,413	85,410		
국비	207,367	64,222	143,145	8,388	5,918	16,942	55,949	55,948		
도비	12,103	6,310	5,793	341	122	1,569	1,881	1,880		
군비	62,403	18,569	43,834	2,603	4,440	8,840	13,976	13,975		
기타	64,381	33,853	30,528	2,143	714	457	13,607	13,607		

- 사업내용
 - 지역개발 수요에 부응한 환경기초시설 확충

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	41.4
2023 ~ 2025	가평 증설 등 4개 사업 완료	· 가평처리장 증설사업(3,500톤) · 신천처리장 증설사업(1,300톤) · 북면하수관로 정비사업(60.25km) · 북면·설악 차집관로 정비사업(7.6km)	22	22

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	41.4
2026	현리 증설 등 7개 사업 완료	· 항사처리장 증설사업(1,300톤) · 천안처리장 증설사업(450톤) · 봉수소규모(현리 연계) 사업(25.78km) · 2016년 도시침수예방사업(6.87km) · 북면·설악면·상면 노후관로 정비사업(2.34km) · 현리·산유 하수관로 정비사업(28.38km) · 청평면 노후관로 정비사업(4.1km)	38	16.7
2027	호명 증설 등 4개 사업 완료	· 호명처리장 증설사업(370톤) · 청평·설악 하수관로 정비사업(49.6km) · 운악·상판 하수관로 정비사업(10.6km) · 가평읍 하수관로 정비사업(18.5km)	22	1.9
2028	청평 증설 등 3개 사업 완료	· 청평처리장 증설사업(3,100톤) · 신천처리장 증설사업(1,700톤) · 북면 하수관로 2단계 정비사업(44.6km)	18	0.8

※ 공정률 산정방식: 전체 공정률(100%) 중 설계완료공정률(10%), 시설공사완료공정률(90%)로 환산해 산정

□ 추진실적

○ 사업별 추진현황 ※ 사업완료 4건, 공사중 5건, 재착공예정 1건, 착공예정 1건, 설계중 7건

구 분	사 업 명	추진현황	비고
2023	1 항사처리장 증설사업(3,500톤)	사업완료	
	2 신천처리장 증설사업(1,300톤)	사업완료	
	3 북면하수관로 정비사업(60.25km)	사업완료	
	4 북면·설악 차집관로 정비사업(7.6km)	사업완료	
2024	- 공약이행평가단 제5차 회의 / 2024. 9. 9. - 내용: 사업기간(~2025→2028), 소요예산(322,960→346,254백만원), 사업내용 등 - 사유: 하수도정비기본계획 승인에 따른 처리장 증설 용량 변경 및 증설 사업 추가		
2026	5 항사처리장 증설사업(1,300톤)	공사중	
	6 천안처리장 증설사업(450톤)	공사중	
	7 봉수소규모(항사 연계) 사업(25.78km)	공사중	
	8 2016년 도시침수예방사업(6.87km)	공사재착공예정(25년 3월)	
	9 북면·설악면·상면 노후관로 정비사업(2.34km)	공사착공예정(25년 3월)	
	10 현리·산유 하수관로 정비사업(28.38km)	공사중	
	11 청평면 노후관로 정비사업(4.1km)	설계중	
2027	12 호명처리장 증설사업(370톤)	설계중	
	13 청평·설악 하수관로 정비사업(49.6km)	공사중	
	14 운악·상판 하수관로 정비사업(10.6km)	설계중	
	15 가평읍 하수관로 정비사업(18.5km)	설계중	
2028	16 청평처리장 증설사업(3,100톤)	설계중	
	17 신천처리장 증설사업(1,700톤)	설계중	
	18 북면 하수관로 2단계 정비사업(44.6km)	설계중	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

구 분		향 후 계 획	비 고
2026	1분기	· 항사처리장 증설사업, 봉수소규모(항사 연계) 사업 준공	
	2분기	· 현리산유 하수관로 정비사업 준공	
	3분기	· 2016년 도시침수예방사업, 북면,설악,상면 노후관로 정비사업 준공	
	4분기	· 천안처리장 증설사업, 청평면 노후관로 정비사업 준공	
2027	4분기	· 호명처리장 증설사업 외 3건 준공(27.11월)	
2028	2분기	· 청평처리장 증설사업 외 2건 준공(28.5월)	

□ 기대효과

- 지역개발 수요에 부응한 환경기초시설 확충
- 북한강 수질보전과 팔당수계 맑은 물 공급
- 주민생활환경 개선과 공중보건 증진

□ 평면도

