
- 2024년 2/4분기 -
민선8기 공약사업



가 평 군

목 차

I. 공약사업 추진상황	3
II. 목표별 공약사업 목록	5
III. 부서별 공약사업 목록	7
IV. 부서별 관리카드	
1. 기획예산담당관	11
2. 도종합체전추진단	15
3. 행정복지국 / 자치행정과	21
4. 행정복지국 / 복지정책과	25
5. 행정복지국 / 행복돌봄과	29
6. 경제산업국 / 일자리정책과	45
7. 경제산업국 / 소상공인지원과	59
8. 경제산업국 / 문화체육과	67
9. 경제산업국 / 관 광 과	81
10. 경제산업국 / 농업정책과	95
11. 경제산업국 / 축산정책과	101
12. 경제산업국 / 산 림 과	105
13. 건설도시국 / 건 설 과	115
14. 건설도시국 / 환경정책과	135
15. 건설도시국 / 자원순환과	145
16. 건설도시국 / 도 시 과	149
17. 건설도시국 / 교 통 과	161
18. 보 건 소 / 보건정책과	173
19. 농업기술센터 / 소득개발과	179
20. 평생교육사업소	183
21. 상수도사업소	191
22. 하수도사업소	195

- 2024년 2/4분기 - 민선8기 공약사업 추진상황

○ 2/4분기 공약사업 추진현황

구 분		추진현황 (건수)							완료율 (완료·계속)	추진율 (완료·정상·일부추진)
		계	완료	이행후 계속	정상 추진	일부 추진	보류	폐기		
2024	2분기	55	8	7	37	2		1	27.3% (5.5%↑)	100%
2024	1분기	55	7	5	40	2		1	21.8% (7.3%↑)	100%
2023	4분기	55	6	2	44	2		1	14.5% (5.4%↑)	100%
2023	3분기	55	4	1	50				9.1% (1.8%↑)	100%
2023	2분기	55	3	1	51				7.3% (3.7%↑)	100%

⇒ 2분기 추진상황 점검결과 총 55개 공약사업 중 15개 사업 완료

○ 분야별 현황

분 야	건 수	목 표 년 도			사 업 주 체				
		단기	중기	장기	자체	중앙	경기도	자체+민자	기타 (민자등)
계	55	14	34	7	45	4	4	1	1
I. 군민중심의 경제·농업정책	9		9		8			1	
II. 맞춤형 인구정책 추진	6	2	4		6				
III. 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	14	6	7	1	14				
IV. 생활인구 10만의 자족도시 완성	6	2	3	1	3	1	1		1
V. 도시 인프라 구축	12	1	6	5	6	3	3		
VI. 군민의 건강한 삶	5		5		5				
VII. 일 잘하는 가평군	3	3			3				

※ 단기: 2년 이내, 중기: 2년초과~임기 내, 장기: 임기 후

○ 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기후	비고
			소계	'22	'23	'24	'25	'26		
계	921,703	183,249	632,842	55,275	93,831	121,641	199,523	162,572	105,612	
국비	317,147	96,705	196,672	4,669	8,345	17,692	81,595	84,371	23,770	
도비	73,046	14,167	51,822	3,557	15,254	19,178	9,143	4,690	7,057	
군비	314,668	60,057	222,174	16,406	36,154	48,036	85,459	36,119	32,437	
민간	85,924	-	61,576	15,000	15,000	10,400	3,000	18,176	24,348	
기타	130,918	12,320	100,598	15,643	19,078	26,335	20,326	19,216	18,000	

⇒ 사업주체가 가평군인 사업, 주체가 가평군이 아니더라도 군비가 수반되는 사업

※ 2024년 1/4분기(917,928백만원) 대비 3,775백만원 증

- 사업비 증감 주요사업: 소상공인프로그램 3,252증, 조종면 전통시장 68증, 파크골프장 1,470증, 설악면 생활문화체육시설 200증, 한상수계관리기금 1,065증, 자원회수시설 954증, 대중교통 886감, 읍면별도심지주차장 593증, 경기도의료원 10,000감, 상수도사회기반시설 7,059증

○ 부서별 추진현황 총괄

(단위: 건, %)

부서명	구분	공약건수	추진상황					공정률	비고
			완료	이행후계속	정상추진	일부추진	폐기		
계		55	8	7	37	2	1	58.37	4분기 (53.4%)
기획예산담당관		1	1					100	
도종합계획추진단		1		1				100	
자치행정과		1	1					100	
복지정책과		1			1			30	
행복돌봄과		5	2	1	2			76	
일자리정책과		3			3			44.3	
소상공인지원과		2			2			55	
문화체육과		5			4		1	39.5	
관광과		5		1	2	2		56	
농업정책과		2		1	1			75	
축산정책과		1	1					100	
산업과		4	1		3			28.75	
건설과		6			6			37.5	
환경정책과		3		3				100	
자원순환과		1			1			50	
도시과		4	1		3			53.25	
교통과		4	1		3			72.5	
보건정책과		1			1			25	
소득개발과		1			1			31	
평생교육사업소		2			2			55	
상수도사업소		1			1			20	
하수도사업소		1			1			35.5	

II. 목표별 공약사업 목록

번호	사업명	담당부서	비고
I 군민중심의 경제·농업 정책			
I-1	지역성장을 위한 청정산업단지 기반조성	일자리정책과	p.46
I-2	소상공인 생존·활력 프로그램 추진	소상공인지원과	p.60
I-3	가평 2030 청년 지원(눈높이 청년복지)	일자리정책과	p.50
I-4	조종면 전통시장 활성화 지원	소상공인지원과	p.65
I-5	일자리 창출(다문화, 군인가족, 경력단절 여성 등)	일자리정책과	p.53
I-6	글로벌 가평농업 프로젝트	농업정책과	p.96
I-7	직거래장터 활성화 이행후계속	농업정책과	p.98
I-8	가평군 스마트팜 기술보급 사업 추진	소득개발과	p.180
I-9	산림자원 가공산업 육성	산림과	p.106
II 맞춤형 인구정책 추진			
II-1	인구증가정책 수립(다문화가족중시) 완료	행복돌봄과	p.30
II-2	노인회관(노인복지회관) 건립	행복돌봄과	p.32
II-3	생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성	행복돌봄과	p.35
II-4	행복한 가정을 위한 아이돌보미사업 확대 완료	행복돌봄과	p.39
II-5	평생학습관 건립 및 교육사업 프로그램 편성 운영	평생교육사업소	p.184
II-6	청소년문화의집 프로그램 운영	평생교육사업소	p.188
III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성			
III-1	미영연방 관광안보 공원 조성	복지정책과	p.26
III-2	가평 역사박물관 건립 폐기	문화체육과	p.68
III-3	(지역예술인과 함께 하는)음악역 1939 피크닉 콘서트	문화체육과	p.71
III-4	운악산 관광레저 단지 조성(현등사, 운악산 문화관광마을)	관광과	p.82
III-5	밀리터리 콘텐츠 테마파크 조성	관광과	p.85
III-6	드론 아카데미 확대 운영	교통과	p.162
III-7	신선봉(울업산) 일대 산악관광지 개발계획 수립 이행후계속	관광과	p.87
III-8	북한강 수변 관광특구 지정 신청	관광과	p.91
III-9	북면 산림생태테마파크 조성	산림과	p.109
III-10	상면 산림자원 관광레저 바이오밸리 조성	산림과	p.111
III-11	북한강 천년벚길 조성	관광과	p.89
III-12	청평 옛 중앙내수면연구소 이전부지 주민 개방 완료	축산정책과	p.102
III-13	축령산 생태관광마을 둘레길 조성(행현2리 중심) 완료	산림과	p.113
III-14	2025~2026 경기도 체육대회 유치 이행후계속	도종합체전추진단	p.16

번호	사 업 명	담당부서	비고
IV 생활인구 10만의 자족도시 완성			
IV-1	명품주거단지 1만호 건설(군인아파트 등) 목표로 주거문제 해결	도시과	p.150
IV-2	북면도시공원 야간 경관 조성 완료	도시과	p.153
IV-3	수도권정비계획법 자연보전권역 규제 완화	도시과	p.156
IV-4	GTX-B 노선 가평 연장 확정 완료	교통과	p.164
IV-5	대중교통 시스템 및 노선확충(잠실-청평-가평)	교통과	p.167
IV-6	재정여건 개선을 위한 한강수계관리기금 추가확보 이행후계속	환경정책과	p.136
V 도시 인프라 구축			
V-1	제2경춘국도 건설사업 조기 착공	건설과	p.116
V-2	지방도 387호선(내방-연하) 도로 개량사업 조기 착공	건설과	p.119
V-3	하천C~고성 간 도로 개설사업(호명터널) 확정	건설과	p.122
V-4	국도75호선(가평~목동) 확장사업 착공	건설과	p.125
V-5	상판~적목 간 2차선 도로 개설사업 확정	건설과	p.128
V-6	두밀~대보 간 2차선 도로 개설사업 확정	건설과	p.131
V-7	읍면별 도심지 주차장 확충 추진	교통과	p.169
V-8	청평역, 상천역 역세권 활성화(기반시설 확충)	도시과	p.158
V-9	전기차 충전 인프라 확대 이행후계속	환경정책과	p.139
V-10	친환경 자원회수시설(소각) 설치	자원순환과	p.146
V-11	상수도 사회기반시설 증진	상수도사업소	p.191
V-12	하수도 사회기반시설 증진	하수도사업소	p.196
VI 군민의 건강한 삶			
VI-1	경기도의료원 가평병원 유치	보건정책과	p.174
VI-2	보조기기 수리센터 운영 이행후계속	행복돌봄과	p.41
VI-3	파크골프장 확충	문화체육과	p.73
VI-4	상면 생활문화체육시설 및 공간조성	문화체육과	p.76
VI-5	설악면 생활문화체육시설 및 주차장 확보	문화체육과	p.78
VII 일 잘하는 가평군			
VII-1	민원정책관제 및 감사관실 신설 완료	자치행정과	p.22
VII-2	예산 및 사업유치를 위한 서울사무소 설치 완료	자치행정과	p.12
VII-3	환경부 대응 환경정책자문회 설치 · 운영 이행후계속	환경정책과	p.142

III. 부서별 공약사업 목록

번호	공약목표	사업명	추진상황	이행률	완료시기	비고
계		55개 사업			58.36%	
기획예산담당관		1개 사업			100%	
VII-2	일 잘하는 가평군	예산 및 사업유치를 위한 서울사무소 설치	완료	100%	2023 (임기내)	p.12
도종합체전추진단		1개 사업			100%	
III-14	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	2025~2026 경기도 체육대회 유치(개최)	이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.16
자치행정과		1개 사업			100%	
VII-1	일 잘하는 가평군	민원정책관제 및 감사관실 신설	완료	100%	2023 (임기내)	p.22
복지정책과		1개 사업			30%	
III-1	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	미영연방 관광안보 공원 조성	정상추진	30%	2026 (임기내)	p.26
행복돌봄과		5개 사업			76%	
II-1	맞춤형 인구정책 추진	인구증가정책 수립(다문화가족중시)	완료	100%	2023 (임기내)	p.30
II-2	맞춤형 인구정책 추진	노인회관(노인복지회관) 건립	정상추진	45%	2026 (임기내)	p.32
II-3	맞춤형 인구정책 추진	생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성	정상추진	35%	2026 (임기내)	p.35
II-4	맞춤형 인구정책 추진	행복한 가정을 위한 아이돌보미사업 확대	완료	100%	2023 (임기내)	p.39
VI-2	군민의 건강한 삶	보조기기 수리센터 운영	금회 이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.41
일자리정책과		3개 사업			44.3%	
I-1	군민중심의 경제·농업 정책	지역성장을 위한 청정산업단지 기반조성	정상추진	30%	2028 (임기외)	p.46
I-3	군민중심의 경제·농업 정책	가평 2030 청년 지원(눈높이 청년복지)	정상추진	60%	2026 (임기내)	p.50
I-5	군민중심의 경제·농업 정책	일자리 창출 (다문화, 군인가족, 경력단절 여성 등)	정상추진	43%	2026 (임기내)	p.53
소상공인지원과		2개 사업			55%	
I-2	군민중심의 경제·농업 정책	소상공인 생존·활력 프로그램 추진	정상추진	50%	2026 (임기내)	p.60
I-4	군민중심의 경제·농업 정책	조종면 전통시장 활성화 지원	정상추진	60%	2025 (임기내)	p.65

번호	공약목표	사업명	추진상황	이행률	완료시기	비고
문화체육과		5개 사업(폐기 1)			39.5%	
III-2	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	가평 역사박물관 건립	폐기	-	-	p.68
III-3	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	(지역예술인과 함께 하는) 음악역 1939 피크닉 콘서트	정상추진	48%	2026 (임기내)	p.71
VI-3	군민의 건강한 삶	파크골프장 확충	정상추진	35%	2025 (임기내)	p.73
VI-4	군민의 건강한 삶	상면 생활문화체육시설 및 공간조성	정상추진	20%	2025 (임기내)	p.76
VI-5	군민의 건강한 삶	설악면 생활문화체육시설 및 주차장 확보	정상추진	55%	2025 (임기내)	p.78
관광과		5개 사업			56%	
III-4	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	운악산 관광레저 단지 조성 (현등사, 운악산 문화관광마을)	일부추진	40%	2026 (임기내)	p.82
III-5	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	밀리터리 콘텐츠 테마파크 조성	일부추진	25%	2024 (임기내)	p.85
III-7	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	신선봉(울업산) 일대 산악관광지 개발 계획 수립	이행후계속	100%	2023 (임기내)	p.87
III-8	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	북한강 수변 관광특구 지정 신청	정상추진	80%	2024 (임기내)	p.89
III-11	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	북한강 천년벚길 조성	정상추진	35%	2026 (임기내)	p.91
농업정책과		2개 사업			75%	
I-6	군민중심의 경제·농업 정책	글로벌 가평농업 프로젝트	정상추진	50%	2026 (임기내)	p.96
I-7	군민중심의 경제·농업 정책	직거래장터 활성화	이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.98
축산정책과		1개 사업			100%	
III-12	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	청평 옛 중앙내수면연구소 이전부지 주민 개방	완료	100%	2023 (임기내)	p.102
산림과		4개 사업			28.75%	
I-9	군민중심의 경제·농업 정책	산림자원 가공산업 육성	정상추진	5%	2025 (임기내)	p.106
III-9	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	북면 산림생태테마파크 조성	정상추진	0%	2023 (임기내)	p.109
III-10	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	상면 산림자원 관광레저 바이오밸리 조성	정상추진	10%	2026 (임기내)	p.111
III-13	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	축령산 생태관광마을 둘레길 조성 (행현2리 중심)	완료	100%	2023 (임기내)	p.113

번호	공약목표	사업명	추진상황	이행률	완료시기	비고
건설과		6개 사업		37.5%		
V-1	도시 인프라 구축	제2경춘국도 건설사업 조기 착공	정상추진	45%	2026 (임기내)	p.116
V-2	도시 인프라 구축	지방도 387호선(내방-연하) 도로 개량사업 조기 착공	정상추진	35%	2026 (임기내)	p.119
V-3	도시 인프라 구축	하천IC~고성 간 도로 개설사업 (호명터널) 확정	정상추진	45%	2027 (임기외)	p.122
V-4	도시 인프라 구축	국도75호선(가평~목동) 확장사업 착공	정상추진	10%	2028 (임기외)	p.125
V-5	도시 인프라 구축	상판~적목 간 2차선 도로 개설사업 확정	정상추진	45%	2027 (임기외)	p.128
V-6	도시 인프라 구축	두밀~대보 간 2차선 도로 개설사업 확정	정상추진	45%	2027 (임기외)	p.131
환경정책과		3개 사업		100%		
IV-6	생활인구 10만의 자족도시 완성	가평군 재정여건 개선을 위한 한강수계관리기금 추가확보	금회 이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.136
V-9	도시 인프라 구축	전기차 충전 인프라 확대	이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.139
VII-3	도시 인프라 구축	환경부 대응 환경정책자문회 설치 · 운영	이행후계속	100%	2026 (임기내)	p.142
자원순환과		1개 사업		50%		
V-10	도시 인프라 구축	친환경 자원회수시설(소각) 설치	정상추진	50%	2028 (임기외)	p.146
도시과		4개 사업		53.25%		
IV-1	생활인구 10만의 자족도시 완성	명품주거단지 1만호 건설(군인아파트 등) 목표로 주거문제 해결	정상추진	40%	2026 (임기내)	p.150
IV-2	생활인구 10만의 자족도시 완성	북면도시공원 야간 경관 조성	금회 완료	100%	2024 (임기내)	p.153
IV-3	생활인구 10만의 자족도시 완성	수도권정비계획법 자연보전권역 규제 완화	정상추진	40%	2026 (임기외)	p.156
V-8	도시 인프라 구축	청평역, 상천역 역세권 활성화 (기반시설 확충)	정상추진	33%	2027 (임기외)	p.158
교통과		4개 사업		72.5%		
III-6	문화가 융성한 관광콘텐츠 육성	드론 아카데미 확대 운영	정상추진	80%	2026 (임기내)	p.162
IV-4	생활인구 10만의 자족도시 완성	GTX-B 노선 가평 연장 확정	완료	100%	2026 (임기내)	p.164
IV-5	생활인구 10만의 자족도시 완성	대중교통 시스템 및 노선확충 (7000노선 : 잠실-청평-가평)	정상추진	60%	2026 (임기내)	p.167
V-7	도시 인프라 구축	읍면별 도심지 주차장 확충 추진	정상추진	50%	2026 (임기내)	p.169

번호	공 약 목 표	사 업 명	추진상황	이행률	완료시기	비고
보건정책과		1개 사업			25%	
VI-1	군민의 건강한 삶	경기도의료원 가평병원 유치	정상추진	25%	2026 (임기내)	p.174
소득개발과		1개 사업			31%	
I-8	군민중심의 경제·농업 정책	가평군 스마트팜 기술보급 사업 추진	정상추진	31%	2026 (임기내)	p.180
평생교육사업소		2개 사업			55%	
II-5	맞춤형 인구정책 추진	평생학습관 건립 및 교육사업 프로그램 편성 운영	정상추진	50%	2026 (임기내)	p.184
II-6	맞춤형 인구정책 추진	청소년문화센터 프로그램 운영	정상추진	60%	2026 (임기내)	p.188
상수도사업소		1개 사업			20%	
V-11	도시 인프라 구축	상수도 사회기반시설 증진	정상추진	20%	2026 (임기내)	p.192
하수도사업소		1개 사업			35.5%	
V-12	도시 인프라 구축	하수도 사회기반시설 증진	정상추진	35.5%	2027 (임기외)	p.196

기 획 예 산 담 당 관

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						100%	
Ⅶ-2	예산 및 사업유치를 위한 서울사무소 설치	가평군	신규	2023 (임기내)	완료	100	

약속Ⅶ 군민의 눈높이에서 일 잘하는 가평군이 되겠습니다.

예산 및 사업유치를 위한 서울사무소 설치

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅶ-2	행정	주민참여는 더 활발하게	가평군	신규	단기	임기 내
추진부서	기획예산담당관		기획팀장	조경아(2050)	담당자	김상규(2052)
협조부서	행정복지국	자치행정과	인사팀장	정경숙(2125)	담당자	유호열(2126) 하영하(2128)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 국회 및 중앙부처를 대상으로 한 예산확보, 정책자료 수집 등으로 군정발전에 기여
- 가평군 대외홍보로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2023. 12.
- 사업위치: 서울시 영등포구 국회대로 800(여의도동) 여의도파라곤 413호
- 사업규모: 사무공간: 73.46㎡ / 직원: 임기제 5급 1명, 7~8급 2명
※ 현재 시간선택제임기제 가급 1명, 6급 1명 서울사무소 근무
- 소요예산: 482백만원 ※ 확보예산: 125백만원(23년: 125)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	482		482		125	119	119	119		
국비										
도비										
군비	482		482		125	119	119	119		
기타										

○ 사업내용

- 조직진단 용역 과업에 포함하여 신규 행정기구 모델 도출
- 서울사무소 위치, 운영방식, 직원 선정 방식, 타당성 등 세부 검토 실시
- 서울사무소 개소

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	이행률
계			100	100
2022 하반기	· 계획 수립 · 조직진단 용역 추진 (자치행정과)	· 조직진단 용역 추진계획 수립 · 조직진단 용역 추진 · 조직진단 용역 결과를 바탕으로 조례(안) 수립	10	10
2023 상반기	· 세부 검토 추진 · 조직 신설 의뢰 (기획예산담당관)	· 서울사무소 운영 세부 검토 추진 - 파견 직원 선정 방식, 운영방안 - 서울사무소 상시 운영 타당성 검토 - 서울사무소 위치 선정 등 · 조직 신설 의뢰(팀 규모, 소속 과 등)	40	40
2023 하반기	· 인사 발령 (자치행정과) · 서울사무소 운영 (해당 부서)	· 인사 발령 · 서울사무소 운영	10 40	10 40

□ 추진실적

[조직진단 관련]

- 2022. 8.18.: 조직진단용역 착수
- 2022. 8.29.: 조직진단용역 관련 자료 제출
- 2022. 9. 2.: 조직진단 용역 관련 부서별 의견 수렴
- 2022. 9.16.: 부서별 인터뷰 완료
- 2022.10. 5.: 가평군공무원노동조합 의견 수렴
- 2022.10.13.: 조직진단용역 중간보고회 개최
- 2022.10.27.: 조직진단용역 최종보고회 개최
- 2022.12. 7.: 「가평군 행정기구 및 정원 조례」 공포
- 2023. 1. 1.: 「가평군 행정기구 및 정원 조례」 시행

[서울사무소 관련]

- 2022.10. 4.: 가평군 서울사무소 설치계획 수립
- 2023. 2. 2.: 가평군 서울사무소 설치 변경 계획 수립
- 2023. 4. 4.: 2023년 제1회 추가경정 예산안 의회 의결
- 2023. 5. 1.: 서울사무소 부동산 임대차 계약 체결
- 2023. 5.19.: 서울사무소 리모델링공사 계약 체결
- 2023. 5.30.: 시간선택제임기제(소장) 채용 의뢰
- 2023. 6. : 서울사무소 집기 비품 구입
- 2023. 8. 9.: 시간선택제임기제(소장) 임용
- 2023. 8.11.: 서울사무소 개소 및 운영

□ 기대효과

- 국비확보, 입법활동, 투자유치 등 동향파악 신속 대응

도 종합체전추진단

번호	사업명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						100%	
III-14	2025~2026 경기도 체육대회 유치(개최)	가평군	신규	2023 (임기내)	이행후 계속	100	

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

2025~2026 경기도 체육대회 유치(개최)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-14	문화	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	도종합체육추진단		대회기획팀장 대회홍보팀장 대회운영팀장 대회시설팀장	김미경(2671) 나선주(2681) 원경원(2676) 공중식(2672)	담당자	김혜영(2673) 이경하(2682) 이수종(2677) 이종국(2674)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 경기도종합체육대회를 통해 지역경제 활성화
- 기존 체육시설 개·보수를 통한 최선의 체육 인프라 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 4. ~ 2026. 10.
- 사업규모: 25년 ~ 26년 경기도종합체육대회 유치 1식
- 소요예산: 27,921백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	27,921		27,921		6,305	16,116	2,500	3,000		
국비	1,010		1,010		500	510				
도비	10,000		10,000		3,200	6,000	400	400		
군비	16,911		16,911		2,605	9,606	2,100	2,600		
기타										

○ 사업내용

- 가평종합운동장 및 기존 체육시설 개·보수를 통한 공인 경기장 구축
- 2025년 ~ 2026년 경기도종합체육대회 경기장 배정
- 대회 행사 운영비 지출 및 각종 용역 발주

□ 연도별 목표 및 추진계획(이행 후 계속 추진)

구 분	목 표	추진 계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022	경기도 종합체육대회 유치 준비	25~26년 경기도종합체육대회 개최지 선정을 위해 유치신청 준비 및 체육시설 전수조사	80	80
2023	시설 총사업비 확정 및 설계용역발주	체육대회 유치 확정(4월) 이후 체육시설 총사업비 산출 및 설계용역발주	20	20
2024	체육시설 인프라 구축 완료	24년 말까지 경기장 구축 완료	-	-
2025	대회진행 용역 발주 및 체육시설 개보수	25년 경기도체육대회(비장애인, 장애인) 행사운영비 지출 및 용역 실시 및 체육시설 개보수	-	-
2026	대회진행 용역 발주 및 대회종료 후 정산	26년 10월을 끝으로 모든 대회를 종료하고 정산	-	-

□ 추진실적

- 2022.11.25.: 군의회 시정연설에 대회 유치 표명
- 2023. 2.27.: 경기도종합체육대회 유치 신청서 제출
- 2023. 3.24.: 경기도종합체육대회 현장 실사단 방문
- 2023. 4.11.: 경기도종합체육대회 가평군 유치 확정
- 2023. 7.24.: 경기도종합체육대회 개최 도민체전T/F팀 구성
- 2023. 8.23.: 경기도종합체육대회 기본계획 수립
- 2023. 8.24.: 제1차 외식·숙박업소 유관 단체 간담회 개최
- 2023. 8.30.: 추진계획 설명회 및 대회추진단 발대식
- 2023. 9.: 경기도종합체육대회 경기장 개보수 대상지 전수조사(35개소)
- 2023. 9.~10.: 경기도종합체육대회 경기장 실시설계용역 착수(17건)
- 2023.11.~12.: 경기도종합체육대회 경기장 실시설계용역 준공(12건)
- 2024. 1. 2.: 도종합체전추진단 확대 구성
- 2024. 1.~3.: 숙박·외식 참여업소 모집
- 2024. 1.26.: 가평홍보동영상 착수보고회 개최
- 2024. 2. 5.: 경기도종합체육대회 민간추진단 발대식 개최
- 2024. 2.28.: 2024년 정기1차 및 수시1차 道 제2지방재정투자심사
- 2024. 3. 4.: 대회상징물 및 디자인매뉴얼 개발 용역 체결

- 2024. 3.: 체육시설 개보수공사 착공
- 2024. 3. ~ 6.: 대회상징물 제작 및 슬로건 공모·선정
- 2024. 4.18.: 경기도종합체육대회 조직위원회 출범식
- 2024. 4. ~ 5.: 파주시 개최 2024경기도(장애인)체육대회 가평군 홍보부스 운영
- 2024. 6.: 대회 종합 홍보계획 수립
- 2024. 6.15.: 경기모아뮤직페스티벌 2025경기도(장애인)체육대회 가평군 개최 홍보부스 운영
- 2024. 6. ~ 7.: 민간추진단 홍보 캠페인 실시(가평읍, 설악면, 상면)
- 2024. 5. ~ 6. : 체육시설 개보수공사 준공

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 2024. 7. ~ 10. : 체육시설 개보수공사 11개소 준공
(가평·청평테니스장, 설악야구장, 가평종합운동장, 학교시설 7개소)
- 2024. 7.: 대회 상징물 및 디자인매뉴얼 개발 용역 준공
- 2024. 7.: 유튜브 등 가평군 공식SNS 대회홍보영상(숏폼콘텐츠 등) 용역
- 2024. 8. ~ 2024.10.: 홍보 조형물(대회 마스코트) 설치
- 2024. 9. ~ 2025. 4.: 지역 축제 시 홍보부스 운영
- 2024. 9.: 개·폐회식 행사 연출 대행 용역
- 2024. 9.: 자원봉사자 모집
- 2024.10.: 외식·숙박 가격안정화를 위한 업무협약
- 2024.10.: 대회 공식 홈페이지 개설
- 2024.10.: 개·폐회식 및 경기장방영용 홍보동영상 제작용역 준공
- 2024.11.: 성화 행사 연출 대행용역
- 2024.11. ~ 2025. 2.: 자원봉사자 선발 및 교육
- 2024.12.: 6개 읍·면 잔여일수 등신대 설치
- 2025. 1.: 안전·의료·방역·교통 대책 수립
- 2025. 3.: 대회 홍보탑, 꽃탑 제작

□ 기대효과

- 경기도 최대 규모 체육대회를 유치하여 군민의 자긍심을 높이고 군민화합과 단합된 가평 이미지를 경기도 전역에 확산
- 청정 관광 자원과 연계한 우수한 체육 인프라 홍보로 자연이 어우러진 수도권 최고의 힐링 스포츠 투어링 메커니즘 도시로 도약
- 다양한 체육 종목 저변 확대 및 지역이 건강해지는 체육 복지 실현

자 치 행 정 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						100%	
VII-1	민원정책관제 및 감사관실 신설	가평군	신규	2023 (임기내)	완료	100	

약속Ⅷ 군민의 눈높이에서 일 잘하는 가평군이 되겠습니다.

민원정책관제 및 감사관실 신설

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅶ-1	행정	주민참여는 더 활발하게	가평군	신규	단기	임기 내
추진부서	행정복지국	자치행정과	인사팀장	정경숙(2125)	담당자	유호열(2126)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 100%

□ 추진방향

- 적극적인 민원해결 및 주민 소통을 위한 민원정책관 직위 신설
- 청렴한 공직사회 조성 및 선제적 감사 업무 수행을 위한 감사 담당 부서 신설
- 행정 기능별 사무의 합리적 조정

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2023. 6.
- 사업규모: 조직진단 1식
- 소요예산: 52백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	52		52	52						
국비										
도비										
군비	52		52	52						
기타										

○ 사업내용

- 적극적인 민원해결과 군민 소통을 위한 민원정책관 직위 신설
- 청렴 공직사회 풍토 조성을 위한 감사담당부서 신설
- One-stop 민원처리를 위한 건축과 · 허가민원과 민원처리 부서 기능 및 구조진단
- 보건소 및 보건진료소 유사·중복기능·통폐합 인력 및 업무 조정

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	100
2022 하반기	· 계획 수립 · 조직진단 용역 추진	· 조직진단 용역 추진계획 수립 · 조직진단 용역 추진 · 조직진단 용역 결과를 바탕으로 조례(안) 수립	90	90
2023 상반기	· 자치법규 정비 · 인사 발령	· 「가평군 행정기구 및 정원」 조례, 규칙, 규정 등 자치법규 정비 · 인사 발령	10	10

□ 추진실적

- 2022. 8.18.: 조직진단용역 착수
- 2022. 8.29.: 조직진단용역 관련자료 제출
- 2022. 9. 2.: 조직진단 용역 관련 부서별 의견 수렴
- 2022. 9.16.: 부서별 인터뷰 완료
- 2022.10. 5.: 가평군공무원노동조합 의견 수렴
- 2022.10.13.: 조직진단용역 중간보고회 개최
- 2022.10.27.: 조직진단용역 최종보고회 개최
- 2022.12. 7.: 「가평군 행정기구 및 정원 조례」 공포
- 2023. 1. 1.: 「가평군 행정기구 및 정원 조례」 시행

□ 기대효과

- 적극적인 민원해결 및 청렴한 공직사회 조성으로 주민들이 체감하는 행정서비스 만족도 향상

복 지 정 책 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						30%	
Ⅲ-1	미영연방 관광안보 공원 조성	가평군	신규	2026 (임기내)	정상추진	30	

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

미영연방 관광안보공원 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-1	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	행정복지국	복지정책과	복지기획팀장	신성남(2210)	담당자	김은영(2214)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	30%

□ 추진방향

- 미국참전비 및 호주·뉴질랜드·캐나다 등 각국의 참전기념비가 설치되어 있는 북면 지역에 동 참전비와 연계된 안보 교육의 구심점 역할을 할 수 있는 공원 조성
- 군유지 활용 및 지역사회 공감대 형성을 위한 주민의견 수렴 이행

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 사업위치: 가평군 북면 목동리 산226-1 일원
- 사업규모: 부지면적 151,151㎡(93,520㎡ 활용), 조형물, 전시관, 관광·문화시설 조성 등
- 소요예산: 29,500백만원(20,000백만원) ※소요예산: 60백만원(23년: 60)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	29,500		29,500		60	2,140	27,300			
국비	5,200		5,200				5,200			
도비										
군비	24,300		24,300		60	2,140	22,100			
기타										

○ 사업내용

- 미영연방 참전비 관련 조형물 설치, 전시관 등 스물문화원 설치
- 가평전투 3D게임 형상화를 통한 안보교육장 마련 및 학생 방문코스 조성 등
- 지역주민과 관광객이 이용할 수 있는 관광·문화시설 설치로 지역경제 활성화 도모
- 편익시설: 주차장 155면
- 교양시설: 메모리얼 파크(4,080㎡), 조각공원(2,690㎡), 가평전투기념관(연면적 3,500㎡)
- 유희시설: 어린이 놀이터(1,625㎡), 루지 체험장(9,480㎡)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	30
2022 하반기	중기지방재정계획 및 주민의견수렴	· 공약사업 추진계획 보고 및 중기지방재정계획 반영 · 학술연구용역 심의 및 주민의견 수렴	10	10
2023 ~ 2024	사전타당성 연구용역 및 예산확보	· 자료조사 및 우수시설 벤치마킹 · 사업 타당성 용역실시(사업비 산정) · 기본계획수립 및 사업대상지(입지) 확정 · 사전행정절차 이행(중기지방재정계획, 투융자심사, 공유재산관리계획) 및 사업예산 확보 · 군 관리계획(변경) 및 기본·실시설계	40	20
2025	공사착공	· 실시계획인가 승인 및 인·허가 완료 · 시공사 선정 및 공사착공	30	
2026 상반기	공사준공	· 공사 진행 및 준공	20	

□ 추진실적

- 2022. 8: 민선8기 인수위원 의견청취 및 검토 보고
- 2022. 8: 미영연방 관광안보공원 조성 추진계획 보고
- 2022. 9: 중기지방재정계획 반영
- 2022.12: 주민의견 수렴(2회)
- 2023. 2: 우수 보훈 및 전시시설 벤치마킹 실시(오산시 UN초전기념관 외 3개소)
- 2023. 2: 학술연구용역 심의 의결(원안가결)
- 2023. 4: 사전 타당성 조사 연구 용역비 제1회 추경예산 확보(70백만원)
- 2023. 6: 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 계약 체결 및 착수('23. 6.23. ~ 10.20.)
- 2023. 7: 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 착수보고회 개최
- 2023. 8: 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 주민설명회(1차) 개최
- 2023. 9: 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 관계자(자문위원 등) 사전 회의 개최
- 2023. 9: 사전 타당성 조사 연구 및 기본계획 수립 용역 주민설명회(2차) 개최
- 2023.10.: 타당성 조사 연구 및 기본계획 용역 중간보고회 개최
- 2023.10.: 타당성 조사 연구 및 기본계획 용역 최종보고회 및 용역 준공
- 2023.12.: 중앙투자심사 의뢰(재원확보계획 미비로 반려 2024. 1. 9.)
- 2024. 1.: 군 관리계획(변경) 용역비 본예산 확보
- 2024. 2.: 전투기념관 건립 관련 공유재산심의 원안가결

- 2024. 2.: 지방재정 투자심사 조건부 의결
(2025년 중기지방재정계획에 추가 사업비의 재원을 수정하여 재반영)
- 2024. 2.: 일상감사 및 계약심사 의뢰
- 2024. 3.: 일상감사 및 계약심사 재의뢰(국토계획 표준품셈에 따른 품셈 수정)
- 2024. 3.: 일상감사 및 계약심사 결과 알림(자문위원 검토결과 별도 의견없음)
- 2024. 3.: 미·영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 계약 의뢰
- 2024. 4.: 미·영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 사업수행능력평가 실시
- 2024. 6.: 미·영연방 관광안보공원 조성 군관리계획(공원) 결정 용역 계약 및 착수

□ 추진상 문제점 및 대책

- 타당성 연구용역 결과 구체적인 사업비 산정 시 국·도비 등 예산 확보 노력 강구
- 타당성 연구용역 결과 산정된 사업비(295억원)를 토대로 국·도비 등 예산 확보 노력 강구

□ 향후계획

- 국·도비 예산 확보를 위한 노력 강구
- 군 관리계획(변경 결정) 및 기본·실시설계용역, 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

- 미·영연방 안보전시관 및 관광시설과 연계된 볼거리·즐길거리 등이 있는 공원 조성을 통해 지역경제 활성화에 기여

행 복 돌 봄 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
5개 사업						76%	
Ⅱ-1	인구증가정책 수립(다문화가족중시)	가평군	신규	2023 (임기내)	완료	100	
Ⅱ-2	노인회관(노인복지회관) 건립	가평군	신규	2026 (임기내)	정상추진	45	
Ⅱ-3	생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성	가평군	계속	2026 (임기내)	정상추진	35	
Ⅱ-4	행복한 가정을 위한 아이돌보미사업 확대	가평군	계속	2023 (임기내)	완료	100	
Ⅵ-2	보조기기 수리센터 운영	가평군	계속	2026 (임기내)	이행후 계속	100	

약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

인구증가정책 수립(다문화가족중시)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
II-1	행정	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	단기	임기 내
추진부서	행정복지국	행복돌봄과	여성가족팀장	최윤정(2260)	담당자	윤다솔(2261)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 현재 추진 중인 19개 다문화가족 지원 사업 가운데 14개 사업이 국·도비 보조사업으로 우리 지역만의 특화된 다문화가족 지원 사업이 부족한 실정으로 다문화가족에 대한 실태 조사, 지원 사업에 대한 성과 분석 및 개선안 도출 필요
- 중장기 다문화 중시 인구증가정책 및 연차별 시행계획 수립을 위해 다양한 분야의 전문가 및 지역주민, 민간기관 등 지역사회 주체들이 참여하는 학술연구용역 실시

□ 사업개요

- 사업명: 다문화가족 중시 인구정책 수립 연구용역
- 사업기간: 2022. 8. ~ 2023. 12.
- 소요예산: 22백만원 ※ 확보예산: 총 22백만원(23년: 22)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	22		22		22				
국비									
도비									
군비	22		22		22				
기타									

○ 용역 주요 내용

- 다문화가족 실태조사 및 유형 분석, 자원 발굴
- 다문화가족 지원사업 시행결과 성과 분석 및 개선과제 도출
- 다문화가족 욕구조사 및 신규 지원사업 등 발굴
- 다문화가족 중시 중장기 인구정책 및 연차별 시행계획 수립

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022.10.	학술연구용역 심의	· 2023년 본예산 반영 학술연구용역 심의	5	5
2022.12.	예산 확보	· 학술연구용역 사업비 확보	5	5
2023. 1.	용역 착수	· 학술연구용역 착수	30	30
2023. 7.	용역 완료	· 학술연구용역 완료	30	30
2023.12.	인구증가 정책수립	· 중장기 인구정책 및 연차별 시행계획 수립	30	30

□ 추진실적

- 2022. 8.10.: 인구증가정책 추진계획 수립
- 2022. 9.28.: 인구증가정책 수립 학술연구용역 방침 보고
- 2022.10.11.: 가평군 학술연구용역 심의 완료
- 2022.12.16.: 학술연구용역 사업비 확보(2023년도 본예산 22,000천원)
- 2023. 2.24.: 학술연구용역 계약 체결(경기도 여성가족재단)
- 2023. 3.10.: 학술연구용역 착수보고
- 2023. 5.19.: 학술연구용역 지역전문가 자문회의 실시
- 2023. 7.17.: 학술연구용역 중간보고회 개최
- 2023. 8. 9.: 학술연구용역 최종보고회 개최
- 2023.12.19.: 다문화가족 중시 중장기 정책방안 시행계획 수립 완료
〔행복돌봄과-76705(2023.12.19.)호〕

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 2024. 1월 ~ 12월: 「다문화가족 중시 중장기 정책방안 시행계획」 세부과제 추진

□ 기대효과

- 다문화가정의 지역사회 내 안정적인 정착과 화합을 적극 지원하여 인구증가에 기여
- 타 시군과 차별화된 다문화가정 정착지원 사업 발굴을 통해 선진 다문화 사회 구현

약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

노인회관(노인복지회관) 건립

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
II-2	복지	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	단기	임기 내
추진부서	행정복지국	행복돌봄과	복지시설팀장	최태양(2228)	담당자	조영운(2253)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	45%

□ 추진방향

- 가평군노인회, 노인회 취업센터, 가평군노인복지관이 각각의 시설에서 운영되고 있어 복지 서비스 이용 시 수혜자 및 프로그램 중복을 줄이고 보다 많은 어르신들에게 다양한 프로그램 제공을 위해 관련 시설들을 한곳에서 운영
- 또한, 접근성이 편리하고 어르신들이 이용하기 편리한 위치에 조성하여 노인여가복지 증진에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업위치: 가평읍 읍내리 282-2
- 사업규모: 연면적 약 2,300㎡(지하1층, 지상4층)
- 소요예산: 12,100백만원(15,000백만원) (부지매입비 2,100 / 공사비 10,000)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	12,100		12,100		2,142	450	7,508	2,000		
국비										
도비	2,000		2,000				2,000			
군비	10,100		10,100		2,142	450	5,508	2,000		
기타										

※ 재원확보방안: 특별조정교부금(2,000백만원) 및 지방소멸대응기금(2,000백만원)지원건의

▶ 국·도비 미확보 시, 군비 확보 필요

○ 사업내용

- 지하1층: 기계실
- 지상1층: 경로식당, 체력단련실, 휴게실, 화장실
- 지상2층: 다목적실, 소회의실, 프로그램실 1·2, 정보화교육실, 화장실
- 지상3층: 관장실, 사무실(노인복지관), 프로그램실 3, 휴게실, 화장실
- 지상4층: 지회장실, 노인대학장실, 사무실(사무국, 취업센터), 소회의실, 화장실

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	45
2022 하반기	부지선정	· 가평군노인회 및 가평군노인복지관 등 의견수렴	10	10
2023	부지매입	· 노인회관 신축 지자체 벤치마킹 실시(양평, 포천) · 공유재산 관리계획 승인 · 재정투자 심사 · 중기지방재정계획 반영	20	20
2024	실시설계	· 특별조정교부금 및 특별교부세 등 신청 · 공공건축물 사업계획 사전검토 · 실시설계 및 공사 착공(2025년)	30 (10)	15
2025	공사추진	· 준공	40 (60)	

□ 추진실적

- 2022.10.05.: 중기지방재정계획 반영
- 2022.11.29.: 부지선정 후 부지의 감정평가실시
- 2023. 2.17.: 제1회 가평군 공유재산 심의회 원안가결
- 2023. 3.09.: 제1회 지방보조금 투자심사 원안가결
- 2023. 4.19.: 노인회관 부지 매입 완료(2,100백만원)
- 2023. 6.16.: 제2회 지방보조금 투자재심사 원안가결
- 2023. 7.18.: 제4회 가평군 공유재산 심의회 원안가결
- 2023.11.23.: 노인회관 건립공사 건축기획용역 착수
- 2024. 2.25.: 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰
- 2024. 4. 4.: 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2024. 4.18.: 공공건축심의위원회 심의 요청
- 2024. 5. 8.: 공공건축심의위원회 심의 완료
- 2024. 6. 7.: 건축기획용역 완료
- 2024. 6.21.: 건축설계공모 공고

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 2024. 9.: 기본 및 실시설계 용역 실시
- 2025. 3.: 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2025. 4.: 공사 착공
- 2026.12.: 공사 준공

□ 기대효과

- 노인여가복지시설 이용자들이 고령임을 감안, 이용자의 안전과 이동의 편리함을 최우선으로 하여 이용자의 만족도 향상
- 교육, 각종 여가활동, 노인일자리 등 다양한 복지서비스 제공시 프로그램 중복을 방지하고 수요자의 눈높이에 맞게 제공함으로써 삶의 질 향상

약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
II-3	복지	지역문화는 더 다채롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	행정복지국	행복돌봄과	복지시설팀장	최태양(2228)	담당자	조영운(2253)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	35%

□ 추진방향

- 민선8기 공약사업으로 4개 권역에 어린이들이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 공간 및 프로그램을 마련하여 출산율을 높이는 정책 기여
- 아이들의 꿈과 상상력을 키울 수 있는 안전한 공간으로 4계절 이용 가능한 실내 어린이 놀이시설건립 및 연령에 맞는 다양한 키즈 프로그램으로 어린이들의 놀 권리 보장과 놀이문화 조성
- 가평군 주민들의 양육 환경 조성 및 가평군을 찾는 관광객들에게 어린이들이 재미있고 행복한 「힐링 가평」 으로의 밝은 이미지 고취시킴

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 9. ~ 2026. 6.
- 사업위치: 청평면 청평리 405-4번지 일원, 조종면 현리 419-11번지 일원, 설악면 미정
- 사업규모: 3개소(청평면, 조종면, 설악면)
- 소요예산: 26,500백만원(26,440백만원) ※ 확보예산: 총 13,896백만원(22년: 6,000, 23년: 7,896)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	26,500		25,106	6,000	7,896	4,900	5,450	860	1,394	
국비										
도비	8,896		8,896		1,896	2,000	5,000			
군비	17,604		16,210	6,000	6,000	2,900	450	860	1,394	
기타										

- 청평면 9,860백만원, 조종면 8,210백만원, 설악면 8,430백만원

○ 사업내용

- 실내 영유아·복합시설 건립(모험·창의 체험공간 및 놀이문화 조성)
- 사회재난 및 자연재난에 대비한 어린이 안전체험교실 구축

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	35
2022 하반기	어린이 놀이체험시설 조성 계획 수립	· 어린이 놀이체험시설 조성 총괄 계획수립	5	5
2023	청평·조종권역 놀이체험 시설 조성 계획 수립 및 건축설계용역 착수	· 청평·조종권역 어린이 놀이체험시설 추진계획 수립 · 청평·조종권역 어린이 놀이체험시설 조성 사전행정절차 이행 및 설계 공모 · 청평·조종권역 어린이 놀이체험시설 건축설계 및 전시물 제작 설치 착수	30	20
2024	청평·조종권역 놀이체험시설 설계	· 청평·조종권역 어린이 체험시설 - 설계공모 공고 및 심사위원회 실시 - 건축설계용역 착수(2024.10.)	30	10
	설악권역 놀이체험시설 조성 계획 수립	· 설악권역 어린이 놀이체험시설 - 부지선정 및 추진계획 수립, 부지매입 - 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축위원회 심의(2024.12.)		
2025	청평·조종권역 놀이체험시설 착공	· 청평·조종권역 설계용역 완료 - 공사착공 및 준공(2025. 5. ~ 2026.10.) - 설계공모 및 건축설계 및 전시물 제작·설치 용역 착수, 완료	25	
2026 상반기	청평·조종권역 놀이체험시설 준공	· 청평·조종권역 어린이 체험시설 - 공사 준공(2026.10.)	10	
	설악권역 놀이체험시설 준공	· 설악권역 어린이 실내놀이체험시설 - 공사 착공 및 준공(2026. 1. ~ 2027. 6.)		

□ 추진실적

- 2022. 8.10.: 설악면, 조종면 권역 어린이 놀이체험시설 조성계획 방침결재 완료
- 2022. 9.30.: 민선8기 공약사업 실천계획 확정(청평역 역세권 활성화 공약사업과 통합)
- 2023. 4.18.: 타시군 우수 놀이체험시설 선진지 견학(경기도 시흥시)
- 2023. 5.10.: 타시군 우수 놀이체험시설 선진지 견학(경기도 오산시, 양평군)
- 2023. 8. 7.: 어린이가 꿈꾸는 놀이체험시설 조성을 위한 그림 그리기행사 개최
- 청평권역 어린이 놀이체험시설 조성사업
 - 2022.10.31.: 청평 어린이 놀이체험시설 조성계획 수립
 - 2022.11. 3.: 공유재산심의회 승인
 - 2022.11. 9.: 지방재정투자심사 승인
 - 2022.12.16.: 공유재산 관리계획안 승인
 - 2023. 3. 7.: 건축서비스법에 따른 사전검토 절차 이행을 위한 건축기획용역 착수
 - 2023. 6. 1.: 청평 어린이 놀이체험시설 조성 사업설명회 개최
 - 2023. 6.19.: 공공건축 사업계획 사전검토
 - 2023.12.11.: 청평7080 유희부지 활용계획 보고 및 기본계획수립용역 완료
 - 2023.12.27.: 설계공모 계약의뢰

- 2023.12.28.: 건축기획용역 완료
- 2024. 1. 9.: 설계공모 공고
- 2024. 3.22.: 작품 심사결과 발표 및 업체 선정
- 2024. 4. 4.: 실시설계용역 착수
- 조종권역 어린이 놀이체험시설 조성사업
 - 2023. 1.17.: 조종 어린이 놀이체험시설 조성계획 수립
 - 2023. 2.17.: 공유재산심의회 승인
 - 2023. 3. 8.: 지방재정투자심사 승인
 - 2023. 4. 4.: 공유재산 관리계획안 승인
 - 2023. 5. 3.: 건축서비스법에 따른 사전검토 절차 이행을 위한 건축기획용역 착수
 - 2023. 7.12.: 조종 어린이 놀이체험시설 조성 사업설명회 개최
 - 2023. 8.21.: 공공건축 사업계획 사전검토
 - 2023. 9. 5.: 경기주택도시공사 공공건설지원센터 현장 방문
 - 2023.10.13.: 공공건설지원센터 사전검토의견서 회신
 - 2024. 3.29.: 조종권역 어린이놀이체험시설 조성계획 변경(사업비 증액)
 - 2024. 4.15.: 공공건축심의위원회 심의 완료
 - 2024. 5.12.: 건축기획용역 완료
 - 2024. 6.21.: 공유재산관리계획안(변경) 승인
- 설악권역 어린이 놀이체험시설 조성사업
 - 2024. 1. ~ 3.: 설악권역 어린이 놀이체험시설 건립부지 현장조사
 - 2024. 4.18.: 건립계획 수립
 - 2024. 6.21.: 공유재산관리계획안 승인

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 조종권역 어린이 놀이체험시설 조성사업
 - 2024. 7. ~ 9.: 설계공모 공고 및 심사위원회 실시
 - 2024.10. ~ 2025. 4.: 건축설계용역 착수 및 완료
 - 2025. 5. ~ 2026.10.: 공사 착공 및 준공
- 청평권역 어린이 놀이체험시설 조성사업
 - 2024. 4. ~ 11.: 건축설계용역 착수 및 완료
 - 2024.12. ~ 2026. 6.: 공사 착공 및 준공

○ 설악권역 어린이 놀이체험시설 조성사업

- 2024. 9.: 제2회 추가경정예산 편성 및 건축기획용역 발주
 - ※ 건축기획용역 예산편성으로 사전절차 이행 조기 추진 및 2025년 인구소멸대응기금 및 특별교부세 등 국도비 우선 확보 노력
- 2024.12.: 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축위원회 심의
- 2025. 1.: 설계공모 공고
- 2025. 3. ~ 10.: 건축설계 및 전시물 제작·설치 용역 착수 및 완료
- 2025.12. ~ 2027. 6.: 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

- 어린이가 마음껏 뛰어 놀 수 있는 안전한 공간을 마련하여
주인의식 성장과 지역에 대한 애정으로 질 좋은 양육환경 조성
- 권역별 어린이 놀이체험시설 건립으로 가평읍에 치우쳐진 문화공간에 대한 지역격차를 해소하여
아동의 놀 권리 보장 및 아동의 행복지수를 향상시키는 건전한 놀이문화 조성에 기여

약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

행복한 가정을 위한 아이돌보미사업 확대

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
II-4	복지	지역문화는 더 다채롭게	가평군	계속	단기	임기 내
추진부서	행정복지국	행복돌봄과	여성가족팀장	최윤정(2260)	담당자	윤다솔(2261)
추진현황	■완료 □이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 저출산·고령사회화의 심화로 군지역 인구비중이 1975년 25.1%에서 2015년 8.3%로 급감함에 따라, 우리군은 아이돌봄 본인부담금 지원 사업을 확대하여 건강한 양육환경을 조성하여 저출산 문제에 대응하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. 1. ~ 계속
- 지원대상: 가평군 아이돌봄서비스 이용 가구
- 사업규모: 480가구/연
- 소요예산: 500백만원 ※ 확보예산: 총100백만원 (23년: 100)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	500		400		100	100	100	100	100	
국비										
도비										
군비	500		400		100	100	100	100	100	
기타										

○ 사업내용

- 우리군은 ‘가평군 아이돌봄서비스 지원’ 사업을 통하여 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정에 아이돌보미가 찾아가는 돌봄서비스를 제공하는 ‘아이돌봄 지원사업’을 이용하는 관내 이용자의 본인부담금 전부 또는 일부를 군비로 지원함
- 이에 우리군은 저출산에 대응하기 위한 맞춤형 인구정책으로 ‘가평군 아이돌봄서비스 지원’ 사업의 본인부담금 지원율 상향(일반가정 50%→60%)을 통하여 인구소멸 위기에 대응하고자 함

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022. 9.	기본계획 수립 및 협의 추진	· 시행계획 수립 · 조례 개정안 작성	20	20
2022.11.	방침 결재	· 조례 개정 방침 결재 및 입법예고 · 사회보장 변경협의(보건복지부)	20	20
2022.12.	조례 개정	· 사회보장 변경협의(보건복지부) 완료	30	30
2023. 5.	사업 시행	· 조례 개정 심의 완료 후 공포 · '가평군 아이돌봄서비스 지원' 확대 시행	30	30

□ 추진실적

- 2022. 8.10.: 아이돌보미 사업 확대 추진계획 수립
- 2022.11. 3.: 조례 개정 관련 부서 협의 완료
- 2022.11. 4.: 사회보장제도 변경 협의 요청(보건복지부)
- 2022.11.22.: 「가평군 아이돌봄서비스 지원」 조례 일부개정 방침 결재
- 2022.12.19.: 「가평군 아이돌봄서비스 지원」 조례 일부개정(안) 입법예고 완료(의견없음)
- 2022.12.20.: 사회보장제도 변경 협의 결과 회신(협의 완료)
- 2023. 3.27.: 제313회 가평군의회 임시회 안건 상정
- 2023. 4.12.: 조례 공포
- 2023. 5. 1.: 아이돌봄본인부담금 확대 시행

□ 추진상 문제점 및 대책

- 없음

□ 향후계획

- 보도자료 등을 통한 적극적인 사업 홍보

□ 기대효과

- 양육 부담의 완화를 통해 일과 가정의 양립을 도모하고, 건강한 양육 환경 조성을 통하여 자녀 출산의 부담을 경감하여 저출산 문제에 적극적으로 대응

약속Ⅵ 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

보조기기 수리센터 운영

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅵ-2	복지	주민안전은 더 세심하게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	행정복지국	행복돌봄과	장애인복지팀장	이정아(2225)	담당자	손다은(2227)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 100%

□ 추진방향

- 장애인 등이 보조기기를 활용하는데 어려움이 없도록 적절한 수리서비스 제공 및 소득수준에 따른 수리비용 지원
- 2021년 10월부터 보조기기 수리업체를 지정하여 운영 중에 있음에 따라 향후 수리 센터의 효율적 운영과 관리를 위하여 연간 수리실적 및 수요추세에 따라 단계별 운영형태 결정 및 사업추진
 - ‘21. 8. 4.제정된 「가평군 장애인·노인 등을 위한 보조기기 수리비용 지원 조례」에 따라 ‘사단법인 경기도지체장애인협회 가평군지회(대표자 김영수)’를 보조기기 수리업체로 지정하여 운영 중에 있음

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 가평군
- 사업규모: 1개소
- 소요예산: 420백만원 ※ 확보예산: 총 111백만원(22년: 11, 23년: 15, 24년: 85)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	420	4	336	11	15	85	145	80	80	
국비										
도비										
군비	420	4	336	11	15	85	145	80	80	
기타										

○ 사업내용

- 보조기기 수리센터 운영 지원
- 장애인, 노인, 국가유공자 보조기기 수리비용 지원

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	100
2022 하반기	수리업체 운영 지원 및 수리업체 지정	· ‘22. 7.~‘22.12. 수리업체 운영 및 수리비용 지원 · ‘22.11.~‘22.12. 수리업체 지정절차 추진(공개모집)	10	10
2023 ~ 2024	수리업체 운영 지원 및 운영형태 결정	· ‘23. 1.~‘24.12. 수리업체 운영 및 수리비용 지원 · ‘23.10.~‘24. 2. 사업추진 성과 검토 · ‘24. 3.~‘24. 4. 센터 운영형태 결정 (센터 설치·위탁 또는 업체 지정) · ‘24. 5.~‘24. 8. 센터 운영 및 지원을 위한 조례개정	60	60
2025 ~ 2026	수리센터 위탁 운영 또는 수리업체 지원	· ‘25. 1.~‘26. 6. 센터 운영 또는 업체 운영 지원 · ‘25. 1.~‘26. 6. 보조기기 수리비용 지원	30	30

□ 추진실적

- 22.12.30. 보조기기 수리업체 지정
 - 지정기간: 2023. 1. ~ 2024.12. / 2년
 - 지정업체: 사단법인 경기도지체장애인협회 가평군지회(대표자 김영수)
- 보조기기 수리업체를 통한 보조기기 수리 지원

(단위: 천원)

기 간	계	‘22. 7. ~ ‘22.12.	‘23. 1. ~ 12.	‘24. 1. ~ 6.
수리건수	284건	34건	113건	137건
수리비	29,574	4,320	14,705	10,549
수리비 총액 (본인부담금 포함)	42,876	6,144	22,095	14,637

- 관련 조례(가평군 장애인·노인 등을 위한 보조기기 수리비용 지원 조례) 일부개정 추진
 - 23. 6.13.: 일부개정 계획 수립
 - 보조기기 수리서비스 제공기관 명칭 변경(수리업체 → 수리센터)
 - 보조기기 수리센터에 필요한 경비의 지원 근거 명시
 - 23. 6.22.: 일부개정 방침 결재
 - 23. 6.26.: 입법예고 및 의견 수렴(2023. 7. 16.까지)
 - 23. 7.28.: 지방보조금관리위원회 심의
 - 23. 9.20.: 조례규칙심의회 심의
 - 23.10.13.: 의회 의결
 - 23.11. 8.: 조례 공포
 - 23.10. ~ 12.: 보조기기 수리센터 운영지원 2024년 본예산 편성 요구
 - 2024년 본예산: 85백만원(인건비 2명 60백만원, 운영비 10백만원, 수리비 15백만원)
 - 24. 2. 1.: 보조기기 수리센터 운영인력 채용: 2명 (총무 1명, 수리기사 1명)

- 24. 3.: 보조기기 수리센터 1분기 운영 보조금 교부
- 24. 4.: 보조기기 수리 관리시스템 도입
- 24. 4.: 보조기기 수리센터 2분기 운영 보조금 교부

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 2024.10.: 보조기기 수리센터 정기 지도·점검 실시
- 2024.10. ~ 12.: 2025년 보조기기 수리업체 지정 절차 추진
- 2025. ~ 2026.: 보조기기 수리센터 운영 및 수리비용 계속 지원

□ 기대효과

- 가평군에 거주하는 장애인·노인 등이 보조기기를 편리하고 안전하게 사용함으로써 삶의 질이 향상될 수 있는 기반 마련

일 자 리 정 책 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
3개 사업						44.3%	
I -1	지역성장을 위한 청정산업단지 기반조성	가평군 민간	신규	2028 (임기외)	정상추진	30	
I -3	가평 2030 청년 지원(눈높이 청년복지)	가평군	계속	2026 (임기내)	정상추진	60	
I -5	일자리 창출 (다문화, 군인가족, 경력단절 여성 등)	가평군	계속	2026 (임기내)	정상추진	43	

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

지역성장을 위한 청정산업단지 기반조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-1	경제	군민생활은 더 풍요롭게	가평군·민간	신규	중기	임기 외
추진부서	경제산업국	일자리정책과	기업지원팀장	박정일(2275)	담당자	김정욱(2277)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	30%

□ 추진방향

- 지역성장 기반 마련을 위한 청정산업단지 조성 사업 추진
- 실수요자 중심으로 첨단 및 바이오 산업 위주의 친환경 업종을 우선 배치
- 기 추진 중인 사업과 연계하여 순차적으로 추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2028.
- 사업위치: 관내 2개소(상면 태봉리 105번지 일원, 설악면 창의리 214-1 일원)
- 사업규모: 일반산업단지 2개
- 소요예산: 13,730백만원 ※ 확보예산: 없음

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	13,730		13,730			530	6,600	6,600		
국비										
도비										
군비	13,730		13,730			530	6,600	6,600		
기타										

※ 민간개발(설악면) : 132억원(예정)

○ 사업내용

- 상면 일반산업단지: 1개소(제조업, 첨단 중심) / 공영개발 / 약137억원
- 설악면 일반산업단지: 1개소(바이오, 의료 중심) / 공영 또는 민간개발 / 약132억원

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	30
2022 하반기	[상면] 산업단지 지정계획 반영	· [상면] 산업단지 지정계획 작성 및 제출(심의)	10	10
2023	[상면] 산업단지 공동추진 협의	· [상면] 경기주택도시공사(균형발전처) 실무협의 · [설악면] 산업단지 입주수요조사 용역 예산 확보	10	10
2024	[상면] 업무협약 체결 [설악면] 산업단지 지정계획 반영	· [상면] 가평군-경기주택도시공사 업무협약 체결, 산업단지계획 수립 용역 · [설악면] 산업단지 입주수요조사 용역, 산업단지 지정계획 반영	20	10
2025	[상면] 산업단지계획 승인 [설악면] 산업단지계획 수립	· [상면] 산업단지계획 심의(도, 국토부) 및 고시, 공사 착공 · [설악면] 민간사업자 공모 및 선정, 산업단지계획 수립 용역	30	
2026 상반기	[상면] 공사 준공	· [상면] 공사 준공 · [설악면] 산업단지계획 심의(도, 국토부) 및 고시, 공사 착공	30	
2028	[설악면] 공사 준공	· [설악면] 공사 준공		

□ 추진실적

○ 2권역(상면, 조종면)

- 2022.12. 7.: 산업단지 지정계획 조정회의(결과:반영)
- 2023. 1. 5.: 산업단지 지정계획 고시
- 2023. 1.26.: 산업단지 조성 관련 경기주택도시공사와 업무협의(입주수요 확보 방안 협의)
- 2023. 2. 9.: 경기주택도시공사 방문 2차 업무협의(상면 일반산업단지 조성사업 신속 추진 요청)
- 2023. 2.24.: 경기주택도시공사 방문 3차 업무협의(입주수요용역 추진 방안 협의)
- ☞ GH 자체 입주수요조사 용역 추진('23. 3. ~ 6.)
- 2023. 4.12.: 일반산업단지 조성사업 공동추진을 위한 GH 업무협의
- 2023. 5. 9.: 일반산업단지 조성사업 공동추진을 위한 타 지자체 벤치마킹(양평군청)
- 2023. 6.21.: 일반산업단지 공동추진을 위한 GH 업무협의(관내 업체 입주의향서 모집 요청)
- 2023. 6.: (관내 기업체 방문) 산업단지 조성계획 안내 및 입주의향서 모집(12개 업체)
- 2023. 8. ~ 12.: GH(경기주택도시공사), 경기도형 산업단지 융복합 모델 및 추진전략 수립 용역* 추진
*계획하고 있는 전체 신규 산업단지를 대상으로 경쟁력 강화 및 균형발전 등 타당성 검토 용역
- 2023. 9. ~ 2024. 5. 상면 산업단지 공동추진 관련 경기주택도시공사 업무협의(6회)
- 2023.10. 6.: 가평군수-경기주택도시공사 이사장 면담(공동추진 건의)
- 2023. 8. ~ 2024.10.: GH(경기주택도시공사), 경기도형 산업단지 융복합 모델 및 추진전략 수립 용역* 추진
*계획하고 있는 전체 신규 산업단지를 대상으로 경쟁력 강화 및 균형발전 등 타당성 검토 용역
- 2024. 2. ~ 경기주택도시공사 사장 방문 업무협의 등

○ 3권역(가평 설악면 일반산업단지)

- 2023. 9. ~ 12.: 산업단지 입주수요조사 용역 예산 확보(30백만원)
- 2024. 1. ~ 5.: 산업단지 용역 방향 및 과업 관련 용역사 미팅(5회)
- 2024. 3.18.: 산업단지 입주수요조사 용역 착수
- 2024. 3.: 산업단지 입지관련 경기도 산업입지와 업무협의
- 2024. 5.: 민간사업시행 관심 업체 면담

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 신규 산업단지 조성 시 장기간 많은 예산이 소요되기 때문에 군 재정부담 증가

- 군 예산 부담을 최소화 하고 효율적인 산업단지 조성사업 추진을 위해

경기주택도시공사와 공동추진(상면) 및 민간사업자 공모(설악면) 등의 방식으로 추진

□ 향후계획

[상면 일반산업단지]

- 2024. 하반기 : 경기주택도시공사와 공동추진을 위한 업무협약 체결
- 2023. 8. ~ 2024.12. : 예정하고 있는 모든 신규 산업단지 조성 사업을 대상으로 “경기도형 산업단지 융복합모델 및 추진전략 용역(경기주택도시공사에서 추진 중)
- 경기주택도시공사 용역 완료 후 세부 추진일정 및 역할 분담 사항 결정하여 협약체결
- 산업단지계획(안) 수립 : 500백만원
 - * 산업단지계획(안) 및 제영향평가(전략환경, 재해, 교통, 경관 등) 용역 실시
 - * 관계부서 협의 및 주민설명회 실시(산업단지계획 및 제영향평가 설명, 주민의견 수렴 등)
- 2025 : 산업단지 조성에 따른 분담 사업비 확보
 - ※ (GH안) “가평 상면 일반산업단지 사업화방안 검토 보고서(GH)”의 진입도로 분담비 89억원
- 2025 : 산업단지계획심의위원회 및 수도권정비위원회 심의
- 2026 ~ 2028 : 공사 착공 및 준공

[설악면 일반산업단지]

- 2024. 3. ~ 9. : 산업단지 입주기업 수요조사 용역 : 30백만원(추진 중)
 - ※ (용역기간 연장) 입주기업의 기존 유치 대상업종(바이오 및 첨단) 이외의 업종 및 지역에 대한 수요조사, 타 지자체 사례조사 및 인근 지자체 기업들의 이전동향 조사 추가
- 2024. 하반기 : 경기도 산업입지과와 입지관련 협의(계속)
- 2024. 하반기 : 민간개발사업 시행 관심 기업과 입지관련 협의(계속)
- 2025 : 산업단지 물량배정(국토부 → 지자체)
- 2025 : 민간사업자 공모 및 선정
- 2025 : 산업단지 지정 계획 반영
- 2026 : 산업단지계획 수립 용역 및 제영향평가 추진
- 2027 : 산업단지계획심의위원회 및 수도권정비위원회 심의
- 2027 ~ 2028 : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

- 지역성장 및 균형 발전을 위한 산업 기반 조성 마련
- 고용창출을 통한 인구 증대 효과 등

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

가평 2030 청년 지원 (눈높이 청년복지)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-3	경제	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	일자리정책과	청년팀장	임미경(2951)	담당자	김우식(4169)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 60%

□ 추진방향

- 청년에게는 안정적이고 장기적인 직업생활을 유도하여 지역에 정착할 수 있는 기반 마련
- 기업에는 다양한 역량을 가진 인력 지원을 통한 일자리 창출
- 인구감소, 청년유출 등으로 어려움을 겪고 있는 지역에 청년 유입을 통해 활력 제고

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업규모: 매년 약 3~10명(20명)
- 소요예산: 2,160백만원(3,794백만원) ※ 확보예산: 총 958백만원(22년: 478, 23년: 480)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	2,160		2,160	478	480	463	463	276		
국비	1,057		1,057	239	236	236	236	110		
도비	262		262	61	57	57	57	30		
군비	661		661	142	151	134	134	100		
기타	180		180	36	36	36	36	36		

※ 기타: 인건비, 인센티브 지원에 대한 기업 자부담 금액

※ 작성대상: 지역주도형 청년일자리사업(보조, 자체, 교통비지원), 청년 면접 지원 사업

○ 사업내용

- 미취업 청년 채용 시 인건비 및 교육컨설팅 지원(1인 월 최대 180만원(인건비의 90%) 2년간 지원)
- 2년 지원 종료 후 정규직으로 계속 근무 시 인센티브 1,000만원 분기별(250만원) 지급
- 참여자 역량강화 교육 및 컨설팅, 네트워킹 지원, 참여자 교통비 지원 사업 등
- 청년 면접 지원 사업

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	60
2022	국·도비 예산 확보 등	· 2023년 예산 확보 및 사업 계획 수립 등	10	10
2023	국·도비 예산 확보 등 (당초 청년일자리 창출)	· 2023년 사업 참여자 모집, 선발 및 보조금 지원 · 2024년 사업 계획 수립 등 · 2025년까지 보조금, 인센티브 지원예산 확보	30	30
2024	청년일자리 창출	· 2024년 사업 참여자 모집, 선발 및 보조금 지원 · 2025년 사업 계획 수립 등 · 2026년까지 보조금, 인센티브 지원예산 확보	30	20
2025	청년일자리 창출	· 2026년 사업 계획 수립 등 · 기 청년일자리사업 참여자에 대한 보조금 지급	20	
2026 상반기	청년일자리 창출	· 기 청년일자리사업 참여자에 대한 보조금 지급	10	

□ 추진실적

- 2024. 2/4분기: 2024년 청년 일자리 사업 정상 추진
- 청년일자리 사업: 2024년 국·도비, 자체 예산 확보(170,385천원)
 - 2023. 3월: 사업 참여자 모집·심사 및 청년-기업 매칭·선발 완료
 - 2023. 6월: 지역주도형 청년일자리사업 참여자 역량강화 교육 실시
 - 2023.12월: 보조금 지급(157건/ 279,033천원), 인센티브 지원(32건/ 80,000천원)
 - 2024. 1월~6월: 보조금 지급(14건/ 25,159천원), 인센티브 지원(17건/ 42,500천원)
- 청년 인턴십 지원사업: 2024년 지방소별대응기금(광역계정) 확보(52,000천원)
 - 2024. 1월: 청년인턴십 추진 계획 수립
 - 2024. 2월: 기업-청년 모집 공고 및 선정(기업 3곳 - 청년 4명 매칭)
 - 2024. 3월: 인턴십 협약 체결
 - 2024. 4월~: 인턴십 근무 및 보조금 지급(8건/10,400천원)
- 청년 면접 지원 사업: 2023년 자체 예산 확보(9,000천원)
 - 2023. 2월: 관련 부처(보건복지부)에 사회보장제도 신설 협의 완료
 - 2023.12월: 사업홍보 실시 및 보조금 지급(8건 / 389천원)
 - 2024. 3월: 청년 면접정장 대여비 지원사업 확대 추진(사회보장제도 협의 완료)
 - 2024. 4월~: 확대 추진 사업 홍보·참여자 지원
 - (정장 대여비 => 정장대여비, 증명사진, 헤어·메이크업 지원)
 - 관내 사진관, 면접 실시기관 및 유관기관 등 방문 홍보

- 지역주도형 청년일자리 사업 참여자 교통비 지원 사업
 - 2023.12월까지: 보조금 지급(26명 / 7,700천원)
 - 2024. 3월까지: 보조금 지급(5명 / 550천원)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 지역주도형 청년 일자리(국도비사업) 일몰로 2024년부터 신규 참여자 모집 중단
 - 기존 사업 참여자 2026년까지 보조금 지급

□ 향후계획

- 청년일자리 사업
 - 2024. 1월 ~: 지역주도형 청년일자리 사업 대상자 보조금, 인센티브 및 교통비 지급
 - 2024. 4월 ~: 청년 인턴십 지원 사업 대상자 보조금 지급
- 청년 면접 지원 사업
 - 2024. 1월 ~: 사업계획 수립 및 홍보·참여자 지원
 - 2024. 4월 ~: 사업 홍보 및 참여자 지원(보조금 지급)
 - 2024. 7월 ~: 하반기 실시하는 관내 기관 면접 시 협조요청 후 방문 홍보 예정
- 청년 역량강화 기회 지원 사업(어학·자격시험 응시료 지원)
 - 2024. 1월 ~: 상반기 지원 대상자 응시료 지원
 - 2024. 5월 ~: 청년 역량강화 기회 지원 사업 확대 추진
 - (신청기간): 상·하반기 2회(각 2개월) -> 통합신청(5월 ~ 11월)
 - (지원내용): 어학·자격시험 응시료 지원 -> 어학·자격시험 응시료 및 수강료 지원

□ 기대효과

- 청년에게 근로소득의 기회를 제공하여 삶의 질 향상 및 생활안정을 도모함

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

일자리 창출 (다문화, 군인가족, 경력단절 여성 등)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-5	경제	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	일자리정책과	일자리정책팀장	정선기(2270)	담당자	박현화(2274)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	43%

□ 추진방향

- 관내 다문화, 군인가족 및 경력단절 여성의 지역 특수성을 고려한 맞춤형 취업 지원 및 일자리 창출 대책 마련
- 취업상담 운영을 통한 취업교육 프로그램 수요 파악, 일자리 상담, 취업알선 및 연계 등 one-stop 취업 서비스 제공
- 「2022 가평군 일자리인식 실태조사」분석에 따른 경력단절여성의 일자리 수요 반영

□ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업규모: 「가평군 일자리박람회」연 1회, 「권역별 채용박람회」연 3회, 군인가족(경력단절 여성) 맞춤형 자격증 취득과정 교육 연 2회, 읍·면별 찾아가는 일자리 이동상담소 연 9회
- 소요예산: 480백만원 ※ 확보예산: 총 164백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	480		374		81	83	105	105	105	
국비										
도비										
군비	480		374		81	83	105	105	105	
기타										

○ 사업내용

1) 「가평군 일자리박람회」

• 추진방향

- 경력단절 여성의 취업장애 요인을 반영한 각종 육아 지원사업 연계 추진
- 유연근무·선택적 근무시간제 가능 구인업체 집중 모집 및 참여 유도
- 여성 계층별 특성을 반영한 구인업체 발굴로 미스매치 해소

- 추진규모: 연 1회(2023. ~ 2026.)
- 소요예산: 35백만원
- 추진 장소: 가평 한석봉 체육관
- 대상: 관내 구직자 및 구인업체 300여명
- 추진내용
 - 사전알선을 통한 1:1 현장면접 및 구직상담
 - 이력서 작성 및 간접참여업체 입사지원 대행 서비스 제공
 - 부대행사 진행
- 협업추진
 - (행복돌봄과) 아이돌봄지원 사업 및 가족지원 프로그램 안내·연계
 - (가평군건강가정·다문화가족지원센터) 다문화가족지원센터 다문화 여성 취업 교육 수료생 취업연계를 위한 구인·구직 사전 수요조사 및 취업알선
 - (여성새일센터) 여성새일센터 구인·구직자 사전알선, 현장면접 및 구직상담

2) 「권역별 채용박람회」

- 추진방향
 - 당초 상반기로 계획하였던 「대규모 취업박람회」 개최 시기를 연중 구인구직이 활발한 하반기(9월)로 일정 변경함에 따라 「중규모 취업박람회」를 대체 추진
 - 권역별(가평읍·북면, 설악·청평면, 상·조종면) 운영으로 특성에 맞는 취업 연계 추진
- 추진규모: 상반기 권역별 3회(2023. ~ 2026.)
- 소요예산: 10백만원
- 추진장소: 권역별 행정복지센터
- 대상: 관내 구직자 및 구인업체
- 추진내용
 - 1:1 오프라인 현장면접 및 간접업체 지원 대행 서비스 제공
 - 개최시기별 구인 기업체(리조트·숙박·관광 등)을 사전 수요 조사하여 효율성 높은 맞춤형 취업연계 추진
 - 국민취업지원제도 관련 홍보 및 취업연계

3) 다문화, 군인가족, 경력단절 여성 맞춤형 취업지원프로그램 운영

- 추진방향
 - 관내 군인가족 대상 사전 수요 조사를 통한 맞춤형 교육과정 운영
 - 가정·일 양립을 중요시하는 경력단절여성 취업 성향 반영
 - 취업연계가 가능한 실무 역량 중심 발굴·운영

- 추진규모: 연 2회(2023. ~ 2026.)
- 소요예산: 22백만원('23 19백만원)
- 추진장소: 군부대 지정 장소 및 가평군여성비전센터
- 대상: 관내 군인가족 및 경력단절 여성 등 40명 / 회당 20명
- 추진내용
 - 수요 조사 결과 교육과정 선정 및 맞춤형 교육과정 운영
 - 교육 수료자 대상 관내 취업정보 제공 및 취업 적극 연계

4) 읍·면별 찾아가는 일자리 이동상담소 운영

- 추진방향
 - 현장 방문을 통해 여성인력의 취업상담 접근성 향상
 - 군인가족 여성 수요 반응을 위한 상·조종면 지역 거점 취업상담 실시
- 추진규모: 연 9회(2023. ~ 2026.)
- 소요예산: 7.5백만원
- 추진장소: 각 읍·면 행정복지센터 등
- 대상: 관내 다문화·군인가족·경력단절 여성
- 추진내용
 - 설악면, 상·조종면 권역 운영 시 다문화, 군인가족여성 참여 유도 및 중점 추진
 - 구직상담 등 일자리 분야 전반에 대한 상담 지원 및 지속적 정보 제공

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	43
2022 하반기	수요조사 실시 및 결과 바탕 교육과정 선정	· 군인가족 대상 자격증 취득과정 사전 수요조사 실시 (‘22.10월중)	-	-
2023 ~ 2025	다문화·군인가족·경력단절 여성 일자리창출	· 「권역별 채용박람회」 개최(연 3회) · 「가평군 일자리박람회」 개최(연 1회 / 하반기) · 군인가족(경력단절 여성) 맞춤형 자격증 취득과정 운영(연 2회) · 읍·면별 일자리 이동상담소 운영 (연 9회 / 상반기 3회, 하반기 6회)	90	43
2026 상반기		· 군인가족(경력단절 여성) 맞춤형 자격증 취득과정 운영(상반기 1회) · 읍·면별 일자리 이동상담소 운영(상반기 4회)	10	

* 2023.~2025.: 매년 30% 목표 이행 (박람회 개최 10%, [취업지원프로그램](#) 10%, 이동상담소 운영 10%)

□ 추진실적

* 박람회 개최, 취업지원프로그램 운영, 이동상담소 운영 취업연계 추진실적은 사업에 참여한 전 연령·계층으로 함.

○ 2022.10.: 군인가족(경력단절여성) 대상 2023년도 취업프로그램 수요조사 실시

○ 가평군 일자리박람회 개최

• 2023년: 2023. 9.14. 14:00~17:00 / 한석봉체육관

(단위: 명)

참여업체· 구인인원	방문인원 (구직자)	구직등록	2023				2차면접
			직접업체 면접인원	취업실적 채용인원	간접업체 알선인원	취업실적 채용인원	
50개, 215명	550	178	203	7	20	-	103

• 현장사진



○ 권역별 채용박람회 운영

(단위: 명)

구 분	방문인원	구인인원	구직(등록) 인원	현장 면접자	간접 알선	채용결과	
						직·간접 채 용	2차면접
계	426	467	312	326	56	50	132
2023(3회)	178	269	131	138	28	20	54
2024(3회)	248	198	181	188	28	30	78

○ 찾아가는 일자리 이동상담소 운영

(단위: 명, 장)

구분	방문인원	구인등록	구직등록	홍보 리플렛 배부
계	704	12	380	1,201
2023(9회)	538	8	293	911
2024(3회)	166	4	87	290

○ 취업지원프로그램 운영

(단위: 명)

구분		수료인원
계		56
2023	청년층 OA마스터(ITQ자격증) 취득과정	19 (다문화 4)
	다문화, 군인가족, 경력보유여성 취업코칭 교육	19 (다문화 2, 군인가족 3, 경력보유 14)
2024	다문화, 군인가족, 경력보유여성 바리스타 2급 자격증 취득과정	18 (다문화 2, 군인가족 7, 경력보유 9)

□ 추진상 문제점 및 대책

- ‘육아 및 자녀교육 문제’, ‘일·가정 양립이 가능한 일자리 부족’ 등 경력단절여성 취업 장애요인 상존
 - ☞ 군 공공일자리사업 연계 단시간(일 4시간) 일자리 발굴 및 우선 참여 기회(취업취약계층 가점) 부여, 일자리·채용박람회 시 선택적 근무시간제 가능 구인업체 집중 모집 및 참여 유도
- 언어·문화적 한계로 인한 다문화 여성 취업연계 난항
 - ☞ 가평군가족센터와의 연계를 통한 취업알선 및 다문화 여성의 취업가능 구직업체 발굴, 청년 결혼이민자·귀화자의 희망을 고려한 컴퓨터 관련 자격증 교육 운영 등
- 경력단절여성 대상 취업프로그램이 한정된 분야에 치우침
 - ☞ 2023년 취업프로그램을 『군인가족(경력단절)·다문화 취업코칭 교육』 프로그램으로 추진하여 이력서 작성 방법, 면접예절 함양 등 구직활동에 필요한 즉각적이고 실용적인 교육을 통해 실효성 있는 취업역량 강화프로그램 지원
 - ☞ 2023년 취업프로그램 종료 후 만족도평가 실시 및 설문조사 결과를 반영하여 2024년 취업프로그램 추진 시 계층별 선호도가 높고, 관내 구인 수요가 많은 관광·서비스 사업 분야(바리스타 양성 교육 등)의 다양한 취업프로그램 추진
- 취업코칭 프로그램 수료자의 지속적인 취업·알선 연계 실시 및 취업프로그램 홍보·참여 독려

□ 향후계획

- 2024.11월: 청년 다문화·군인가족·경력단절 여성 컴퓨터활용능력 2급 자격증 취득과정 교육 운영
- 2024. 7~12월: 권역별 찾아가는 일자리 이동상담소 운영, 다문화 여성 동행면접 지원 및 맞춤형 취업지원서비스 제공

□ 기대효과

- 다문화·군인가족·경력단절 여성의 직무 역량 강화 및 경제활동 참여 촉진

소 상 공 인 지 원 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
2개 사업						55%	
I -2	소상공인 생존·활력 프로그램 추진	가평군	계속	2026 (임기내)	정상추진	50	
I -4	조종면 전통시장 활성화 지원	가평군	신규	2025 (임기내)	정상추진	60	

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

가평군 소상공인 생존·활력 프로그램 추진

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-2	경제	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	소상공인지원과	소상공인지원팀장 소비자지원팀장	양명자(2205) 김남희(4881)	담당자	정윤숙(2206) 김가영(2953)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	50%

□ 추진방향

- 가평군 소상공인 경영안정 확대지원을 통한 경영위기 극복과 성장 역량강화
- 가평군 소상공인 연합회의 조직성장 및 역량강화를 위해 사업추진계획 단계적 지원

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업대상: 가평군 소상공인
- 사업규모: 경영안정지원사업 7개 내외
- 소요예산: 24,915백만원(21,970백만원) ※ 확보예산: 총 8,481백만원(22년: 4,394, 23년: 4,087)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	24,915		24,915	4,394	4,087	7,646	4,394	4,394		
국비						1,071				
도비	1,988		1,988	269	228	953	269	269		
군비	19,136		19,136	3,445	3,859	4,942	3,445	3,445		
기타	2,270		2,270	680		680	680	680		

※ GP페이 국비 21억, 경영환경 6.5억 증가

○ 사업내용

- 소상공인 경영안정지원사업 지속·확대추진
- 소상공인 연합회 조직성장 지원

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	50
2022 하반기	소상공인 경영위기 극복과 성장역량강화	· 창업 및 노후 점포 경영환경개선사업 · 소상공인 위기극복 자금 지원사업 · 찾아가는 소상공인 매니저 운영사업(완료) · 소상공인 경영컨설팅 지원사업(완료) · 가평군 지역화폐사업 확대 · 공공배달앱 운영 확대	20	20
2023		· 소상공인 경영환경개선사업 · 소상공인 위기극복 자금 지원사업 · 소상공인 홍보 마케팅 지원사업(신규) · 폐업 소상공인 사업정리와 재기지원(신규) · 가평 맛집·멋집 챙겨 투어(신규) · 가평군 지역화폐사업 확대 · 공공배달앱 운영 확대 · 소상공인 연합회 조직성장 지원	20	20
2024		· 소상공인 경영환경개선사업 · 소상공인 홍보 마케팅 지원사업 · 경기도 골목상권 활성화 사업 공모 추진 · 가평 맛집·멋집 챙겨 투어 · 첫 출발 응원 창업 소상공인 지원사업(신규) · 가평군 지역화폐사업 확대 · 공공배달앱 운영 확대 · 소상공인 연합회 조직성장 지원	20	10
2025		· 소상공인 경영안정지원사업 지속 확대추진 · 가평군 지역화폐사업 확대 · 공공배달앱 운영 확대 · 소상공인 연합회 조직성장 지원	20	
2026 상반기		· 소상공인 경영안정지원사업 지속 확대추진 · 가평군 지역화폐사업 확대 · 공공배달앱 운영 확대 · 소상공인 연합회 조직성장 지원	20	

□ 추진실적

○ 소상공인 경영환경개선사업 추진

(2024.6.30. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

연도	예산액	집행액(예정)	접수업체	선정업체	업소당 지원금액
총계	3,224	3,220	1,137	673	최대 500만원 이내
2022	750	746	287	175	
2023	900	900	449	178	
2024	1,574	1,574	401	320	

○ 소상공인 홍보 마케팅 지원사업 추진

(2024.6.30. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

연도	예산액	집행액(예정)	접수업체	선정업체	업소당 지원금액
2023	100	100	135	42	최대 200만원 이내
2024	40	40	59	50	최대 80만원 이내

○ 소상공인 위기극복 경영안정자금 지속·확대지원

- 이자차액 보전 이자율 기존 2% → 3% 상향 지원(2023.1.1. 특례보증부터)
- 이자차액 보전 금융기관 확대(2023.4.12.부터 NH농협, 새마을금고, 가평신용협동조합)
- 「2020년 행정명령대상 영세사업자 특례보증」잔여 출연금 가평군 특례보증 재원 편입: 70백만원

(2024. 6.30. 기준 / 단위: 백만원, 개소)

연도	특례보증		이자보전금(분기별)		신용보증료(2022.4.~)	
	업체	지원액	업체(누적)	지원액	업체	지원액
총계	558	14,212	435	375	509	512
2022	155	4,141		128	108	114
2023	171	4,371	435	154	169	171
2024	232	5,700		93	232	227

○ 2022년 찾아가는 소상공인 매니저 운영(완료)

- 기간: 2022. 6월 ~ 12월
- 내용: 방문 및 상담 165건, 사업 홍보·안내를 위한 소상공인 정보 일제조사 2,593개소

○ 소상공인 경영컨설팅 추진(완료): 「2022년 가평 힐링 맛집 만들기」15개소, 99백만원

○ 가평군 소상공인연합회 조직 성장지원

- 소상공인연합회 사무실 개소 및 매니저 채용으로 상시 운영

○ 2023 경기도 골목상권 공동체 지원사업 공모 선정

- 우수상권 육성 부문 개소당 800만원 지원(어비계곡마을상인회 외 4개소)
- 상인회 간 연합 부문 개소당 2,000만원 지원(백둔리상가번영회 외 1개소)

○ 2023 경기도 골목상권 상인회·연합회 매니저 지원 사업 공모 선정(도비 11,250천원 지원)

○ 2023년 소상공인 동절기 긴급난방비 접수 및 지원 : 3,695업소 / 739백만원

- 지원업소당 지역화폐로 20만원 지원

○ 「2023년 자라섬 꽃 페스타 할인이벤트」 사업추진: 봄 50개소·가을 22개소 진행

- 축제 기간에 유료 입장권 소지자 음식점 방문 시 업소별 할인 적용

○ 2023년 폐업 소상공인 사업정리와 재기지원: 9월 ~ 12월, 75백만원

- 점포철거(원상복구) 및 재창업 지원

- 2024 경기도 골목상권 활성화 사업(신규 및 대학협업) 공모 선정
 - 신규조직화사업: 개소당 2,000만원 지원(1939음악역상인회)
 - 대학협업: 개소당 2,000만원지원(백둔리상가번영회 - 경기대학교)
- 2024 경기도 경기살리기 통큰세일 공모 선정 및 추진 완료
 - 지역연계형: 개소당 5,000만원 지원(가평군농어촌민박협회)
 - 상권독립형: 개소당 500~1,000만원 지원(가평읍상인회, 백둔리상가번영회, 청평호상인회)
- 2024 경기도 브랜드거리 육성사업 공모 선정: 상면상가번영회 (개소당 200백만원)
- 2024년 2/4분기 가평GP페이 연중 발행: 판매량 17,282백만원, 유통량 16,722백만원
- 2024년 2/4분기 공공배달앱 "배달특급" 운영: 거래액 583백만원, 이용건수 20,582건
- 2024년 첫 출발 응원 창업 소상공인 지원 사업: 3월 ~ (사업량 25개소 중 19개소 완료, 6개소 진행중)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 2024 경기도 골목상권 활성화·브랜드거리 육성 사업 예산 편성 및 추진: 9월
- 「2024년 자라섬 꽃 페스타 할인이벤트(가을)」 사업추진: 9월 ~ 10월
- 지역화폐 이용 활성화를 위한 축제·행사·정부지원금 등 신규 시책 발굴 및 지급
- 배달특급 가맹점 및 이용자 프로모션(이용자 쿠폰 지급 등) 확대
- 타부서 교육 또는 행사시 홍보 리플렛 배부를 통한 배달특급 가입 홍보 안내
- 가평 군민의 날 홍보 부스 설치 및 오프라인 캠페인 실시: 10월
- 소상공인의 날 기념식 행사 지원 : 10월
- 군 홈페이지, 군정소식지, SNS 등 매체를 활용하여 배달특급 수시 홍보

□ 기대효과

- 소상공인 경영안정 확대지원을 통한 지속성장 강화와 자립기반 확충
- 경기도 골목상권 활성화 공모사업 추진을 통한 지역경제 발전 도모
- 가평군소상공인연합회 사업추진계획 단계적 지원을 통한 조직성장 및 역량강화

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

조종면 전통시장 활성화 지원

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-4	경제	군민생활은 더 풍요롭게	가평군·민간	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	소상공인지원과	시장관리팀장	김상일(2267)	담당자	이상기(2278)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	60%

□ 추진방향

- 전통시장 상인회 등록 및 전통시장 인정 절차 지원
- 전통시장 공모사업과 직접 지원을 통한 시장 홍보 및 상권 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사업위치: 가평군 조종면 현리 중심상권 일원
- 주요내용
 - 상인회 등록 및 전통시장 인정
 - 시장 홍보물 설치(시장 홍보 상징조형물, 시장안내도) 및 공모사업 추진
- 소요예산: 488백만원(1,171백만원) ※ 확보예산: 총 120백만원('24년)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	488		488			188	300		
국비	150		150				150		
도비	54		54			54			
군비	284		284			134	150		
기타									

- 전통시장 홍보 상징조형물 및 시장안내도 제작·설치: 120백만원(군비 100%)
- 전통시장 공모사업 신청 및 추진
 - 2025년 첫걸음시장지원사업: 300백만원(국비 50%, 군비 50%)
 - ※ 중기부 및 경기도 공모사업 계획에 따라 공모사업 신청연도 등이 변동될 수 있음.

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	60
2022 하반기	상인회 등록 및 전통시장 인정 준비	· (가칭)조종면 전통시장상인회 구성 준비	30	30
2023		· 상인회 등록 및 전통시장 인정	30	30
2024	전통시장 홍보사업 추진 및 경기도 공모사업 신청	· 전통시장 홍보 상징조형물 및 시장안내도 설치 · 전통시장 활성화를 위한 플리마켓 등 행사지원	20	
2025	중소벤처기업부 공모사업 신청	· 첫걸음시장사업 공모사업 신청	20	

- 1) 전통시장 상인회 등록 기준 : 전체 상인의 1/2 이상 또는 100인 이상 동의
 2) 전통시장 인정 기준: 구역 내 상인, 토지 소유자, 건물 소유자 각 1/2 이상 동의

□ 추진실적

- 2023.10.: 상인회 등록 및 전통시장 인정 준비 진행
 - (가칭)조종면전통시장 상인회 설립을 위한 회의 등 개최(6회)
 - 1회: 2022.10. 조종면상가번영회 임원회의
 - 2회: 2023. 1. 조종면상가번영회 정기총회
 - 3회: 2023. 4. 조종면상가번영회 임원 간담회
 - 4회: 2023. 6. 조종면상가번영회 임원회의
 - 5회: 2023. 9. 조종면상가번영회 임원회의
 - 6회: 2023. 9. 조종면상가번영회 임시총회(전통시장 인정 총회 의결)
- 2023.11.16.: 조종시장 인정 및 상인회 등록
- 2024. 1.: 「2024년 경기 전통시장매니저 육성」공모사업 선정 및 시장매니저 채용
- 2024. 2.: 전통시장 활성화 상인교육('24. 3.26. ~ 28.)
- 2024. 3.: 경기도상인연합회「2024년 전략적 마케팅 지원」공모사업 선정
- 2024. 5.: 경기도시장상권진흥원「경기살리기 통큰세일」공모사업 선정
- 2024. 5.: 가평군(문화체육과) 「2024년 피크닉콘서트 및 버스킹」공연(5.9, 6.29)
- 2024. 6.: 조종시장(전통시장), 온누리카드 활성화를 위한 소상공인시장진흥공단-수도기계화
보병사단 업무협약 체결(6.27) [가맹인력 지원, 가입혜택 제공, 사용인증 이벤트 진행]

□ 추진상 문제점 및 대책

- 전통시장 활성화를 위한 플리마켓 등 행사지원
 - '24년 제1회 추경에 민간행사사업보조로 예산편성 미반영되었으나 경기도 보조의
「2024년 전략적 마케팅 지원」, 「경기살리기 통큰세일」 사업으로 추진

□ 향후계획

- 전통시장 홍보 [상징조형물](#) 및 시장안내도 설치: 2024. 5. ~ 2024. 11.
- 전통시장 홍보, 공모사업 등 활성화 지원사업 추진: 2024. ~ 2025.

□ 기대효과

- 전통시장 인정으로 정부 및 도 지원 사업을 활용한 상권 활성화
- 전통시장 상인역량 및 자생력 강화로 지역경제 발전 기여

문 화 체 육 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
5개 사업(폐기 1)						39.5%	
Ⅲ-2	가평 역사박물관 건립	가평군	계속	2028 (임기외)	폐기		
Ⅲ-3	(지역예술인과 함께 하는) 음악역1939 피크닉 콘서트	가평군	신규	2026 (임기내)	정상추진	48	
Ⅵ-3	파크골프장 확충	가평군	신규	2025 (임기내)	정상추진	35	
Ⅵ-4	상면 생활문화체육시설 및 공간조성	가평군	신규	2025 (임기내)	정상추진	20	
Ⅵ-5	설악면 생활문화체육시설 및 주차장 확보	가평군	신규	2025 (임기내)	정상추진	55	

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

가평 역사박물관 건립

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-2	관광	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	장기	임기 외
추진부서	경제산업국	문화체육과	문화예술팀장	-	담당자	-
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☒ 폐기				공정률	-

□ 추진방향

- 공립 박물관이 전무한 가평군에 군민의 역사에 대한 정체성을 확립
- 가평의 역사적 시대 흐름과 인물, 문화, 민속, 산업 등 다양한 분야를 조명하는 박물관 건립
- 가평의 역사인물을 알리고 교육 체험할 공간의 마련

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2028
- 사업위치: 가평읍 대곡리 산25번지 일원
- 사업규모: 부지면적 14,201㎡ / 건축 연면적 3,180㎡(지하 1층, 지상 1층)
- 소요예산: 17,969백만원 ※ 확보예산: 총 200백만원(23년: 200)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	17,969	62	10,339		838	1,934	4,729	2,838	7,568	
국비	5,906		2,953				1,731	1,222	2,953	
도비										
군비	12,063	62	7,386		838	1,934	2,998	1,616	4,615	
기타										

○ 사업내용

- 가평 역사박물관(가칭) 건립
- 박물관 내 역사인물 전용 전시실 설치 및 문화유적 체험을 위한 별도 공간 조성

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	-
2023	문체부 승인완료	· 문화체육관광부 역사박물관 설립 타당성 사전평가 (2023. 7. 29 의뢰, 4~16개월 소요예상)	15	-
2024	사전검토용역	· 1 ~ 8월: 건축기획용역, 사전검토, 공공건축위원회 심의, 투자심사 · 3 ~ 12월: 사업대상부지(군유지) 묘지이장(보상)	15	-
2025	실시설계	· 1 ~ 12월: 설계공모 및 실시설계, 건설기술심사	20	-
2026	공사착공	· 2 ~ 4월: 계약심사 · 5 ~ 12월: 공사착공	30	-
2027 ~2028	공사준공 및 개관	· 27. 1월 ~ 28. 3월 : 공사추진 및 준공 · 28. 6월 : 개관	20	-

□ 추진실적

- 2022. 8. 9.: 추진계획 방침결재 완료
- 2022.12.14.: 가평역사박물관 건립추진위원회 위원 재위촉 및 신규 위촉
- 2022.12.23.: 가평역사박물관 건립추진위원회 전문가 자문
 - 유물 수집 방향 및 범위, 유물 기증자 예우 방안 등
- 2023. 2. 7.: 2023년 유물수집계획 방침결재 완료
- 2023. 2.13.: 가평역사박물관 건립 유물구입 공고
- 2023. 4.11.: 행정사항 이행을 위한 공약사업 기간변경 완료
- 2023. 5. 4.: 가평역사박물관 건립 유물구입 완료(17건 277점)
- 2023. 7.21.: 문화체육관광부 사전 설립협의 완료
- 2023.10.27.: 문화체육관광부 공립박물관 설립타당성 사전평가(부적정)
- 2023.12.26.: 2차 유물구입 완료(12건 31점)
- 2024. 1.12.: 공약사업 제외 군수 방침결재 및 장기과제 전환
- 2024. 3.22.: 민선8기 공약사업 폐기 통보
 - ※ 민선8기 공약이행평가단 공약사업 실천계획 등 변경심의결과 알림 기획예산담당관-6178(2024. 3. 22)호

□ 추진상 문제점

- 가평군 박물관 건립추진위원회: 접근성 부족 우려 (2021년 전문가 자문)
- 문화체육관광부 공립박물관 설립타당성 사전평가결과 부적정 (2023.10.27.)
 - ※ 전문적 별도 조직계획 미흡, 역사박물관 부지 접근성 부족, 소장유물의 다양성 및 수량 부족
- 가평군 시설직 부서장 현장실사 결과 부지 변경 검토의견
 - ※ 테니스장 지붕과 뒤편 임야로 인해 공간조망 부실, 주변시설과의 관련성 부족, 부지 경사도 개선 및 진입공간 확보를 위한 토목·건축공사로 예산 과다 투입 예상

□ 대책

- 현 위치 건립에 대한 부적정 의견이 다수임에 따라 대체 부지 마련절차 및 기본계획 변경 이행을 위한 검토용역 필요에 따라 공약사업 제외 (2024. 1.12. 군수 방침결재, 장기과제 전환 지시)
- 구입 및 기증 등 수집 된 유물의 공개를 통해 박물관건립 필요성을 군민에게 알리고 유물의 효율적 홍보를 위해 가평문화원 내 향토사료관(2층) 운영

【향토사료관 운영】

- 운영시기: 2025. 1월 ~ 박물관 개관 전까지
- 장 소: 가평문화원 향토사료실(2층)
- 운영주체: 가평군 직영
- 인 원: 학예사1, 기간제근로자2
- 공간구성: 유물전시실, 수장고 등
- 운영내용: 소장유물 기획전시, 상설교육, 유물 수집 등

- 소장유물의 다양성 확보를 위한 지속적 구입, 복제, 기증 등 필요

□ 기대효과

- 출토유물과 문화유산의 전시(기획전 포함) 및 이를 활용한 다양한 교육, 체험 행사의 진행으로 군민의 문화적·교육적 욕구충족 및 문화발전 기여

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

(지역예술인과 함께 하는) 음악역1939 피크닉 콘서트

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-3	문화	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국 문화체육과 공연기획팀장 홍복숙(4323)					
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	48%

□ 추진방향

- 지역 예술인들에게 무대에 설 수 있는 기회를 제공함으로써 지역민의 문화예술적 욕구 충족 및 역량강화를 이룸과 동시에 지역 상권 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 3. ~ 2026. 10
- 사업위치: 가평읍 음악역 1939 야외공연장 일원 및 실내공연장 ※ 기상상황에 따른 선별추진
- 사업규모: 야외 공연 1식(년 15회, 월 2~3회)
- 소요예산: 525백만원 ※ 확보예산: 총 150백만원(2023년: 150)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	525		525		150	150	150	75		
국비										
도비										
군비	525		525		150	150	150	75		
기타										

○ 사업내용

- 지역 예술인 및 전문 아티스트 야외 공연(피크닉 분위기 연출)
- 지역 예술인 참여한 출연팀 구성
- 지역 예술인 모집 공고를 통한 인적자원 구성
- 읍·면별 공연 희망일자 및 장소 조사(2월 한)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	48
2023	공연 15회 추진	음악역1939 야외공연장에서 지역 아티스트(당초 주민출연팀) 공연 추진	30	30
2024	공연 15회 추진		30	18
2025	공연 15회 추진		30	
2026	공연 8회 추진		10	

□ 추진실적

- 2022. 8.23.: 추진계획 방침결재 완료
- 2022.12.: 2023년 본예산 반영
- 2023. 3.25: 첫 번째 공연 완료
- 2023. 4. ~ 6.: 잣고을시장 연계 두네토 마켓 공연 진행
- 2023. 5.24.: 상면 임초2리 숲풀이개똥벌레정원 준공식 및 경로잔치 진행
- 2023. 6. 8.: 조종면민의 날 축하 무대 진행
- 2023. 6.30.: 현 12회 공연 완료
- 2023. 9.23.: 잣고을시장 연계 트롯 공연 완료
- 2024. 2.: 용역계약 체결
- 2024. 2.: 실과소 및 읍면 피크닉 공연 수요조사 완료
- 2024. 4. ~ 6.: 음악역1939 잔디광장 등 9회 공연 완료

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 2024. 7. ~ : 음악역1939 잔디광장, 호명호수 등 공연 예정

□ 기대효과

- 음악역1939 내 야외 및 실내 공연장에 관내 지역예술인들이 상설 공연할 수 있는 장소를 제공하여 문화적 역량을 강화하고 가평주민의 문화예술 향유기회 증진

약속VI 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

파크골프장 확충

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
VI-3	체육	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국 문화체육과 문화체육시설팀장 장성세(2510)					
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	35%

□ 추진방향

- 파크골프장 조성으로 문화체육인프라를 확충하여 지역주민 삶의 질 향상
- 생활체육 활성화를 도모하고 군민들의 휴식, 문화 체육활동 등 건전한 여가활동 제공
- 지역별 균형 있는 문화·체육시설인프라 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 사업위치: 가평읍, 청평면, 설악면, 북면
- 사업규모: 파크골프장 4개소(신규3, 확충1)
- 소요예산: 6,970백만원 ※ 확보예산: 총 1,270백만원(24년: 160)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	6,970		6,970		1,110	1,000	4,860		
국비									
도비									
군비	5,970		5,970		110	1,000	4,860		
기타	1,000		1,000		1,000				

※ 청평면 파크골프장 진입로 사업량 증가

○ 사업내용

시설구분	위치	규모	비고
계	4개소		
파크골프장	가평읍 달전리 275번지 일원	18홀	신규
파크골프장	설악면 창의리 501-4	9홀	신규
파크골프장	북면 소법리 627번지 일원	9홀	신규
파크골프장	청평면 대성리 산 2-1번지 일원	27홀	확충

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	35
2022 하반기	사업대상지 선정	· 경제성, 접근성, 인·허가 가능여부 등을 고려한 사업대상지 검토 및 선정	5	5
2023	실시설계	· 파크골프장 3개소(가평, 청평, 설악) 실시설계	20	20
2024	실시설계 및 공사 착공	· 경제성, 접근성, 인·허가 가능여부 등을 고려한 사업대상지 검토 및 선정(북면) · 파크골프장 4개소 실시설계 : 1월~ 10월 · 파크골프장 4개소 공사착공 : 7월~ 12월	35	10
2025	사업완료	· 파크골프장 4개소 공사준공 : 12월	40	

□ 추진실적

- 2022. 7.~ 9.: 사업대상 후보지 현장 확인
- 2022. 9.: 파크골프장 사업대상지 추천 요청(문화체육과→5개 읍·면)
- 2022. 9.: 가평군 파크골프협회 협의
- 2022.11.: 북면 파크골프 및 그라운드골프협회 협의(그라운드 골프장→파크골프장)사업 변경
- 2023. 1.: 원주지방환경청 1차 협의(가평읍·청평면 파크골프장 대상 부지 사전협의)
- 2023. 2.: 원주지방환경청 2차 협의(가평읍·청평면 파크골프장 대상 부지 사전협의)
- 2023. 6.: 가평·청평파크골프장 조성사업 수리검토 및 실시설계용역 착수
- 2023.10.: 설악파크골프장 조성사업 수리검토 및 실시설계용역 착수
- 2024. 2.: 북면 파크골프장 대상지 선정(북면 소법리 627번지 밤섬유원지)
- 2024. 2 ~ 3.: 설악파크골프장 조성사업 인접 토지주 및 야영장 운영인 의견수렴
- 2024. 3.: 원주지방환경청 3차 협의(가평읍·청평면 파크골프장 대상 부지 사전협의)
- 2024. 3.: 가평 파크골프장 조성사업 소규모환경영향평가 용역 착수 및 한수원 부지 사용허가 요청
- 2024. 5.: 가평읍 파크골프장 용역중지(수질오염총량 및 소규모환경영향평가 협의 등 행정 절차 협의)
- 2024. 5.: 청평면 파크골프장 진·출입로 개선관련 도로교통공단 경기도지부 기술지원 요청
- 2024. 5.: 북면 파크골프장 실시설계용역 착수(4개월간)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 청평면 파크골프장
 - ⇒ 진출입로로 신청평대교(가평에서 설악 방향) 진입차선의 초입부분을 일부 사용하고 있으나, 파크골프장 진출입차량과 신청평대교 진입차량 간 교차로 인해 교통사고 발생 우려가 상존하고 있음에 따라

⇒ 청평공공하수처리장 앞의 3지교차로를 4지교차로로 변경하여 진출입로를 확보하고자 교통영향 분석용역을 진행 중에 있고, 용역 검토 사항에 대해 도로교통공단 경기도지부에 기술 지원을 받은 결과 4지 교차로가 타당하다는 자문결과(2024. 6. 13. 완료)에 따라 의정부 국토관리청에 2024. 7월 중 재협의를 의뢰할 계획임

□ 향후계획

- 2024. 7. ~ 2024.12.: 실시설계 및 하천점용 등 행정절차 이행 (가평읍, 청평면, 북면)
- 2024. 7. ~ 2025.12.: 파크골프장 4개소 (가평읍, 설악면, 청평면, 북면) 조성

□ 기대효과

- 파크골프장을 조성하여 군민의 건강증진에 기여함은 물론 건전한 여가활동 제공을 통해 군민의 삶의 질 향상 도모

약속VI 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

상면 생활문화체육시설 및 공간조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
VI-4	체육	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	문화체육과	문화체육시설팀장	장성세(2510)	담당자	이선명(2072)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	20%

추진방향

○ 다목적 생활문화공간 조성으로 양질의 문화 공간 제공을 통한 지역주민의 복지 증진 도모

사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사업위치: 상면 연하리 136-3번지 일원
- 사업용도: 문화센터, 공연장, 체육시설(종합행정타운) 등
- 소요예산: 5,200백만원(보상비 22억원, 시설비 30억원) ※ 확보예산: 총 740백만원(24년: 170)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	5,200	1,070	4,130	430	140	170	3,390		
국비									
도비									
군비	5,200	1,070	4,130	430	140	170	3,390		
기타									

※ 위 사업개요는 농업정책과에서 추진했던 “농촌생활환경조성사업”계획임
○ 사업내용: 지역주민 등으로부터 종합적인 의견수렴을 통해 세부사업 내용 확정 필요

연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	20
2022 하반기	사업대상지 선정	· 시설의 필요성, 수혜도 등을 종합적으로 고려한 세부사업 계획 확정	5	5
2023	토지보상	· 편입토지 손실보상 협의 : 1월 ~ 12월	10	10
2024	실시설계	· 군관리계획 변경 및 실시설계 : 6월 ~ 12월	25	5
2025	공사추진 및 사업완료	· 편입토지 손실보상 협의 : 1월 ~ 3월 · 공사 착공 : 3월 · 공사 준공 : 12월	60	

□ 추진실적

- 2022. 9. 8.: 주민의견 수렴 제출 요청(문화체육과→상면)
- 2022. 9.28.: 주민 회의 개최
- 2023. 2.17.: 주민건의(상면청사신축)에 대한 의견제출 요청(문화체육과→회계과)
- 2023. 3.22.: 편입토지(상면 연하리 136-5번지) 손실보상협의 완료
- 2023. 3.27.: 부서의견 회신(회계과→문화체육과)
- 2023. 9.13.: 편입 물건(상면 연하리 136-5번지, 분묘3기)손실보상협의 요청
- 2024. 4.27.: 편입토지 물건(상면 연하리 136-5번지) 손실보상협의 완료
- 2024. 6.14.: 군관리계획 결정 및 실시설계 용역 의뢰

□ 추진상 문제점 및 대책

- 상면 주민회의 시 노후화된 상면청사 신축 및 복합 문화 공간 조성이 필요하다는 다수의 의견에 따라 관련부서인 회계과에 협의 요청하였으나, 건축물의 내진성능결과 내구연수 미도래로 재건축은 어렵다는 의견으로 회신
- 군·관리계획 결정을 통해 문화센터, 공연장 및 운동시설 설치 등에 대한 위치를 결정한 후 토지보상 및 시설별 세부계획 확정 추진 ※ 면청사 이전 - 별도 검토 추진(회계과)

□ 향후계획

- 2024. 7. ~ 2024.12. : 군관리계획 결정 및 실시설계 용역
- 2025. 1. ~ 2025. 3. : 편입토지 손실보상 협의
- 2025. 3. ~ 2025.12. : 공사 착공 및 준공

□ 기대효과

- 다목적 생활문화공간을 조성하여 양질의 문화공간을 제공하여 군민의 복지증진 및 삶의 질 향상

약속VI 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

설악면 생활문화체육시설 및 주차장 확보

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
VI-5	체육	지역문화는 더 다채롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	문화체육과	문화체육사업팀장	장성세(2510)	담당자	이선명(2072)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	55%

□ 추진방향

- 체육시설 확충을 통한 생활체육 활성화를 도모하고 군민들의 휴식, 문화, 체육활동 등 건전한 여가활동 제공
- 체육시설 이용객의 편의를 위한 주차장 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2025. 12.
- 사업위치: 설악면 선촌리 산34-5번지 일원(설악생활체육공원)
- 사업규모: 체육센터 2개소, 주차장 조성 1식
- 소요예산: 17,300백만원(17,100백만원) ※ 확보예산: 총 3,000백만원(22년: 1,000, 23년: 2,000)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	17,300	12,600	4,700	1,000	2,000	1,200	500		
국비	6,000	4,000	2,000	1,000	1,000				
도비									
군비	11,300	8,600	2,700		1,000	1,200	500		
기타									

○ 사업내용

시설구분	위치	규모	소요사업비(백만원)	비고
계	3개소		17,300	
설악반다비 체육센터	설악면 선촌리 31-4번지 일원	연면적:2,531㎡ (지상3층/1동)	12,800	
설악면 생활형체육센터	설악면 선촌리 32-1번지 일원	연면적:1,268㎡ (지상2층/1동)	2,600	
설악 생활체육공원 주차장 확충사업	설악면 신천리 514-1번지 일원	주차장 조성 4,193㎡	1,900	

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	55
2022 하반기	실시설계 및 공사추진	· 설악 반다비 문화체육센터 착공 : 8월 · 설악 생활형 체육센터 준공 : 12월	20	20
2023	실시설계 및 공사추진	· 설악생활체육공원 주차장 확충사업 실시설계 및 군관리 계획(변경)결정 용역 : 1월 ~ 12월	20	20
2024	공사추진	· 설악 반다비 문화체육센터 준공 : 9월 · (주차장)편입 토지 손실보상 협의 : 9월 ~ 12월	30	15
2025	사업완료	· 설악생활체육공원 주차장 확충사업 착공 : 3월 · 설악생활체육공원 주차장 확충사업 준공 : 12월	30	

□ 추진실적

○ 설악 반다비 문화체육센터

- 2022. 8.22.: 공사착공
- 2022. 8.29.: 주민설명회 개최(1차)
- 2022.10. 6.: 주민설명회 개최(2차)
- 2022.12.28.: 소통회의 개최(민원해소 대책방안)
- 2023. 1.11.: 주민설명회 개최(3차)
- 2023. 1.30.: 설악 반다비 문화체육센터 진입로 개선공사 실시설계용역 착수
- 2023. 3.02.: 주민설명회 개최(4차-진입로개선방안 설명)
- 2023. 3.15.: 공사 재착공
- 2023. 8.10.: 콘크리트파일(말뚝) 시공완료
- 2023.12.22: 동절기 공사 중지
- 2024. 3. 5.: 공사 재착공
- ※ 2024. 6.30. 현재 공정률 : 70% (외벽마감공사완료)

○ 설악면 생활형 국민체육센터

- 2022.11.24.: 준공

○ 설악생활체육공원 주차장 확충사업

- 2022. 7. ~ 9.: 사업대상지 현장확인 및 검토
- 2022. 9.14.: 설악생활체육공원 주차장 확충사업 대상지 수정 건의(설악면→문화체육과)
- 2022.11.14.: 설악면 7개 기관단체장 회의(주차장 확충사업 사업대상지 선정 관련)
- ※ 설악생활체육공원 주차장 확충사업 대상지 변경
(당초 : 선촌리 65-6번지 일원 → 변경 : 신천리 514-1번지 일원)

- 2023. 2.22.: 용역 착수(설악생활체육공원 주차장 조성사업 군관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역)
- 2023. 9. 7.: 주민설명회 개최
- 2023.11. ~ 2024. 6. : 군관리계획 결정(변경) 실무부서 협의 등 행정절차 이행
※ 2024. 6 : 군관리계획 결정(변경) 고시 완료

□ 추진상 문제점 및 대책

- 특이사항 없음

□ 향후계획

- 설악 반다비 문화체육센터
 - 2024. 9.: 공사 준공
- 설악생활체육공원 주차장 확충사업
 - 2024. 7.~ 9. : 실시설계 및 군관리계획(변경) 실시계획인가 용역 이행
 - 2024. 9. ~ 12. : 편입토지 손실보상 협의 추진
 - 2025. 3.: 공사 착공
 - 2025.12.: 공사 준공

□ 기대효과

- 체육시설을 확충하여 군민들의 휴식, 문화, 체육활동 등 건전한 여가활동 제공 및 생활체육 활성화 도모
- 주차장을 확충하여 불법주차 감소를 통한 차량사고 위험을 감소하고 체육공원 이용객의 편의 증진

관 광 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
5개 사업						56%	
Ⅲ-4	운악산 관광레저 단지 조성 (현등사, 운악산 문화관광마을)	가평군	계속	2026 (임기내)	일부추진	40	
Ⅲ-5	밀리터리 콘텐츠 테마파크 조성	가평군	계속	2024 (임기내)	일부추진	25	
Ⅲ-7	신선봉(올업산) 일대 산악관광지 개발 계획 수립	가평군	계속	2023 (임기내)	이행후 계속	100	
Ⅲ-8	북한강 수변 관광특구 지정신청	가평군	계속	2024 (임기내)	정상추진	80	
Ⅲ-11	북한강 천년벚길 조성	가평군	계속	2025 (임기내)	정상추진	35	

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

운악산 관광레저 단지 조성(현등사, 운악산 문화관광마을)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-4	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	관광과	관광시설팀장 관광운영팀장	이범중(4630) 빈혜진(2515)	담당자	안지혜(4633) 신동혁(2517)
추진현황	□완료 □이행후계속 □정상추진 ■일부추진 □보류 □폐기				공정률	40%

□ 추진방향

- 운악리 마을대상 체험관광마을 콘텐츠 확대
- 운악산 경관지역에 출렁다리와 곤돌라를 설치하여 관광 명소화 추진으로 방문객 유치 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2026
- 사업위치: 가평군 조종면 운악리 산162-1번지, 운악산 일원
- 사업규모
 - 공공분야: 운악산 관광마을 조성 (사업비 70억원)
(출렁다리 L=210m, 마을길 환경정비, 마을광장조성 등, 사업기간 2020~2024)
 - 민간분야: 곤돌라 등 조성 / 운악파크(주) (사업비 150억원)
(곤돌라 1,220m, 자연휴양림 조성, 사업기간 2024~2026)
- 소요예산: 22,051백만원 ※ 확보예산: 총 3,661백만원(22년: 811, 23년: 2,000, 24년: 850)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	22,051	3,390	18,661	811	2,000	3,850	3,000	9,000		
국비										
도비	4,858	1,569	3,289	439	2,000	850				
군비	2,193	1,821	372	372						
기타	15,000		15,000			3,000	3,000	9,000		

○ 사업내용

- 공공분야
 - 1단계사업 / 출렁다리 (L=210m, B=1.5m) 및 전망데크 설치공사
 - 2단계사업 / 관광마을 조성공사 1식
 - 마을환경정비 (마을안길 정비, 간판 정비, 안내표지판 정비)
 - 등산로 정비 (매표소~현등사, L=1,770m)

- 마을광장(A=454㎡) 조성 및 화장실, 농산물판매장, 쉼터, 관리실 설치
- 운악교 보도 및 경관조명 설치
- 민간분야
 - 곤돌라(L=1,220m, A=4,876㎡) 설치
 - 하부정거장 : 3,726㎡, 상부정거장: 750㎡, 포스트 4개소: 400㎡
 - 운악산 일원 자연휴양림 조성

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	40
2022 하반기	관광마을 조성(공공)	· 출렁다리 및 전망데크 설치공사 착공	20	20
	곤돌라 설치(민간)	· 곤돌라 시설 인허가	10	
2023	관광마을 조성(공공)	· 출렁다리 및 전망데크 설치공사 준공 · 관광마을 조성공사 착공	20	20
	곤돌라 설치(민간)	· 곤돌라 기초 공사 (공정률 20%)	10	
2024	관광마을 조성(공공)	· 관광마을 조성공사 준공	10	
	곤돌라 설치(민간)	· 곤돌라 정거장 설치 (공정률 50%)	10	
2025	곤돌라 설치(민간)	· 곤돌라 궤도 및 시설물 설치 (공정률 80%)	10	
2026 상반기	곤돌라 설치(민간)	· 곤돌라 전기시설 설치 (공정률 100%)	10	

□ 추진실적

- 2021.12.: 1단계사업(운악산 출렁다리 조성공사) 착공
- 2022. 9.: 출렁다리 운영방안 검토보고
- 2023. 1.: 출렁다리 운영 및 관리조례 제정방침 수립
- 2023. 3.: 출렁다리 전기(가로등) 및 통신(CCTV, 방송설비) 공사 착공
- 2023. 4.: 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 착공
- 2023. 6.: 1단계사업(운악산 출렁다리 조성공사) 준공
- 2023. 7.: 출렁다리 전기(가로등) 공사 준공
- 2023. 7.: 운악산 출렁다리 개통
- 2023.12.: 출렁다리 통신(CCTV, 방송설비) 공사 준공
- 2024. 1.: 동절기 도래에 따른 공사중지(운악산 관광마을 조성공사)
- 2024. 4.: 운악산 관광마을 조성공사 재착공

□ 추진상 문제점 및 대책

- 민간분야 사업(곤돌라 등)에 대한 인허가 협의가 지난하여 사업추진이 지연되고 있는 실정으로 지속적인 협의실시

□ 향후계획

- 2024. 7. ~ 12.: 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 독려 및 행정지원
- 2024. 8: 2단계사업(운악산 관광마을 조성공사) 준공
- 2026. 6.: 민간분야(곤돌라 설치 등) 사업 완료

□ 기대효과

- 조종면 관광거점 생성으로 지역 관광산업 활성화
- 운악산에 새로운 볼거리, 체험거리 조성으로 관광객 유입 증대

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

밀리터리 콘텐츠 테마파크 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-5	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	단기	임기 내
추진부서	경제산업국	관광과	관광운영팀장	빈혜진(2515)	담당자	신동혁(2517)
추진현황	□완료 □이행후계속 □정상추진 ■일부추진 □보류 □폐기					공정률 25%

□ 추진방향

- 관광객의 요구에 전략적으로 대응하기 위한 수용태세 및 콘텐츠 개발
- 밀리터리 테마공원에 국한되지 않고 관광시장의 변화에 대비한 전략 대응
- 테마공원을 중심으로 기존 관광자원과 신규 개발자원, 유망자원들과의 연계개발을 통해 지역경제의 시너지 효과 도모

□ 사업개요

- 사업명: 밀리터리 테마공원 조성사업(문화체육관광부 지원)
- 위치: 가평군 조종면 현리 2-26번지 일원
- 사업량: 85,610㎡(군유지)
 - 공공분야: 기반시설(도로, 주차장 등), 문화시설(한울마당, 초아마당) 휴양시설(공연장, 잔디마당, 전망대 등)
 - 민자분야: 관광사격 및 서바이벌체험장(3,764㎡), 콘텐츠 문화체험장(3,859㎡) ATV바이크체험장(3,199㎡)
- 사업기간: 2014. 1. ~ 2020. 6.
- 사업비: 5,190백만원(국 2,595, 군비 2,595) ※기투자
 - * 공사비 4,981백만원, 토지보상비 209백만원

□ 사업추진계획

- (공원개방) 민자분야인 밀리터리 테마 체험시설이 미조성으로 공원이 미개방 된 상태이나, 지역주민 및 관광객의 휴식 공간 제공을 위해 공원을 개방하고 민자 분야 토지에 대해서는 별도로 콘텐츠 개발 추진
- (토지매각) 민자 유치를 위해 미 조성된 체험시설부지 3개소(관광사격 및 서바이벌체험장 3,764㎡, 콘텐츠 문화체험장 3,859㎡, 유보지 6,500㎡)의 토지를 민간 사업자에게 매각하여 사업의 성공적인 추진 유도
 - 토지 매각 시 공공성 침해 우려 방지를 위한 최소 운영 가이드라인 제시
 - 토지 매각 시 낙찰자 토지사용 제한: 지구단위계획 변경 불허

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	25
2022 하반기	공원개방 및 콘텐츠 검토	· 지역주민이 일상적인 공원으로 이용할 수 있도록 개방 · 콘텐츠 아이디어 발굴 및 투자의향 업체 의견 조회	30	15
2023	민자 유치	· 민간사업부분 토지매각 및 민자유치	50	10
2024	콘텐츠 운영	· 운영준비 및 개시	20	

□ 추진실적

- 2022. 9.19.: 공원개방
- 2022.11.24.~12.22.: 민간운영사업자 공모 (참여업체 없음)
- 2023. 4.24.: 민간운영사업자 유치를 위한 기업체 방문 ((주)제이엠로보틱스)
- 2023. 6.28.: 민간운영사업자 사업제안서 제출 ((주)제이엠로보틱스)
 - 제안내용 : 인공지능 미래체험관, 스마트바이오팜, 글램핑장 조성
- 2023. 12.7.: 민간운영사업자 사업 제안 현안회의 ((주)고려종합건설)
 - 제안내용 : 그린스마트타운 건축 설계

□ 추진상 문제점 및 대책

- 밀리터리 테마공원 민간운영 사업자의 사업제안서 검토 후 시설보완 및 재공모 추진

□ 향후계획

- 운영 방안 강구

□ 기대효과

- 관광인프라가 전무한 조종면 지역의 체험활동, 휴식 레저를 즐길 수 있는 다목적 복합공간의 조성
- 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화에 기여

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

신선봉(울업산) 일대 산악관광지 개발계획 수립

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-7	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	단기	임기 내
추진부서	경제산업국	관광과	관광기획팀장	정경립(2065)	담당자	이상용(2508)
추진현황	☐ 완료 ☒ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 100%

□ 추진방향

- 북한강 천년 뱃길 연계 설악면 산악관광거점 개발 지역경제 활성화 및 지역균형발전 제고
- 신선봉 케이블카 민자유치사업을 통하여 설악면을 산악관광거점으로 개발
 - ※ 민선8기 공약사업으로 울업산 산악관광지와 신선봉 케이블카 사업계획을 수립

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2023.
- 사업위치: 설악면 울업산 일대
- 사업규모: 산악관광지 조성 1식
- 소요예산: 43백만원 / 개발비용(사업예산) 74,000백만원(민자) ※ 확보예산: 없음

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	43	43							
국비									
도비									
군비	43	43							
기타									

○ 사업내용

- 신선봉 산악관광지 기본계획 구상 및 타당성 조사(2022년 학술연구용역)
- 민자투자유치 촉진활동(2023년~2024년)
- 사업추진방식 결정(BTO, BOO 등)
- 산악관광지 1단계 자연체험시설(등산로정비, 산악체험시설 등) 조성
- 산악관광지 2단계 산림어트렉션시설(전망대, 로프웨이, 짚와이어 등) 민자유치

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022	계획 구상 및 타당성 조사	· 기본계획구상 및 타당성 조사 학술연구 분석	30	30
2023	사업추진방식 결정	· 사업 추진방식 결정(BTO, BOO), 자체검토 완료 - 민간투자방식 즉, '민간제안사업'으로 검토	70	70
2024 ~2025	절차 이행	· 행정절차 이행(도시관리계획 등) · 민간사업자 모집		
2026 ~2027	발주 및 시공	· 관광지조성, 궤도(케이블카) 시공 · 준공 및 활용		

□ 추진실적

- 2022. 9.: 산악관광지 개발 목적지 토지 관련 협조(HJ레저개발, 피노키오 이태리 마을)
- 2022. 9.22.: 신선봉 산악관광지 개발 기본계획구상 및 타당성 조사연구 완료
- 2022.11.16.: 신선봉 산악관광지 민자유치 전담직원지정: 1명(관광전문위원)
- 2023. 1.31.: 신선봉 산악관광지 전략사업 대책회의(케이블카 전문가 초청)
- 2023. 3.10.: 신선봉 산악관광 콘텐츠 개발 회의(산악관광 어드벤처 전문가 초청)
- 2023. 5.10.: 신선봉·청평호수 케이블카 설치 민자유치 촉진 활동
- 2023. 6.22.: 신선봉·청평호수 케이블카 설치 민자유치를 위한 협조(HJ레저개발)
- 2023. 7.17.: 신선봉·청평호수 케이블카 사업 민자유치 기업체 제안설명서 검토
- 2023. 8.18. ~ 12.31.: 통일그룹 사업제안 설명을 위한 방문 준비(보류)
- 2023.12.31.: 신선봉(울업산) 일대 산악관광지 개발계획 수립완료
- 2024. 3. 8.: HJ통일재단 한주그룹 방문 신선봉 케이블카 사업 민자투자 설명
- 2024. 5.22.: 경기북부 대개발 관광콘텐츠 보고(경기도)
- 2024. 6.14.: 신선봉 케이블카 사업 민자유치 기업간 협조회의(한주그룹, 삿피프랑스)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 원활한 사업추진을 위하여 토지소유자 등의 민간사업자 참여 독려

□ 향후계획

- 2024. 7. ~ 2025. 6.: 경기도 투자통상과 컨설팅 및 자문
- 2025. 1. ~ 12.: 민간기업 사업제안방식 사업추진 (BOO 방식 등)

□ 기대효과

- 설악면 산악관광지 개발 후 인근 관광지 관광벨트화를 통한 지역경제 활성화
- 북한강 천년벚길과 연계하여 신선봉 산악수상관광 개발 활성화
- 신선봉 지역균형발전으로 설악면민 지역가치 향상 인식 제고

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

북한강 수변 관광특구 지정 신청

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-8	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	단기	임기 내
추진부서	경제산업국	관광과	관광기획팀장	정경립(2065)	담당자	지수정(2098)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 80%

□ 추진방향

- 국내·외 관광환경 변화에 능동적 대응 및 가평군과 춘천시의 상생발전과 관광브랜드 가치 제고
- 관광특구 지정을 통한 관광 가평 이미지 제고 및 외국인 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2020.12.16. ~ 2024. 6.(예정)
- 사업위치: (가평군) 가평군 자라섬 및 가평읍 도심 일원, 달전리~금대리공유수면 (춘천시) 남이섬 및 경강, 강촌 일원, 방하리 일원 공유수면
- 사업규모: 23,568,479㎡(특구 지정)
- 소요예산: 130백만원(군비) ※ 기투자
- 사업내용: 북한강 수변 관광특구 지정

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	80
2022 하반기	관광특구 지정 신청 보완	· 관광특구 지정 신청 보완(경기도)	40	40
2023	관광특구 구역 조정 협의	· 관광특구 구역 조정 협의(춘천시) · 구역 변경에 따른 예산(용역비) 확보	40	40
2024	관광특구 지정 완료	· 경기도-문화체육관광부 협의 완료 · 관광특구 지정 완료	20	

□ 추진실적

- 2022. 8.16.: 관광특구 관련 춘천시 업무협의
 - 신청지역에 대한 용도지역·구역으로 구분하여 도면 작성

- 관광특구 진흥계획 적정성 보완 등
- 2022. 8.16.: 관광특구 보완요청에 따른 업무회의 (춘천시청)
- 2022.12.19.: 관광특구 보완사항 검토회의 (가평군청)
- 2022.12.29.: 관광특구 지정신청 보완 (경기도)
- 2023. 2.23.: 관광특구 지정 신청 보완사항 합동점검 (경기도, 강원도)
- 2023. 3.14.: 관광특구 지정 신청 사전 협의 (문체부, 경기도, 강원도)
- 2023. 3.23.: 관광특구 구역 조정 협의 (가평군, 춘천시)
- 2023. 6. 8.: 북한강 수변 관광특구 지정 관계기관 회의 (경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)
- 2023. 6.26.: 북한강 수변 관광특구 신청 관련 방문 협의 (문체부, 가평군)
 - 자라섬, 남이섬을 우선 지정하고 단계적 확대 추진
 - 객관적 통계자료 확보 시 가평군(자라섬) 단독 추진 가능
- 2023.10.12.: 북한강 수변 관광특구 추진 관계기관 회의 (경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)
- 2023.11. 9.: 북한강 수변 관광특구 추진 관련 회의 (경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)
- 2023.12.28.: 북한강 수변 관광특구 지정 신청 추가 보완 자료 제출
- 2024. 1.25.: 관광특구 관련기관 실무 협의(경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)
- 2024. 2. 2.: 관광특구 관련기관 실무 협의(문화체육관광부, 경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)
- 2024. 4.14.: 북한강 수변 관광특구 지정 관련 재보완 서류 제출
- 2024. 5. 8.: 북한강 수변 관광특구 관계기관 회의(경기도, 강원도, 가평군, 춘천시)
- 2024. 6.24.: 북한강 수변 관광특구 지정 신청 보완자료 제출
- 2024. 6.28.: 관광특구 관련기관 실무 협의(경기도, 가평군)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 북한강 수변 관광특구 지정을 위한 신청 완료하였으나 경기도(강원도)의 보완요구로 지정 지연

□ 향후계획

- 2024. 7. ~ 8.: 북한강 수변 관광특구 신청서 보완자료 제출 및 관련기관
(문화체육관광부, 경기도, 강원도, 가평군, 춘천시) 협의

□ 기대효과

- 관광특구 지정에 따른 관광도시 지역 이미지 확대
- 관광소비(생산, 소득, 취업, 세수 유발) 및 민간투자 증가

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

북한강 천년벚길 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-11	관광	차별화된 문화관광, 새로운 성장	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	관광과	수상관광팀장	신동원(2175)	담당자	강상민(2664)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 35%

□ 추진방향

- 경춘선 복선전철 및 서울-춘천고속도로 개통 등 우리 군의 교통여건은 점차 개선 중이나 방문하는 관광객은 크게 증가하지 않아 새로운 테마관광사업 개발이 필요하며
- 우리 군의 주요 관광지는 산재 되어 있어 접근성 및 연계가 미흡한 바 북한강을 이용한 수상관광루트를 개발하여 북한강 권역의 주요관광자원(자라섬, 남이섬, 뽕피프랑스, 물미연 꽃마을 등)을 연계하는 북한강 천년벚길 조성사업을 추진하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2020. ~ 2025.
- 사업위치: 가평군 북한강(청평호) 일원
- 소요예산: 52,400백만원(군비 150억원, 민간 374억원)
※ 확보예산: 총 37,171백만원(22년: 15,625, 23년: 21,546)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	52,400		52,400	15,625	21,546	12,700	2,529		
국비									
도비									
군비	8,600		8,600	625	6,546	500	929		
기금	6,400		6,400			4,800	1,600		
민간	37,400		37,400	15,000	15,000	7,400			

○ 사업내용

- 벚길 40km 및 육상 순환루트 조성, 북한강 수변 주요 관광지를 연결하여 시너지 효과를 극대화 하고 신규 관광자원 발굴 및 확대
- 수변생태관광 활성화를 위한 다목적 선착장 6개소 조성
- 친환경 선박 건조 및 운항(전기추진선 등 선박 3척 건조)

※ 공약사업내용 일부변경 방침결재 기완료:「자라꽃섬나루 선착장 건조 설치 추진계획 보고」(2023.8.8.)
- 다목적 선착장 개소수 변경(7개소→6개소)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	35
2023	사업비 확보 및 착공	· 공공 다목적 선착장 착공	35	35
2024	기반시설 완료	· 북한강 천년벚길 1단계 운항 실시 · 공공 다목적 선착장 완공	50	
2025	사업 개시	· 북한강 천년벚길 2단계 운항 실시	15	

□ 추진실적

- 2022. 8.10.: 경기도 해양수산물 방문협의
- 2022. 9.27.: 가평군 의회 사업장 방문
- 2022.10.26.: 친환경 전기선박 진수식
- 2022.10.~11.: 북한강 천년벚길 시범운항 실시 (2회, 162명 탑승)
- 2023. 5. 2.: 북한강 천년벚길 운영방안 수립 연구용역 착수
- 2023. 5.31.: 자라꽃섬나루 다목적 선착장 착수
- 2024. 4. 8.: 자라꽃섬나루 인양 협의((주) 남이섬)
- 2024. 4.12.: 북한강 천년벚길 가평크루즈 출항식
- 2024. 5.15.: 자라나루 선착장 완공
- 2024. 5.26.: 북한강 천년벚길 1단계 운항(자라섬~남이섬~송산리)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 2024. 8. ~ 12.: 민간선박 건조 등 독려
- 2025.12.: 북한강 천년벚길 전 구간 운항 실시

□ 기대효과

- 친환경 선박 도입을 통한 청정한 북한강 이미지 조성
- 행락철 가평으로 진입하는 주요도로의 정체에 구애받지 않고 북한강 물길을 이용한 자유로운 이동 및 관광지 연계를 통한 관광객의 만족도 향상 및 지역경제 활성화 도모

□ 참고사진



농업정책과

번호	사업명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
2개 사업						75%	
I-6	글로벌 가평농업 프로젝트	가평군	신규	2026 (임기내)	정상추진	50	
I-7	직거래장터 활성화	가평군	신규	2026 (임기내)	정상추진	100	

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

글로벌 가평농업 프로젝트

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-6	농업	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	농업정책과	농산유통팀장 박민정(4771)	담당자	김판선(4797)	
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	50%

□ 추진방향

- 관내 농식품·신선농산물 수출 품목 발굴·육성
- 신선농산물을 재배하여 수출에 참여하고 있는 농가, 작목반, 생산자 단체 또는 국산 농축수산물을 주원료로 사용하는 생산·수출하는 식품 가공업체에 대해 수출농산물 포장재, 물류비 및 농자재, 공동선별비 등 지원하여 수출 확대 도모
- 농식품 수출관련 이론교육, 컨설팅 및 벤치마킹

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 관내
- 사업규모: 농가, 작목반 생산자 단체 등
- 소요예산: 411백만원(383백만원) ※ 확보예산: 총 235백만원(22년: 62, 23년: 27, 24년:146)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	411	56	355	62	27	146	80	40		
국비										
도비	176	28	148	31	11	46	40	20		
군비	235	28	207	31	16	100	40	20		
기타										

○ 사업내용

- 수출 확대를 위한 수출 관련 교육 실시
- 품목별 수출용 포장에 소요되는 박스 등 지원
- 신선농산물 수출단지의 노후시설 및 장비 구입 지원

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	50
2022 하반기	농식품류 수출 실시	· 가공업체 수출포장재 및 물류비 지원	25	25
2023 ~ 2026 상반기	신선농산물 및 가공 식품류 수출 확대 지원	· 수출과정 농가교육 실시 · 수출품목 발굴 육성 · 고품질 수출농산물 생산지원 · 수출에 따른 포장재	75	25

□ 추진실적

- 2022. 6월 농식품 수출업체 2개소 수출포장재 지원(보조 60,000천원, 자부담 60,000천원)
 - (주)우리술(품목: 막걸리) / 수출량: 983톤·수출국가: 미국, 중국, 일본 호주
 - GH내추럴(품목: 홍삼제품) / 수출량: 30톤 ·수출국가: 미국, 베트남
- 농식품 수출업체 1개소 수출물류비 지원(보조 2,034천원)
 - GH내추럴(품목: 홍삼제품 등) / 지원수출량: 13톤 ·수출국가: 미국, 베트남
- 2022.12.26. ~ 2023. 4.14: 가평군 농특산물 유통 및 수출활성화 실행방안 연구용역 완료
- 2023. 2.22.: 가평 잣초콜릿 및 딸기 수출품목 발굴
- 2023. 3.21.: 농식품 수출업체 현장 방문(3개소)
- 2023. 5월 농식품 수출업체 2개소 수출포장재 지원(보조 20,936천원, 자부담 20,936천원)
- 2023. 12월 농특산물 수출농가 역량강화 교육 실시
- 2024. 5월 농식품 해외마케팅 지원사업 위수탁협약 체결(사업비 123,400천원)
 - ※ 수탁기관: 한국농수산물유통공사 서울경기지역본부
- 2024. 6월 농식품 수출업체 2개소 수출포장재 지원(보조 17,790천원, 자부담 17,790천원)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 2024. 3분기: 신규 수출품목 발굴 및 수출희망농가(업체) 조사,
- 2024. 4분기: 농식품 가공업체(생산자 단체) 수출관련 이론 및 선진지 답사

□ 기대효과

- 신선 농산물·농식품 수출화를 통해 판로개척 및 수출경쟁력 강화

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

직거래장터 활성화

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
1-7	농업	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	농업정책과	농산유통팀장 박민정(4771)	담당자	양현숙(4786)	
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 관광테마 등 소비자 구매 포인트를 활용한 장터 내실화
- 꽃정원, 주요관광지 등 방문객이 많은 장소 직거래 장터 확대 운영
- 小 사업비 高 효율성 온·오프라인 장터 운영

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7 ~ 2026. 6
- 사업위치: 자라섬외 다수
- 사업규모: 100여농가
- 소요예산: 1,010백만원(650백만원) ※ 확보예산: 총 470백만원(22년: 50, 23년: 150, 24년: 270)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	1,010		1,010	50	150	270	270	270		
국비										
도비										
군비	1,010		1,010	50	150	270	270	270		
기타										

※ 기간제근로자 인건비 등 누락예산 반영

○ 사업내용

- 자라섬 남도 꽃 정원 가평군 명물 직거래 장터 확대 운영
- 자매결연지 등 직거래 장터 운영
- 방문객이 많은 주요 장소 직거래 장터 개설 운영
- 기관·단체·기업과 함께하는 직거래 장터 운영
- 라이브커머스 등 랜선 온라인 직거래 운영

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	직거래장터 3회	· 가을 자라섬 꽃정원 농특산물 판매장 자라장터 운영 · 한컴 청리움 직거래장터 운영 · 네이버라이브 쇼핑 온라인 직거래 추진	15	15
2023	직거래장터 6회	· 봄·가을 자라섬 꽃정원 농특산물 판매장 자라장터 운영 · 한컴 청리움 직거래장터 운영 · 네이버라이브 쇼핑 온라인 직거래 추진 · 연말맞이 착한직거래 특별전 운영 · 자매결연지 등 직거래 장터 운영 · 관내 행사, 축제 개최 시 직거래 장터 운영 · 에덴휴게소 등 다중 집합시설 직거래장터 실시	35	35
2024 ~ 2026 상반기	직거래장터 7~10회	· 봄·가을 자라섬 꽃정원 농특산물 판매장 자라장터 운영 · 한컴 청리움 직거래장터 운영 · 네이버라이브 쇼핑 온라인 직거래 추진 · 연말맞이 착한직거래 특별전 운영 · 자매결연지 등 직거래 장터 운영 · 관내 행사, 축제 개최 시 직거래 장터 운영 · 에덴휴게소 등 다중 집합시설 직거래장터 실시	50	50

□ 추진실적

○ 2022년도(9월~12월)

- 총 매출액: 812,516천원
- 직거래 장터 개장 횟수: 13회(관외 6회)
- 주요 직거래 장터
 - 가을 자라섬 꽃축제 직거래(490,936천원)
 - 찾아가는 로컬푸드 직매장(174,883천원)

○ 2023년도

- 총 매출액: 1,314,894천원
- 직거래 장터 개장 횟수: 38회(관외 21회)
- 주요 직거래 장터
 - 설 명절 기관, 단체 및 직원 직거래(31,800천원)
 - 에덴벚꽃축제 직거래 장터(36,333천원)
 - 봄 자라섬 꽃축제 직거래 장터(317,717천원)
 - 가을 자라섬 꽃축제 직거래(685,097천원)
 - 자매결연지 직거래(37,076천원)

- 추석 명절 기관·단체 및 직원 직거래(31,292천원)
- 네이버 라이브커머스(7,750천원)
- 온라인 직거래(109,575천원)

○ 2024년도

- 총 매출액: 627,999천원
- 직거래 장터 개장 횟수: 13회(관외 11회)
- 주요 직거래 장터
 - 설 명절 기관, 단체 및 직원 직거래(33,657천원)
 - 자매결연지 직거래(20,726천원)
 - 에덴벚꽃축제 직거래(35,712천원)
 - 메가쇼 2024 시즌1 참가(7,660천원)
 - 자라섬 꽃페스타(봄) 마켓섬(522,350천원)
 - 서울동행상회 지역장터(5,400천원)
 - 온라인 라이브커머스 직거래(2,493천원)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 가을 자라섬 꽃페스타 직거래 장터 운영
- 자매결연도시 직거래장터 확대 추진
- 관내 주요 지점 직거래장터 실시
- 대도시와 함께하는 특별 기획전 운영
- 마켓경기 입점 농가 확대 추진
- 온라인직거래 라이브커머스 추진

□ 기대효과

- 농가의 판로 확보로 농가소득 증대 및 지역경제 활성화

축 산 정 책 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						100%	
Ⅲ-12	청평 옛 중앙내수면연구소 이전부지 주민 개방	가평군	신규	2023 (임기내)	완료	100	

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

청평 옛 중앙내수면연구소 이전부지 주민 개방

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-12	관광	자연환경은 더 아름답게	가평군	신규	단기	임기 내
추진부서	경제산업국	축산정책과	축수산정책팀장	정대섭(4761)	담당자	최수경(4758)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기					공정률 100%

※ 당초 「청소년 해양교육센터 건립」 공약사업 변경

□ 추진방향

- 1942년 청평면에 개소하여 지난 80여년간 지역 주민들에게 단절된 중앙내수면연구소 이전부지 내 저수지를 개방
 - ※ 가평군·국립수산물연구원 중앙내수면연구소 간 “연구소 이전부지 내 저수지 임시개방에 따른 운영 업무 협약” 체결
- 연구소 이전에 따른 지역주민들의 상실감을 위로하고 유희부지의 활용에 따른 지역 경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 3. ~ 4.
- 사업위치: 가평군 청평면 청평리 91번지(중앙내수면연구소 이전부지)
- 사업규모: 저수지 14,767㎡
- 소요예산: 30백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	30		30		30				
국비	30		30		30				
도비									
군비									
기타									

○ 사업내용

- 2023. 4월 벚꽃 개화시기 동안 연구소 이전부지 내 저수지 임시개방 행사 운영
- 행사기간 동안 방문객의 안전관리 추진

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	100
2023	개방행사 운영	· 중앙내수면연구소와 운영 업무 협약 체결 · 이전부지 내 저수지 개방행사 운영	100	100

□ 추진실적

- 2023. 2.23.: 중앙내수면연구소 방문 업무 협의(금산 중앙내수면연구소)
- 2023. 2.27.: 저수지 개방 관련 국회 방문 및 건의(최춘식 의원실)
- 2023. 3. 2.: 해양수산부 방문 업무 협의(세종시 해양수산부)
- 2023. 3.14.: 저수지 개방 관련 국회 2차 방문(최춘식 의원실)
- 2023. 3.15.: 운영 업무 협약을 통한 저수지 임시 개방 결정(중앙내수면연구소)
- 2023. 3.21.: 중앙내수면연구소 저수지 임시개방 운영 업무 협약 체결
- 2023. 4. 6.: 가평군 안전정책실무조정위원회 개최
- 2023. 4. 7. ~ 4.23.: 청평 옛 중앙내수면연구소 벚꽃길 개방(총 방문객 7,028명)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 청평 중앙내수면연구소 이전부지를 상시개방 및 조속히 활용될 수 있도록 방안 마련

□ 기대효과

- 연구소 개방에 따른 80여년간 가보고 싶어도 가보지 못했던 지역주민들의 소원 성취
- 이전부지 폐쇄가 아닌 주민과 함께하는 지역 경제 활성화 기여

산 림 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
4개 사업						28.7%	
I-9	산림자원 가공산업 육성	가평군	신규	2025 (임기내)	정상추진	5	
III-9	북면 산림생태테마파크 조성	가평군	계속	2026 (임기외)	정상추진	0	
III-10	상면 산림자원 관광레저 바이오밸리 조성	가평군	신규	2026 (임기내)	정상추진	10	
III-13	축령산 생태관광마을 둘레길 조성 (행현2리 중심)	가평군	계속	2023 (임기내)	정상추진	100	

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

산림자원 가공산업 육성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-9	산림	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	산림과	산림정책팀장	정지일(2340)	담당자	김미애(2342)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	5%

□ 추진방향

- 미이용 산림부산물을 활용한 신재생에너지 연료, 축사깔개, 표고톱밥배지로의 활용 및 목재 건조 및 가공시설 설치 등 수집·가공·유통 시스템 구축을 위한 자원화 센터 조성으로 지역 일자리 창출
- 향후, 가평군 소각시설 설치시 발생한 폐열을 활용한 산림자원 가공시설 운영기반 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2025
- 사업위치: 가평읍 상색리 509번지 일원
- 사업규모: 미이용 산림자원화 센터 조성
- 소요예산: 3,000백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,000		3,000			1,500	1,500		
국비	1,500		1,500			750	750		
도비	150		150			75	75		
군비	450		450			225	225		
기타	900		900			450	450		

- 사업내용
 - 미이용 산림자원화센터 기반(가공 및 건조시설, 작업장 등) 조성 및 자원화 사업에 필요한 기계장비구입을 통한 자원화 시스템 구축

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	5
2023	미이용 산림자원화 센터 조성사업 공모사업 신청 접수	· 공모 신청접수	30	5
2024	미이용 산림자원화 센터 조성사업 추진	· 미이용 산림자원화센터 조성	40	
2025	산림자원화센터 운영 가평군 폐기물 소각시설과 사업연계 추진	· 산림자원가공시설 등 운영 · 소각시설 여열을 이용한 스팀, 온수, 건조 등 열원 재활용 · 폐기물 소각시설 설치사업과 사업연계 추진	30	

□ 추진실적

- 2022. 8.12.: 공약사업 추진계획 군수님 보고
- 2022. 9.22.: 공약사업 추진계획을 위한 업무협약(가평군산림조합)
- 2022.11.10.: 공약사업 추진을 위한 업무협약(2차, 가평군산림조합)
- 2023. 5.11.: 공약사업 추진을 위한 간담회 개최(가평군산림조합)
- 2023. 5.16.: 공약사업 추진을 위한 벤치마킹 실시(춘천 목재산업단지)
- 2023. 8.25.: 대한민국 목재산업박람회 벤치마킹(일산 킨텍스)
- 2023.10.12.: 2023년 강원세계산림엑스포 벤치마킹(강원도 고성군)
- 2023.10.18.: 2024년 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모계획 추진(산림청)
- 2023.11. 3.: 2024년 미이용 산림자원화센터 조성사업 공모계획 제출(신청자: 가평군산림조합)

구분	지자체	업체구분	추진년수	비고
1	경기 가평군	산림조합	1년차	
2	강원 홍천군	산림조합	2년차	
3	충북 충주시	목재업체	1년차	자진 취소
4	청북 청주시	목재업체	1년차	소규모 목재업체
5	경북 성주군	목재업체	3년차	대규모 목재업체

- 2023.12.06.: 공모사업 현장심사(가평읍 상색리 509번지 일원)
- 2023.12.18.: 공모사업 PPT 발표(대전 정부청사 내 산림청)
- 2023.12.20.: 공모사업 최종선정 결과(선정지자체: 경북 성주군)
- 2024. 3.22.: 산림사업 활성화를 위한 벤치마킹(강원도 정선군)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 산림청 공모사업은 총사업비 30억원에 이 중 자부담은 9억원으로 높은 자부담으로 인해 공모사업 추진에 어려움이 있는 실정임
- 이에, 공모사업 주관기관인 산림청에 사업규모 및 사업비를 30억원 이하로 조정 신청 가능한지 등 확인하였으나, 산림청 공모사업인 「미이용 산림자원화센터 조성사업」의 사업 취지에 맞지 않아 사업규모 조정 신청은 어렵다는 답변을 받음에 따라,
- 공모사업 취지에 맞는 사업규모 신청 또는 춘천시에서 추진하고 있는 목재산업단지 조성 방식의 신청·검토 등 가평군산림조합과 추가 협의를 진행함이 필요함
- ‘2024년 미이용 산림자원화센터 공모사업’이 2023.10월 발표되면서 우리군도 참여하였으나 산림청에서는 미이용 산림자원화센터를 도 권역별 1개소 설치하는 계획이라 경기도 파주시에 본 사업이 선정된 이력이 있어 평가 항목 중 가산점(선정 이력이 없는 경우 가산점 부여)을 확보하지 못하였음
- 현장심사 및 PPT 발표시 심사위원으로부터 관심이 상당히 높았으나 민간 목재업체가 선정됨
- ‘2025년 미이용 산림자원화센터 공모사업’추진 여부를 산림청에 유선으로 확인하였으나 2024년 9월경 예산 확정되어 2024년 10월경에 공모사업 신청접수 가능할 것으로 예상하고 있어 가평군산림조합과 신청여부를 재협의할 예정임
- 향후, 산림청 공모사업 추진 불가시 대안 검토는 물론 미이용 산림자원화센터 조성 완료 후 소각시설 폐열을 이용한 사업연계 추진계획이었으나, 일부 전문가는 폐열을 이용한 목재건조 등 가공시설 목적의 활용은 어렵다는 의견이 있음에 따라 전문가의 자문을 득하여 공약사업 추진 가능 여부에 대하여 별도 검토보고 예정임

□ 향후계획

- 산림청 「2025년 미이용 산림자원화센터 조성사업」 공모계획 공고시 가평군산림조합과 공모사업 참여 재협의 예정

□ 기대효과

- 미이용 산림부산물을 활용한 신재생 에너지연료 확대 및 가공시설 설치로 산림자원화 기반조성은 물론 가공산업 활성화로 지역 일자리 창출

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

북면 산림생태테마파크 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-9	산림	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	장기	임기 외
추진부서	경제산업국	산림과	산림휴양팀장	최석준(2480)	담당자	최영재(2486)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	0%

□ 추진방향

- 북면 계관산을 우수한 자연생태자원 등과 연계·강화하고 접근이 용이한 숲길 조성
- 특색 있고 차별화된 숲길 조성을 통한 볼거리 제공 및 지역경제활성화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.(2023. 12.)
- 사업위치: 가평군 북면 목동리 산226-1번지 일원
- 사업규모: 숲길 조성 및 정비(L= 5km)
- 소요예산: 540백만원(300백만원) ※ 확보예산: 총 50백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	540		540				40	500		
국비										
도비										
군비	540		540				40	500		
기타										

- 사업내용
 - 숲길 내 편의시설 조성(데크쉼터 및 등 의자 등)
 - 편의 시설물 설치(안전로프 및 안내판 등)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	0
2025	실시설계용역 추진	· 2025. 7.~ 8. 실시설계용역 추진	10	0
2026	산림생태테마파크 조성 추진	· 2026. 3.~ 6. 공사 추진	90	0

□ 추진실적

- 2022. 9.27.: 공약사업 추진 관련 사전 답사
- 2023. 7.17.: 미·영연방 관광안보공원 조성 타당성조사 연구 및 기본계획 수립 용역 착수 보고회 참석(복지정책과 추진)
- 2023. 8. 8.: 미·영연방 관광안보공원 조성 타당성조사 연구 및 기본계획 수립 용역 주민 설명회 참석(복지정책과 추진)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 북면 산림생태테마파크 조성은 미·영연방 관광 안보공원 조성(복지정책과 소관)과 연계되어 추진되는 사업으로, 안보공원 조성 시기에 맞춰 사업 적극 추진하겠음

□ 향후계획

- 2024.10. ~ 12.: 사업 관계자 현장 동행 및 실시설계용역 추진(예정)
- 2025. 3. ~ 6.: 공사 추진(예정)

□ 기대효과

- 주민 편의 제공 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

약속III 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

상면 산림자원 관광레저 바이오밸리 조성

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
III-10	산림	자연환경은 더 아름답게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	경제산업국	산림과	산림휴양팀장	최석준(2480)	담당자	윤윤섭(2481)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 10%

□ 추진방향

- (필요성) 상면지역은 잣나무 숲이 울창한 산림자원을 보유하고 있고 기존 치유의 숲, 환경성질환예방센터 등 산림휴양에 대한 시설을 보유하고 있으나 산림레포츠(레저)와 관련된 시설이 없어 이와 관련된 시설물을 조성하여 관광객 유치 및 지역경제활성화 도모 필요
- 상면지역이 갖고 있는 우수한 산림자원의 특성 및 치유의 숲 등 산림휴양시설과 연계하여 산림레포츠(레저)시설을 조성하여 복합형 산림 관광레저밸리조성
- 상면지역에 접근성, 경관 등을 고려하였을 때 활용가능한 부지는 도유림이므로 파편화되어있는 군유림과 교환 후 사업추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 가평군 상면 상동리 산24-4번지 일대(예정)
- 사업규모: 산림레포츠체험단지 1식(산악승마시설, 산악자전거시설 등)
- 소요예산: 2,700백만원 ※ 확보예산: 50백만원(23년 50백만원)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,700		2,700		50	80	2,570		
국비	1,250		1,250				1,250		
도비									
군비	1,450		1,450		50	80	1,320		
기타									

○ 사업내용

- 상면 상동리 도유림과 연인산도립공원(가평읍 승안리 산120번지 외 4필지) 내 군유림을 교환하여 사업부지 확보
 - 상면 상동리 산24-4번지(도유림) 일원에 산악승마시설, 산악자전거시설, 산악마라톤시설 등 조성
 - 산림욕장등 조성계획(산림레포츠체험단지) 용역에 의거 부지 임황, 경사도 등을 파악 후 적합한 시설 추가 선정
- ※ 「산림·문화 휴양에 관한 법률」제20조(산림욕장등의 조성) 및 동법 시행령 제9조의4 제1항 관련된 산림레포츠시설임

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진 계획	목표이행률	공정률
계			100	10
2022 하반기	부지 선정	· 산림레포츠단지 적지선정을 위한 연구용역 (도유림 교환 등)	5	5
2023	부지 선정	· 공유재산 교환에 따른 감정평가 등 실시	15	5
2024	조성계획 승인	· 산림레포츠체험단지 조성계획 승인 용역 추진 (「산림·문화 휴양에 관한 법률」제20조 관련)	20	
2025	설계 및 공사	· 산림레포츠체험단지 조성공사 실시설계용역 · 산림레포츠체험단지 조성공사(1차년도)	30	
2026 상반기	공사 및 준공	· 산림레포츠체험단지 조성공사(2차년도)	30	

□ 추진실적

- 2022. 9.23.: 공약사업 추진 관련 사전 답사
- 2022.11.11.: 산림자원 관광레포츠단지 조성방안 용역 착수
- 2023. 1.: 대상지 선정을 위한 현장답사 및 주민의견 청취
- 2023. 3.: 산림자원 관광레포츠단지 조성방안 용역 준공
- 2024. 2.: 道 산림환경연구소 방문하여 산림레포츠체험단지 조성사업안 협의
- 2024. 7.: 상동리 산림레포츠시설 설치사업 실시설계 용역 중

□ 추진상 문제점 및 대책

- 사업추진을 위해서는 군유림-도유림 교환을 통한 사업부지 확보가 필요하므로, 경기도 산림환경연구소와 협의 완료 및 향후 경기도 재산관리부서 등 협의 추진이 필요한 사항으로 사업시기 일부 지연

□ 향후계획

- 상동리 산24-4번지 도유림 일원 현황측량 후 사업부지 선정 협의
- 사업부지 확보를 위한 공유재산 교환 필지 협의(경기도 산림환경연구소)

□ 기대효과

- 가평군의 수려한 산림자원과 산림레포츠 체험을 통한 힐링 가평 실현 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 기대

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

축령산 생태관광마을 둘레길 조성(행현2리 중심)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-13	산림	자연환경은 더 아름답게	가평군	계속	단기	임기 내
추진부서	경제산업국	산림과	산림휴양팀장	최석준(2480)	담당자	최영재(2486)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 상면 행현리 마을을 우수한 지역관광·자연생태자원 등과 연계·강화할 수 있는 둘레길 조성 및 정비

□ 사업개요

- 사업기간: 2018. ~ 2023.
- 사업위치: 가평군 상면 행현리 산172-1 일원
- 사업규모: 둘레길 진입로 포장, 쉼터 조성 등(L= 0.7km)
- 소요예산: 420백만원 ※ 확보예산: 총 300백만원

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	420	120	300		300				
국비									
도비									
군비	420	120	300		300				
기타									

○ 사업내용

- 둘레길 진입로 포장(야자매트 설치 등) 및 입구 조형물 설치
- 쉼터 조성 및 야생화 식재
- 물길 조성 및 생태연못 구조 개선 등

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
	계		100	100
2023	실시설계용역 및 축령산 생태관광마을 둘레길 조성 추진	· 2023. 3.~ 4. 실시설계 용역 추진 · 2023. 9.~ 11. 공사 추진	100	100

□ 추진실적

- 2022. 9. 8.: 공약사업 추진 관련 사전 답사
- 2023년 본예산 반영 (300백만원)
- 2023. 3.27.: 실시설계용역 착수
- 2023. 4.25.: 실시설계용역 준공
- 2023. 9. 4.: 사업대상지 산지 일시사용신고 신청
- 2023. 9.15.: 축령산 생태관광마을 둘레길 조성사업 추진
- 2023.12.13.: 축령산 생태관광마을 둘레길 조성사업 준공

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 해당없음

□ 기대효과

- 마을 주민 편의 제공 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사진



건 설 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
6개 사업						37.5%	
V-1	제2경춘국도 건설사업 조기 착공	국 토 부	계속	2026 (임기내)	정상추진	45	
V-2	지방도387호선(내방~연하)도로 개량사업 조기 착공	경 기 도	계속	2026 (임기내)	정상추진	35	
V-3	하천IC~고성간도로 개설사업(호명터널) 확정	국 토 부	계속	2027 (임기외)	정상추진	45	
V-4	국도75호선(가평~목동)확장사업 착공	국 토 부	계속	2028 (임기외)	정상추진	10	
V-5	상판~적목 간 2차선 도로 개설사업 확정	경 기 도	계속	2027 (임기외)	정상추진	45	
V-6	두밀~대보 간 2차선 도로 개설사업 확정	경 기 도	계속	2027 (임기외)	정상추진	45	

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

제2경춘국도 건설사업 조기 착공

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-1	건설	주민안전은 더 세심하게	국토부	계속	중기	임기 내
추진부서	건설도시국 건설과 도로시설팀장 김양섭(2425)					
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	45%

□ 추진방향

- 수도권과 강원도를 연결하는 주요 간선도로인 서울~양양 고속도로와 국도46호선은 만성적인 교통체증으로 인해 내방객 및 지역 주민들이 통행에 큰 불편을 겪고 있어 교통량을 분산하고 가평군 접근성 향상을 위해 제2경춘국도 신설이 절실한 상황임
- 2019년도 예비타당성조사 면제사업으로 선정되어 추진 중인 「제2경춘국도 건설사업」에 대하여 관련부처인 국토교통부와 지속적인 업무협의를 통해 우리군의 건의사항이 최대한 반영될 수 있도록 당위성과 필요성을 적극 피력하고 사업이 조기에 착공될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2029 ※ 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 남양주시 화도읍 금남IC ~ 가평군 청평면, 가평읍 경유 ~ 춘천시 서면 안보리
- 사업규모: 연장(L)=33.6km, 폭원(B)=20.0m (교량 24개소/5.6km, 터널 20개소/13.6km)
- 소요예산: 1,286,200백만원 (국비 100%)
- 사업내용: 제2경춘국도 신설

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	45
2022 하반기	기본설계용역 완료 실시설계용역 발주	· 기본설계용역 완료 · 실시설계용역 발주	30	30
2023	실시설계용역 추진	· 실시설계용역 추진	10	10
2024	실시설계용역 완료 편입용지보상 추진	· 실시설계용역 완료 · 편입용지보상 추진	25	5
2025	편입용지보상 완료	· 편입용지보상 완료	15	
2026 상반기	공사 착공 및 추진	· 공사 착공 및 추진	20	

□ 추진실적

- 2022. 6.: 총사업비[1조2,862억원] 협의 완료(기재부→원주청)
- 2022. 7.: 기본설계용역 완료(원주청)
- 2022. 8. ~ 10.: 기본설계 기술제안 입찰 발주(원주청, 서울청)
- 2022.10.: 기본설계 기술제안 입찰 유찰(원주청, 서울청)
- 2022.12.: 실시설계용역 입찰 발주(원주청, 서울청)
- 2023. 1.: 실시설계용역 착수(서울청-1,2공구 / 원주청-3,4,5공구)
- 2023. 3.: 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 서울청 현장 방문 협의
- 2023. 6.: 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 주민설명회 및 현장 설명회 개최(서울청)
- 2023. 7.: 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 관련 서울청 방문 협의
- 2023. 7.: 제2경춘국도 건설사업(3,4공구) 관련 원주청 방문 협의
- 2023. 7.: 제2경춘국도 건설사업(1,2공구) 주민의견 수렴 및 의견 제출(가평군→서울청)
- 2023. 7.: 제2경춘국도 건설사업(3,4공구) 주민설명회 개최(원주청)
- 2023. 8. ~ 10.: 「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」 면담 실시(3회)
- 2023. 9. ~ 2024. 3.: 「서울청 - 제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」간 간담회 실시(3회)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 조속한 사업추진을 위해 서울지방국토관리청과 원주지방국토관리청에서는 2022년 12월에 총 5공구(1,2공구: 서울청 / 3,4,5공구: 원주청)로 사업구간을 나누어 실시설계용역을 발주 하였으며, 현재 실시설계용역 진행 중임
- 2023. 6. 서울지방국토관리청에서 주민설명회를 개최하여 당초 상면 덕현리에 계획된 나IC가 도로시설기준에 부적합하여 위치를 변경하는 검토(안)을 제시함에 따라 상·조종면 주민들이 반대하는 상황임
- 현재 상·조종면을 중심으로「제2경춘국도와 37번국도 접속 추진위원회」를 구성함에 따라 서울지방국토관리청과 3차례 간담회를 실시하였으며, 나IC 변경(안)에 대하여 지역주민 의견이 반영될 수 있도록 적극 노력하고자 함


□ 향후계획

- 2024.12.: 실시설계 용역 준공(예정)
- 2025. 1. ~ 2025.12.: 용지보상 협의 추진(예정)
- 2026. 1. ~ 2029.12.: 공사 착공 및 준공(예정)

□ 기대효과

- 최적의 노선 선정 및 자동차 전용도로 개설을 통한 우리 군 접근성을 향상하여 지역 경제 활성화에 기여
- 행락철 및 주말 서울~양양 고속도로와 국도46호선(경춘국도)의 만성적인 교통 지정체 해소로 가평군 방문객 및 지역 주민들에게 교통편의 증진

□ 위치도 및 노선도

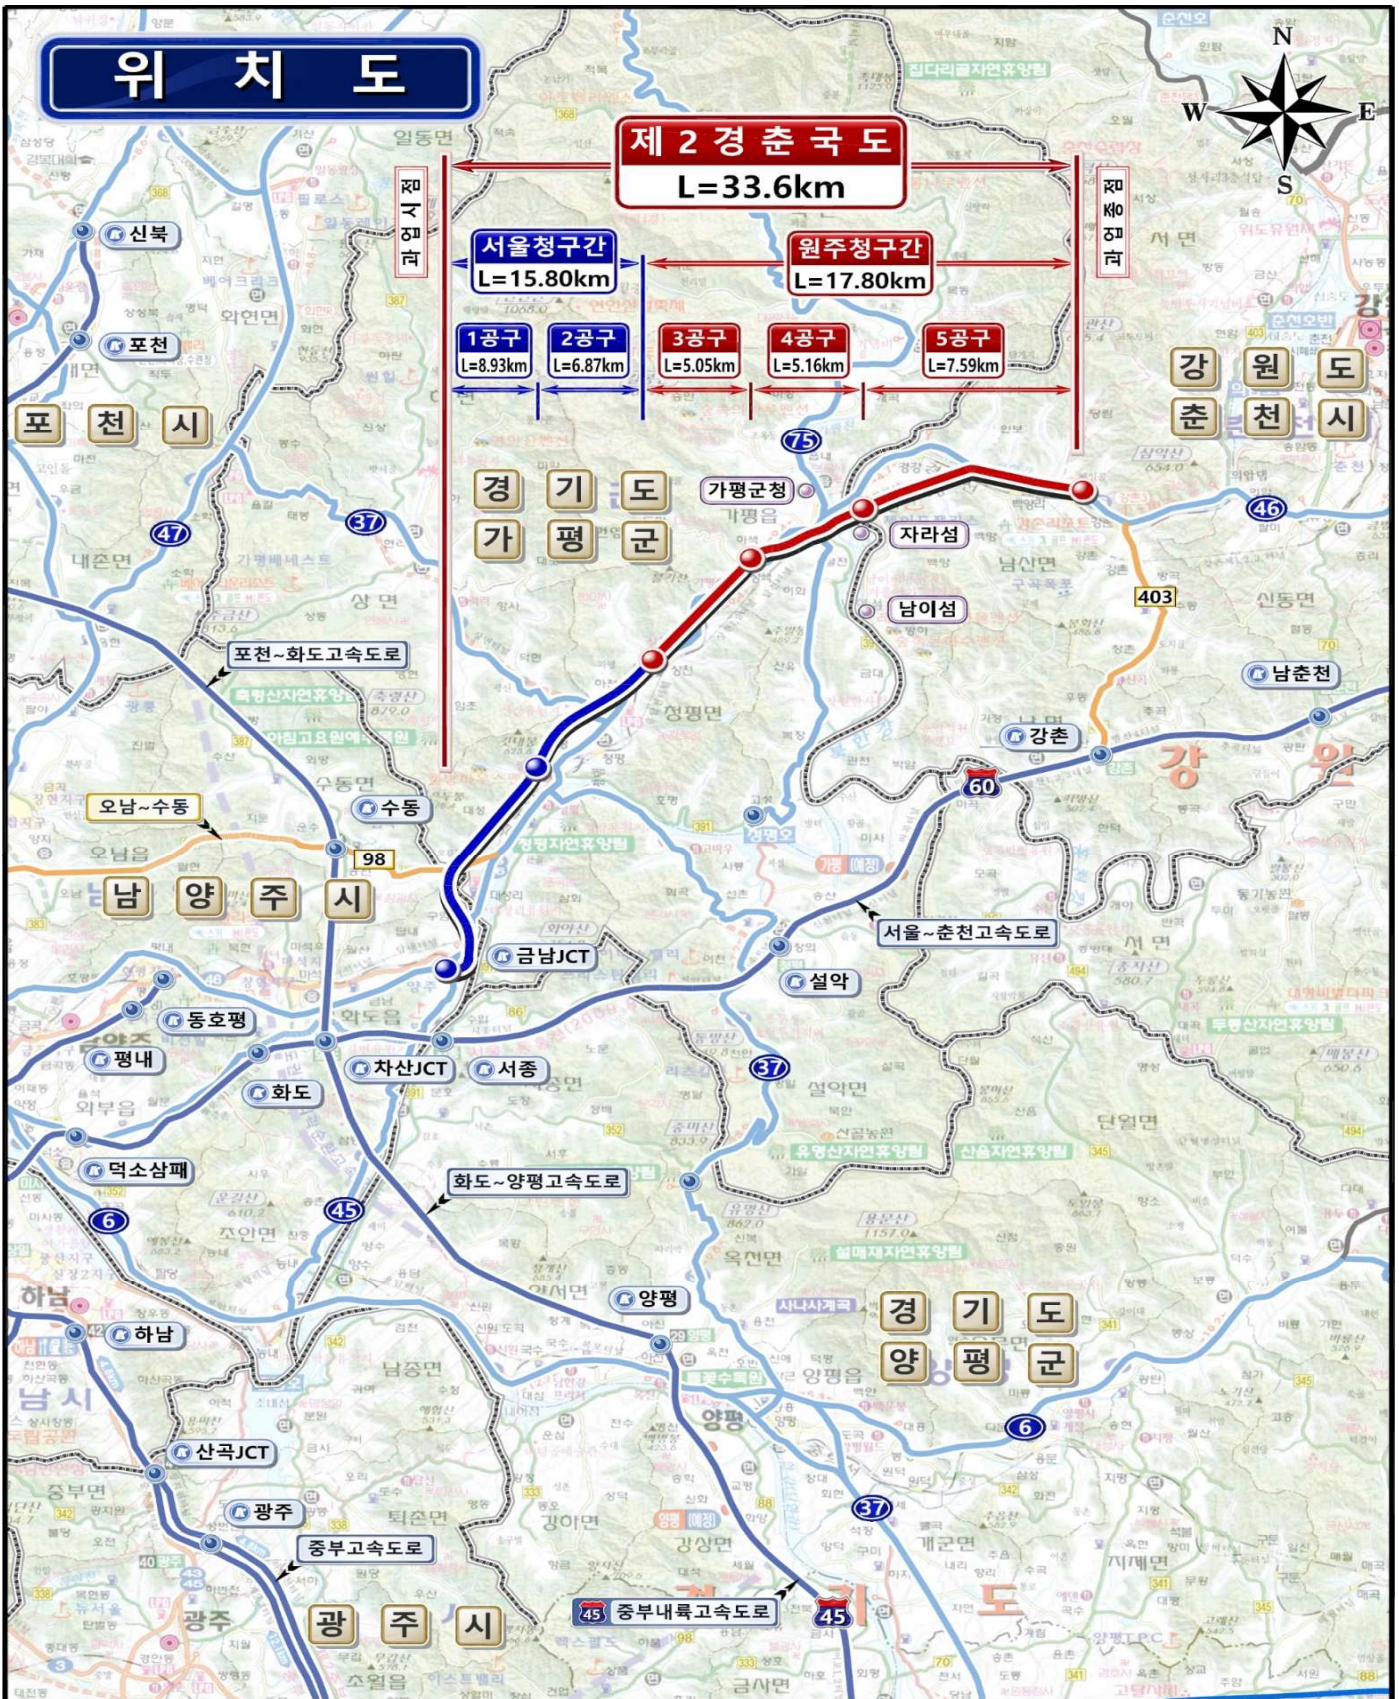

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

지방도387호선(내방-연하)도로 개량사업 조기 착공

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-2	건설	주민안전은 더 세심하게	경기도	계속	중기	임기 내
추진부서	건설도시국 건설과 도로시설팀장 김양섭(2425)					
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	35%

□ 추진방향

- 지방도 387호선은 도로 폭이 협소하고 평면 및 종단선형이 불량하여 사고위험이 상존함에 따라 교통사고 위험을 예방하고 도로이용자의 통행 편의를 증진하며 나아가 수도권 제2순환 고속도로와 연계 구축을 통한 지역 접근성 향상을 위해 도로 개량(터널화)이 필요한 실정임
- 「제3차 경기도 도로건설계획」에 반영되어 추진 중인「지방도 387호선(내방-연하) 도로 개량사업」에 대해서 관련부처인 경기도와 적극적인 업무협의를 통해 가평군 건의사항이 최대한 반영될 수 있도록 당위성을 피력하고 공사가 조기에 착공될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2029(2028) ※ 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 가평군 상면 상동리 ~ 남양주시 수동면 내방리
- 사업규모: 연장(L)=2.6km, 폭원(B)=10.0m (터널 1개소/0.9km)
- 소요예산: 48,100백만원 (도비 100%)
- 사업내용: 지방도387호선 선형 개량(터널 개설)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	35
2022 하반기	기본설계용역 및 실시설계용역 착수	· 기본설계용역 및 실시설계용역 착수	10	10
2023	기본설계용역 및 실시설계용역 추진	· 기본설계용역 및 실시설계용역 추진	20	20
2024	기본설계용역 및 실시설계용역 완료	· 기본설계용역 및 실시설계용역 완료	20	5
2025	편입용지보상 추진	· 편입용지보상 추진	20	
2026 상반기	편입용지보상 완료 공사 착공 및 추진	· 편입용지보상 완료 · 공사 착공 및 추진	30	

□ 추진실적

- 2022. 7.: 기본 및 실시설계용역 착수(경기도), 착수보고회 개최(경기도)
- 2023. 1.: 주민설명회 개최
- 2024. 5.: 「경기 동부 SOC 대개발」 시·군 간담회 시 건의
- 2024. 5.: 주민설명회 개최(상동리 마을회관)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 경기도에서 부족 용역비(10억)를 `24년도 본예산에 신청하였으나 확보되지 않아 사업 지연이 우려되는 실정이며, 종점부 기본설계 노선에 대하여 상동리 4반마을 주민들이 경기도에 노선 재검토를 요청함
- 관련부서에서 `24년 제1회 추경예산(`24. 9월 中)에 부족 용역비를 확보할 예정이며, 24년 5월 상동리 마을회관에서 주민설명회를 개최 후 청취된 주민의견에 대하여 전문용역사와 같이 한 번 더 면밀히 검토하여 2차 설명회를 개최하겠다고 답변함에 따라 주민의견이 검토될 수 있도록 관련부서와 지속적으로 협의 노력하고자 함


□ 향후계획

- 2024.12.: 기본 및 실시설계용역 준공(예정)
- 2025. 1. ~ 2026. 6.: 용지보상협의 추진(예정)
- 2026. 7. ~ 2029.12.: 공사 착공 및 준공(예정)

□ 기대효과

- 수도권제2순환고속도로와 유기적이고 효율적인 간선도로망을 구축하여 접근성 향상을 통한 지역경제 활성화에 기여
- 평면 및 종단선형이 불량한 위험도로 개량으로 도로이용자 안전사고 예방
- 교통량 분산을 통한 국도46호선의 만성적인 교통 지·정제를 해소하여 내방객 및 지역주민들에게 교통편의 제공

□ 위치도 및 노선도

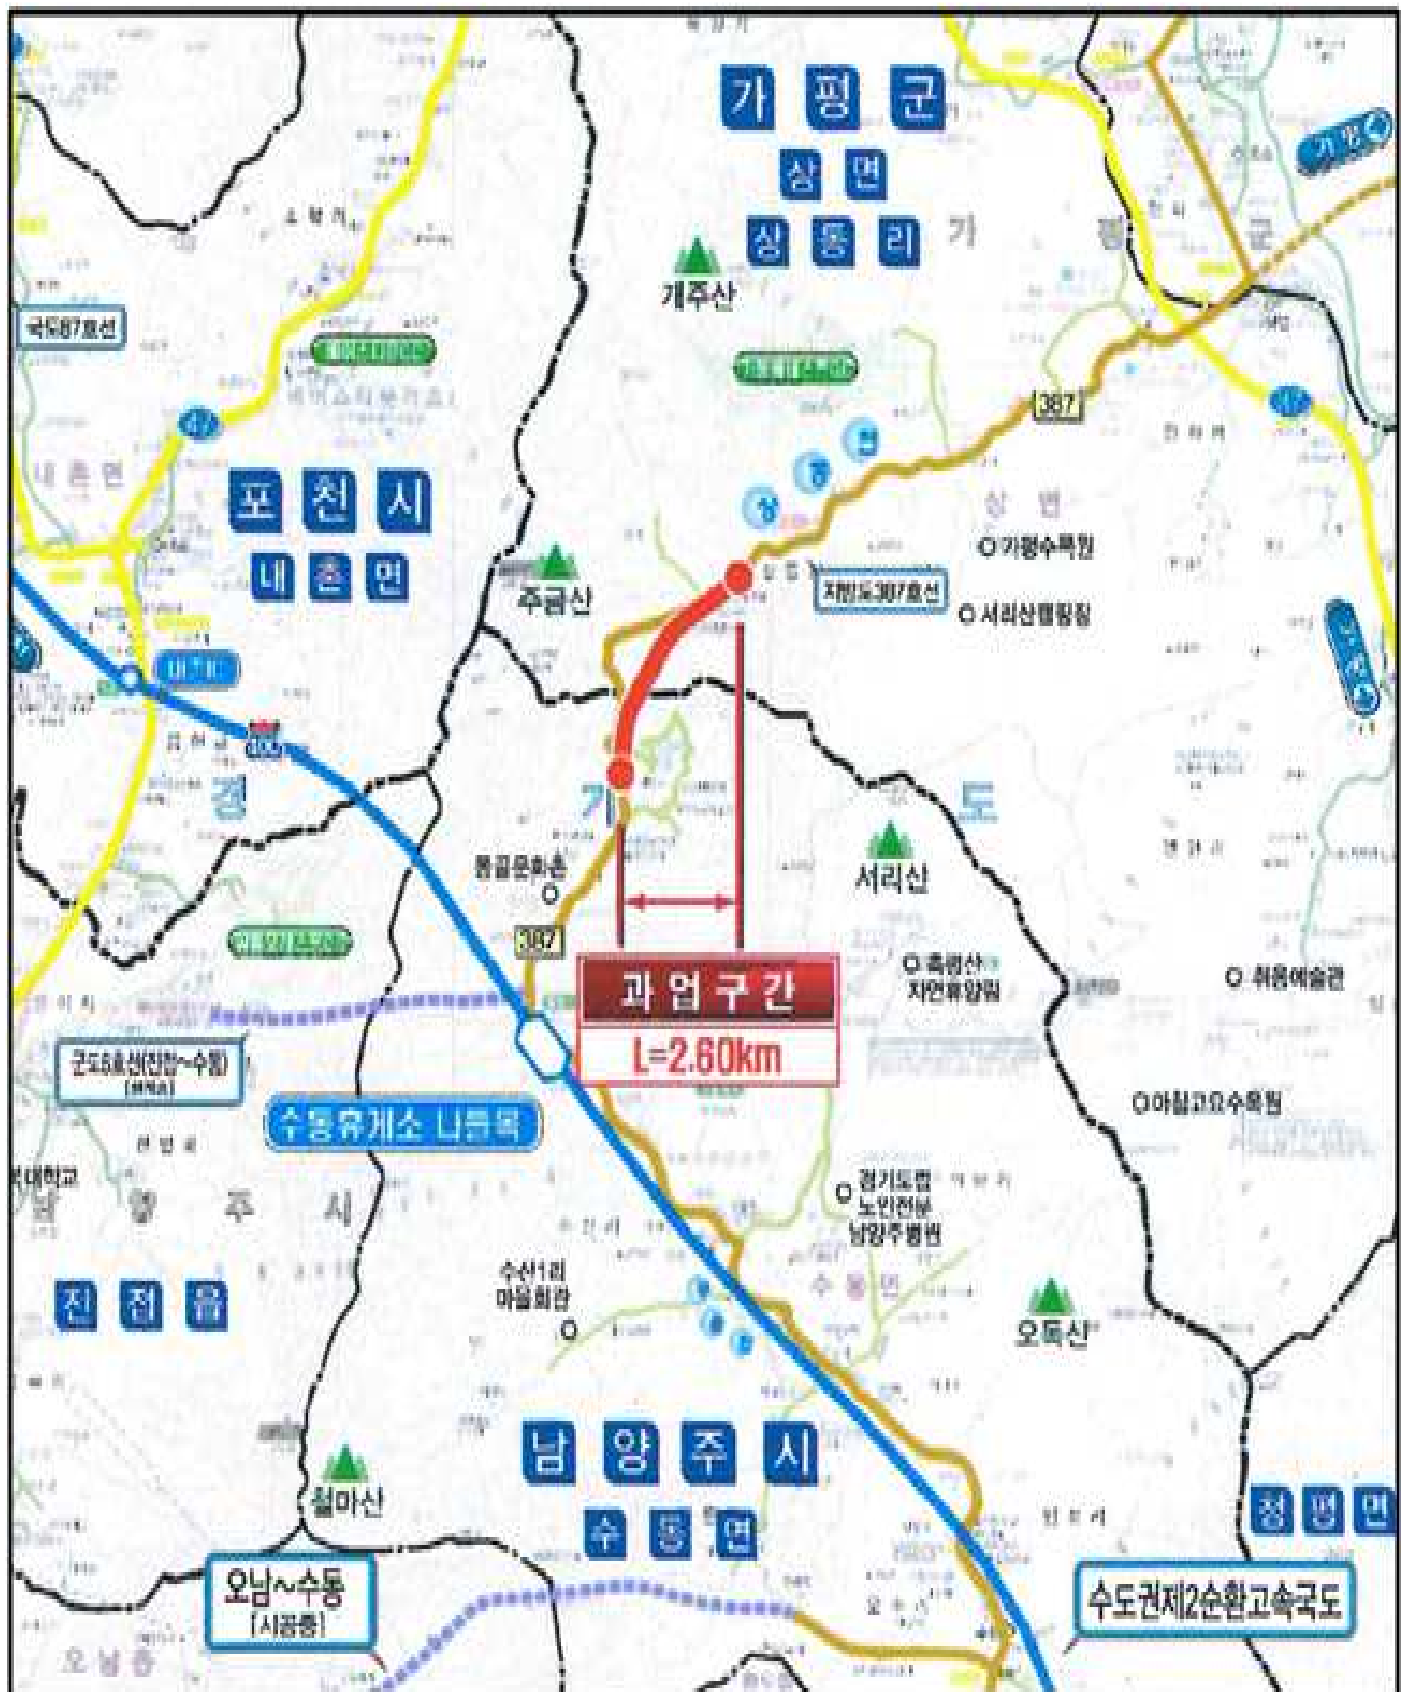

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

하천IC~고성 간 도로 개설사업(호명터널) 확정

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-3	건설	주민안전은 더 세심하게	국토부	계속	장기	임기 외
추진부서	건설도시국 건설과 도로시설팀장 김양섭(2425)					
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	45%

□ 추진방향

- 국도37호선‘신천-삼회’구간은 도로의 평면선형 불량으로 교통사고가 지속적으로 증가되고 있으나 북한강 및 인접 산지 법면부로 인해 기존 국도의 선형개량이 어려움
- 또한 연계되는 국도46호선 및 서울~양양 고속도로의 상습 지정체로 지역주민과 관광객의 불편이 가중되고 있는 실정임
- 이에 국도37호선‘신천~삼회’구간을‘하천IC~가평대교’구간으로 노선을 변경하여 국도의 고유 기능인 지역 간 이동성 제고 및 청평호의 수려한 자연경관 훼손을 방지하고 나아가 청평호 주변도로의 통과교통량 전환으로 국도46호선의 만성적인 교통 정체를 해소하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2030 ※ 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 청평면 하천리 하천IC ~ 청평면 고성리 고성교차로(가평대교)
- 사업규모: 연장(L)=7.4km, 폭원(B)=10.0m (터널 3개소/5.1km)
- 소요예산: 107,300백만원 (99,100백만원) (국비 100%)
- 사업내용: 국도37호선 노선변경 및 개설

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	45
2022 하반기	타당성 조사 및 검토	· 국도37호선 노선변경 타당성 조사 및 검토	20	20
2023		· 국도37호선 노선변경 타당성 조사 및 검토 · 제6차 국도·국지도 5개년계획에 반영토록 지속 건의	20	20
2024	타당성 조사 및 검토 국도 5개년계획 건의	· 제6차 국도·국지도 5개년계획에 반영토록 지속 건의	20	5
2025		· 제6차 국도·국지도 5개년계획에 반영토록 지속 건의	20	
2026 상반기	국도 5개년계획 반영	· 제6차 국도·국지도 5개년계획 반영	20	

□ 추진실적

- 2022. ~ 현재까지: 해당 노선 타당성 근거 마련 중(가평군)
- 2023. 1.: 당정협의회 건의
- 2023. 1.: 국회의원 요구자료 제출(최춘식 국회의원)
- 2023. 3.: 「제6차 국토·국지도 5개년 건설계획」 수요조사 자료 제출(가평군→경기도)
- 2023. 3.: 가평군 광역도로사업 서울청 현장 방문 시 건의
- 2023. 4.: 현안사업 건의(가평군→지역구 국회의원)
- 2023. 4.: 경기북부특별자치도 설치 관련 가평군 사업 건의(가평군→경기도)
- 2023. 5.: 제3차 국토부장관 간담회 가평군 현안사항 건의
- 2023. 5.: 가평군 광역도로사업 서울청 방문 건의
- 2023. 6.: 당정협의회 건의
- 2024. 1.: 국가도로망 계획 대응 경기도 전략 수립용역 착수보고회 참석
- 2024. 3.: 국회 국토교통위원회 방문 건의
- 2024. 5.: 「경기 동부 SOC 대개발」 사업 건의(군→경기도)
- 2024. 5.: 「북한강 권역 경기북부 대개발 관광콘텐츠 개발」 사업 건의(군→경기도)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당 노선은 사업 타당성이 부족하여 현재까지 사업 추진 가능성이 불투명한 노선으로 단기간에 사업 확정은 어려울 것으로 판단됨
- 2023. 3. 「제6차 국토·국지도 5개년 건설계획」 사업에 대한 수요조사 자료를 경기도를 거쳐 서울지방국토관리청에 제출하였으며, 2023.5. 서울지방국토관리청을 방문하여 건의하는 과정에서 국토37호선(하천IC-고성) 노선변경 및 도로개설사업에 대하여 「제6차 국토·국지도 5개년계획(2026~2030)」 대상사업으로 국토교통부에 제출하였고 지선국도 지정 사업으로도 서울청에서 국토교통부에 추가 건의하였음
- 상기 사업이 「제6차 국토·국지도 5개년 건설계획」에 반영되어 추진될 수 있도록 관련부처에 지속적으로 건의 노력하겠음


□ 향후계획

- 2024. 7. ~: 관계기관 지속 건의(예정)

□ 기대효과

- 국토37호선 노선을 변경하여 설악~청평 간 단축도로(터널) 개설로 교통량을 분산시켜 교통 지·정체 해소 및 지역 간 접근성 향상 도모
- 불합리한 국토37호선 노선변경으로 내방객 및 지역주민들에게 안전사고 예방 및 교통편의 제공

□ 위치도 및 노선도

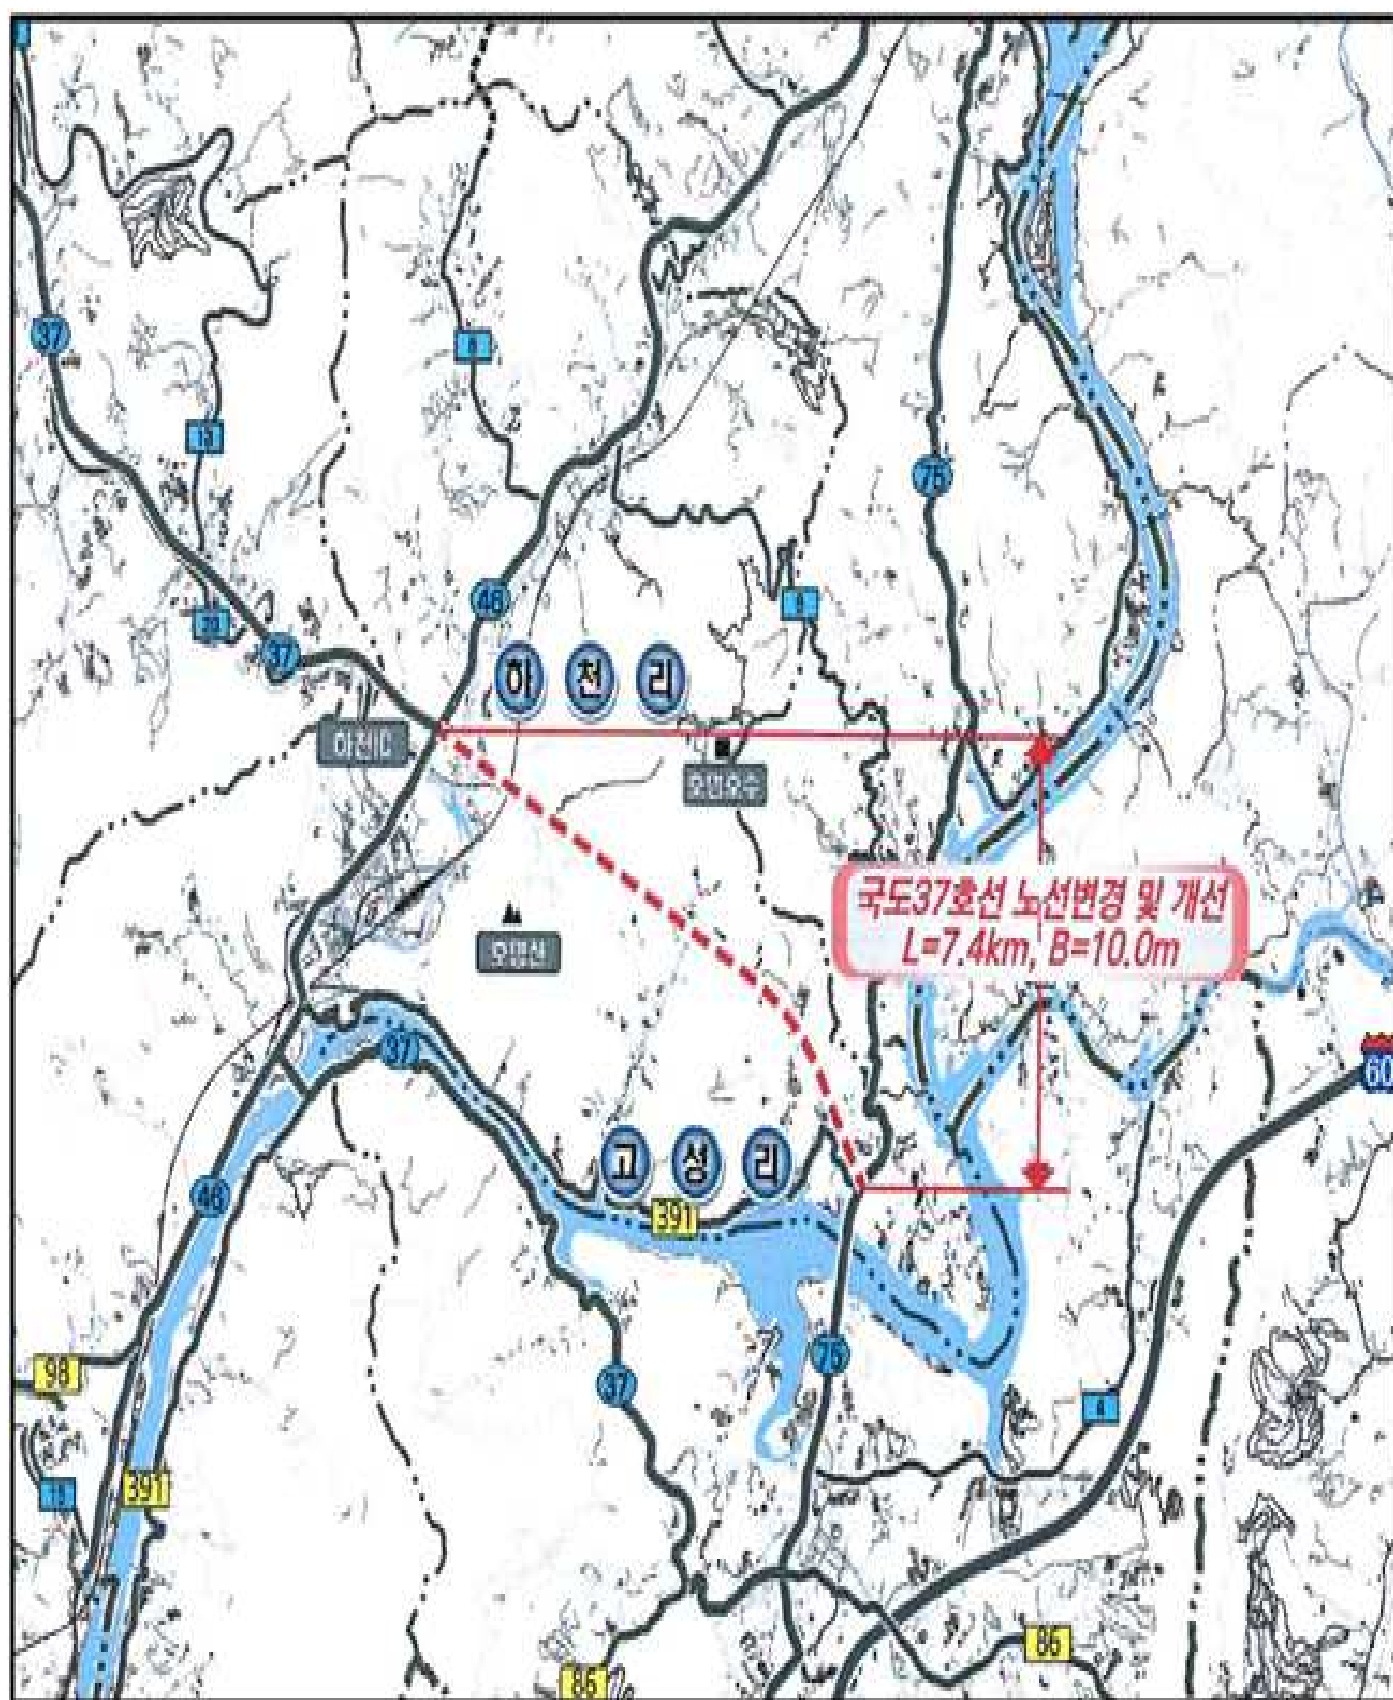

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

국도75호선(가평~목동) 확장사업 착공

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-4	건설	주민안전은 더 세심하게	국토부	계속	중기	임기 외
추진부서	건설도시국 건설과 도로시설팀장 김양섭(2425)					
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	10%

□ 추진방향

- 국도75호선‘가평~목동’구간은 가평읍과 북면을 연결하는 유일한 간선도로로 행락철 및 주말마다 만성적인 교통 체증으로 인해 지역 주민들이 생활에 큰 불편을 겪고 있어 기존 국도 확장 및 개량 사업 추진이 절실한 상황임
- 「제5차 국도·국지도 5개년계획」에 반영되어 현재 추진 중인「국도 75호선(가평-목동) 확장사업」에 대하여 관련부처인 국토교통부와 적극적인 업무협의를 통해 가평군의 건의사항이 최대한 반영될 수 있도록 필요성과 당위성에 대하여 적극 피력하고 공사가 조기에 착공될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2031 ※ 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 가평읍 마장리 농업기술센터 진입로 입구 ~ 북면 목동리 목동삼거리
- 사업규모: 연장(L)=7.3km, 폭원(B)=15.0m
- 소요예산: 40,000백만원 (국비 100%)
- 사업내용: 국도75호선 확장 및 개량

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	10
2022 하반기	타당성 조사 및 검토	· 국도75호선 4차로 확장사업 타당성 조사 및 검토	10	10
2025	기본설계용역 및 실시설계용역 착수	· 기본설계용역 및 실시설계용역 추진	20	
2026	기본설계용역 및 실시설계용역 완료	· 기본설계용역 및 실시설계용역 완료	20	
2027	편입용지보상 추진	· 편입용지보상 추진	20	
2028	편입용지보상 완료, 공사 추진	· 편입용지보상 완료 · 공사 추진	30	

□ 추진실적

- 2022. 7.: 사업계획 변경 건의(가평군→국토부장관)
- 2022. 8.: 사업계획 변경 건의(가평군→국토위 국회의원)
- 2022. 9.: 사업계획 변경 건의(가평군→지역구 국회의원)
- 2023. 1.: 당정협의회 건의
- 2023. 3.: 사업 조속 추진 건의(가평군→서울지방국토관리청)
- 2023. 4.: 현안사업 건의(가평군→지역구 국회의원)
- 2023. 4.: 경기북부특별자치도 설치 관련 가평군 사업 건의(가평군→경기도)
- 2023. 5.: 제3차 국토부장관 간담회 가평군 현안사항 건의
- 2023. 5.: 가평군 광역도로사업 서울청 방문 건의
- 2023. 6.: 당정협의회 건의
- 2023. 8.: 국토부 방문 건의
- 2023.10. ~ 12. : 국회 방문 건의(2회)
- 2024. 3.: 국회 국토교통위원회 방문 건의

□ 추진상 문제점 및 대책

- 국도75호선 가평~목동 구간은 가평읍과 북면을 연결하는 유일한 간선도로로 국토교통부에서 확정한 2차로 개량사업으로 추진 시 만성적인 교통체증 해소에 대한 근본적인 해결책이 될 수 없고 장기간 고통 받고 있는 가평 지역 주민들의 생활 불편을 조속히 해소하기 위해 신속한 사업추진이 절실한 상황임
- 가평군에서는 사업효과의 극대화를 위해 국토교통부에서 기본 및 실시설계용역 추진 시점에 마장리부터 노루목고개 3.7km 구간만 우선 4차로 확장사업으로 변경하는 안을 건의할 계획임
- 다만, '23년도부터 국토교통부, 서울지방국토관리청, 국회 등을 방문하여 해당 사업 실시설계 용역비가 반영되어 조속히 추진될 수 있도록 지속적으로 건의하였으나, 현재까지 예산에 미확보된 실정임
- 향후 국토교통부, 서울지방국토관리청 등에 지속적으로 방문, 건의하여 사업이 조속히 추진될 수 있도록 적극 노력하고자 함


□ 향후계획

- 2024. 4. ~: 관계기관 지속 건의(예정)

□ 기대효과

- 기존 국도 확장을 통한 만성적 교통 체증 및 통행 불편 해소
- 지역 간 접근성 향상으로 지역경제 활성화를 도모하고 주민 편의 증진
- 제2경춘국도 통과노선 배제에 따른 가평읍, 북면 지역주민들의 불만 해소

□ 위치도 및 노선도

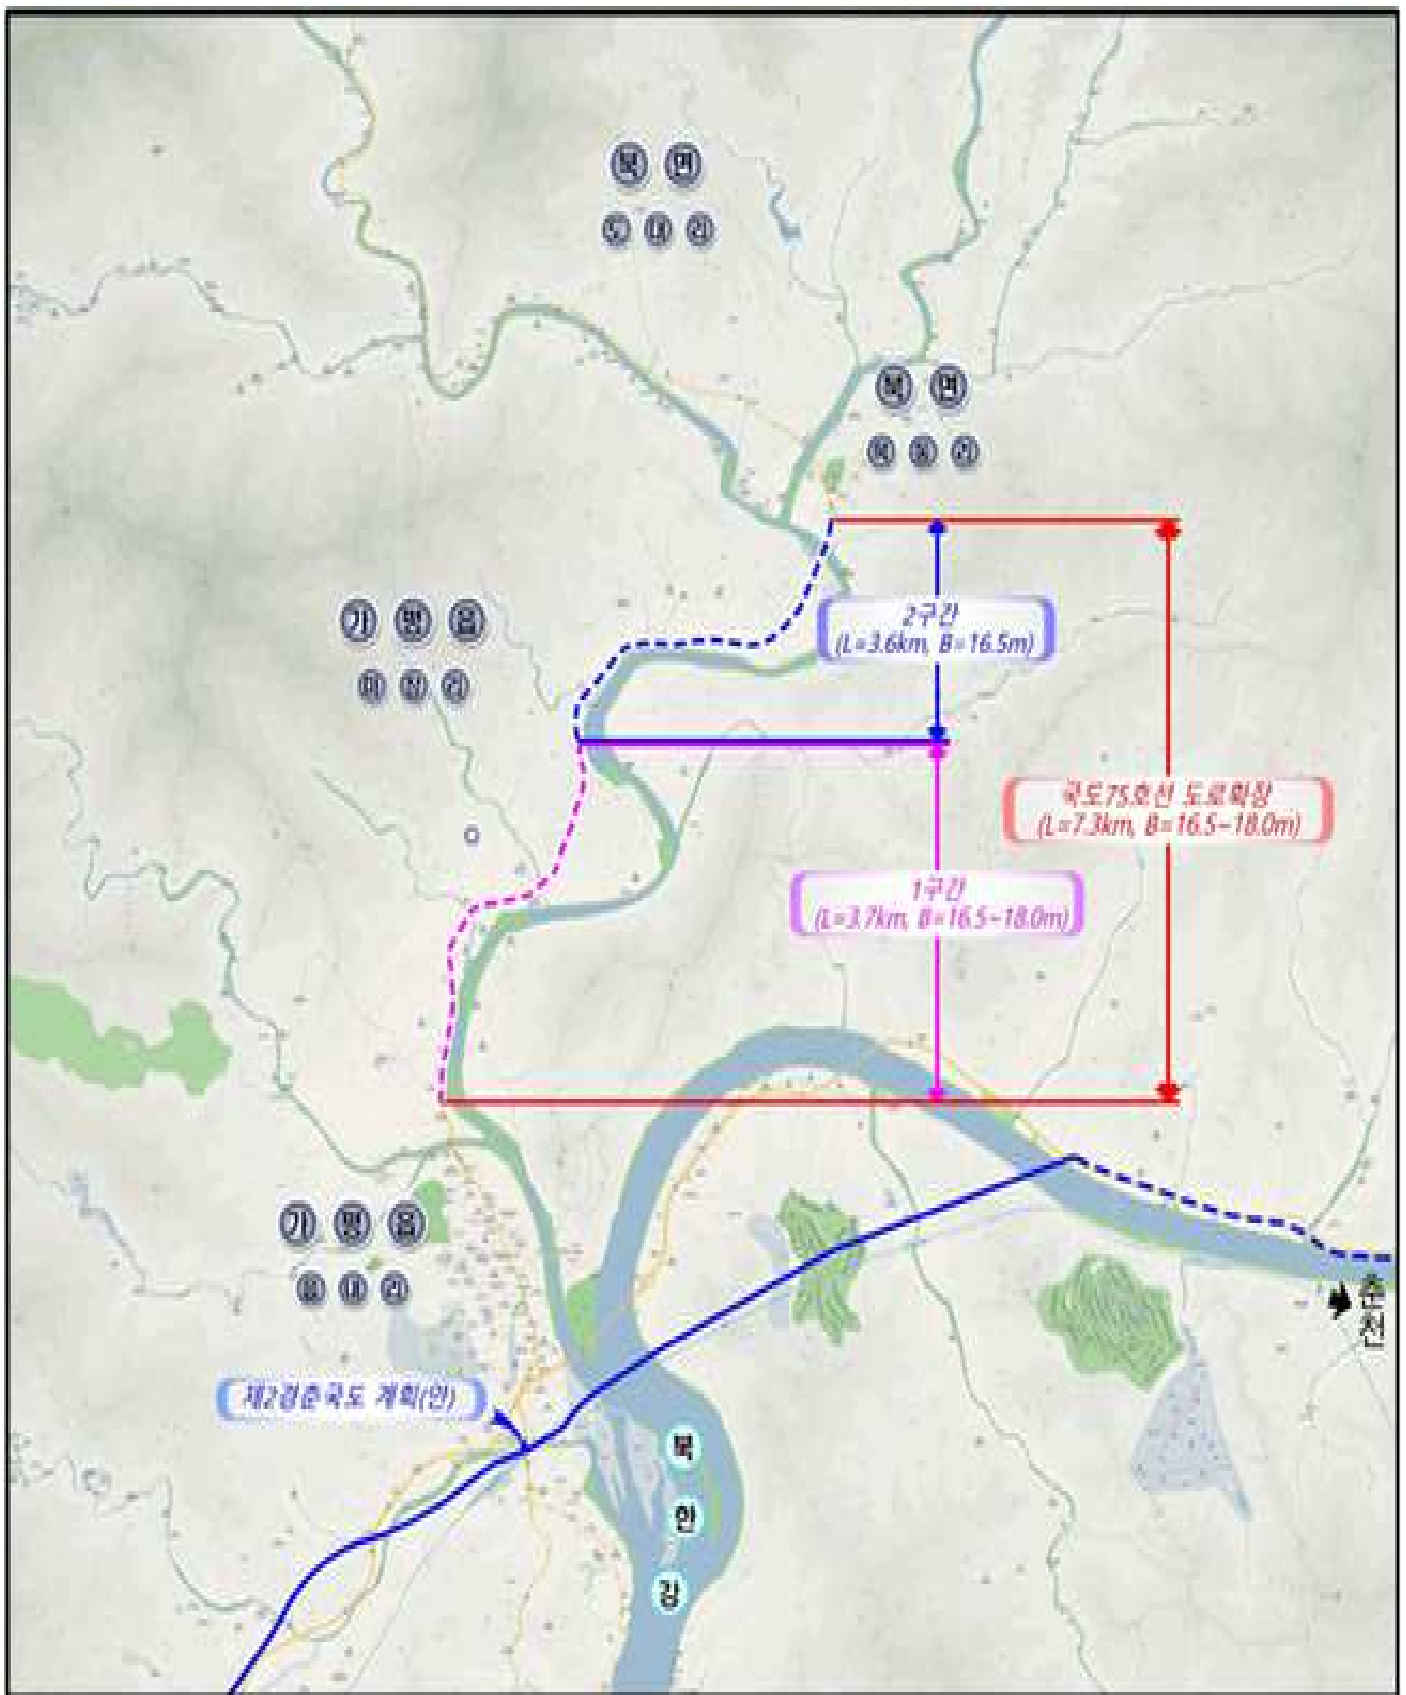

□ 추진실적

- 2022. 7.: 현안사업 건의(가평군→경기도지사)
- 2022. 9.: 현안사업 건의(가평군→지역구 국회의원)
- 2023. 5.: 경기북부특별자치도 설치 관련 가평군 사업 건의(가평군→경기도)
- 2023. 9.: 경기북부특별자치도 비전 추진 전략 도로분야 선정
※ 격자형 도로망 : 동서축 노선으로 상판-적목 노선 선정
- 2024. 3.: 제4차 경기도 도로건설계획 수립 용역 착수보고회 참석
- 2024. 3.: 제4차 경기도 도로건설계획 수요조사 자료 제출(가평군→경기도)
- 2024. 5.: 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 건의(군→경기도)
- 2024. 5.: 「북한강 권역 경기북부 대개발 관광콘텐츠 개발」 사업 건의(군→경기도)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당 노선은 「자연환경보전법」에 따라 생태·경관 보전지역으로 지정 고시되어 일반인들에게 행위 제한하는 환경적 보전가치가 많은 지역으로 도로개설로 자연환경 훼손이 이루어질 경우 환경보전을 옹호하는 환경단체, 마스크 등에 노출되어 다수의 민원으로 사업 추진에 난항이 예상되지만,
- 해당 도로가 개설 될 경우 순환도로망이 구축되어 조종면 북면 간 이동시간 단축 및 교통량 분담효과 등의 긍정적인 면이 크므로 가평군에서 추진 중인 「광역교통망 수립 용역」으로 본 노선에 대한 사업 타당성 근거를 마련함.
- 현재 「제4차 경기도 도로건설계획(2026~2030)」 수요조사 시 해당 노선을 건의하였으며, 해당 사업이 반영 추진 될 수 있도록 경기도에 지속적으로 건의하겠음.


□ 향후계획

- 2024. 7. ~: 관계기관 지속 건의(예정)

□ 기대효과

- 가평군 동서관통도로 구축에 따른 지역 접근성 향상 및 가평군 순환도로 구축에 따른 조종면~북면 간 접근성 향상
- 지역 간 이동거리(시간) 단축에 따른 도로이용자들의 간접비용 감소와 관광객 및 지역주민들의 불편 해소를 통한 지역경제 활성화 효과 기대

□ 위치도 및 노선도

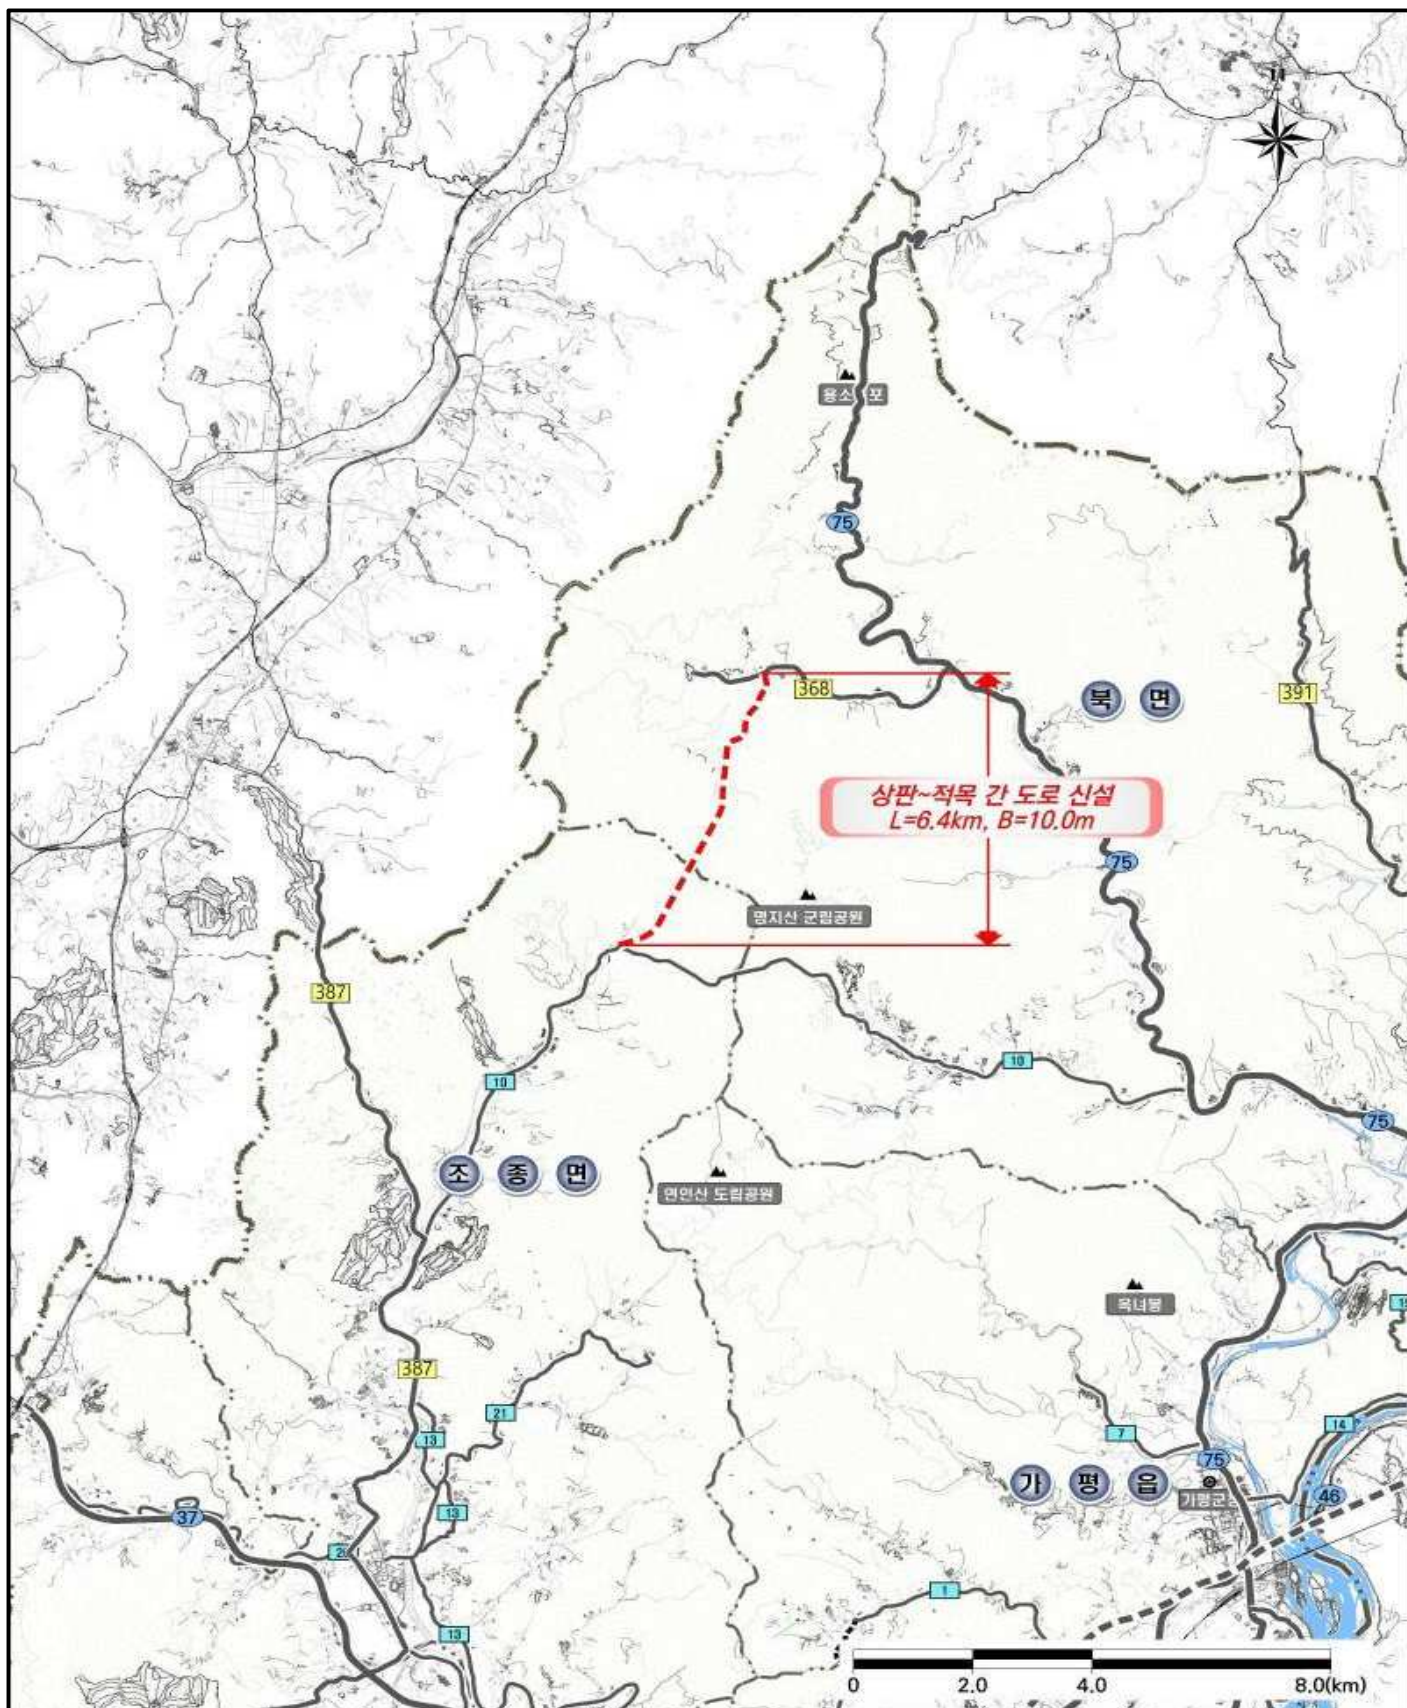

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장 동력의 발판을 마련하겠습니다.

두밀~대보 간 2차선 도로 개설사업 확정

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-6	건설	주민안전은 더 세심하게	경기도	계속	장기	임기 외
추진부서	건설도시국 건설과 도로시설팀장 김양섭(2425)					
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	45%

□ 추진방향

- 가평군 동서관통도로 부재로 가평읍과 상·조종면이 단절되고 지역 간 교류가 불편함에 따라 지역균형발전과 내방객 및 지역주민들에게 교통편의를 제공하기 위해 지방도364호선 신설이 절실히 필요한 실정임
- 현재 「장기미추진 지방도사업」으로 관리되고 있는 「두밀~대보 2차선도로(지방도 364호선) 개설사업」에 대해서 관련부처인 경기도에 도로 신설에 대한 타당성과 당위성을 적극 피력하여 「제4차 경기도 도로건설계획(2026~2030)」에 높은 투자우선순위로 반영되어 추진될 수 있도록 지속적으로 건의하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 2003 ~ 2030 ※ 사업 전체 완료시점 기준
- 사업위치: 가평읍 상색리 ~ 조종면 현리 아래 회전교차로
- 사업규모: 연장(L)=8.5km 폭(B)=10.0m
- 소요예산: 126,600백만원(181,200백만원) (도비 100%)
- 사업내용: 지방도364호선 신설

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	45
2022 하반기	타당성 조사 및 검토	· 지방도364호선 도로신설 타당성 조사 및 검토	20	20
2023	타당성 조사 및 검토 도로건설계획 건의	· 지방도364호선 도로신설 타당성 조사 및 검토 · 제4차 경기도 도로건설계획에 반영토록 지속 건의	20	20
2024	도로건설계획 건의	· 제4차 경기도 도로건설계획에 반영토록 지속 건의	20	5
2025		· 제4차 경기도 도로건설계획에 반영토록 지속 건의	20	
2026 상반기	도로건설계획 반영	· 제4차 경기도 도로건설계획에 반영	20	

□ 추진실적

- 2022. 6.: 장기미추진 지방도사업 정비방안 수립용역 착수(경기도)
- 2022. 7.: 장기미추진 지방도사업 정비방안 수립용역 착수보고회 개최(경기도)
- 2022. 7.: 현안사업 건의(가평군→경기도지사)
- 2022. 9.: 현안사업 건의(가평군→지역구 국회의원)
- 2023. 1.: 당정협의회 건의
- 2023. 2.: 장기미추진 지방도사업 정비방안 검토의견서 자료 제출(가평군→경기도)
- 2023. 2.: 현안사업 건의(가평군→경기도 행정2부지사)
- 2023. 3.: 현안사업 건의(가평군→경기도의원)
- 2023. 4.: 현안사업 건의(가평군→지역구 국회의원)
- 2023. 5.: 경기북부특별자치도 설치 관련 가평군 사업 건의(가평군→경기도)
- 2023. 6.: 당정협의회 건의
- 2023. 8.: 경기북부시장군수 협의회 사업 추진 건의
- 2023. 9.: 경기북부특별자치도 비전 추진 전략 도로분야 선정
 - ※ 격자형 도로망 : 동서축 노선으로 지방도364호선(가평-현리) 노선 선정.
- 2023.12.: 장기미추진 지방도사업 정비방안 수립 고시(경기도)
 - ※ 지방도364호선 가평-현리 도로개설사업 재추진(재검토) 결정.
- 2023.12.: 현안사업 건의(가평군→경기도 부지사)
- 2024. 3.: 제4차 경기도 도로건설계획 수립 용역 착수보고회 참석
- 2024. 3.: 제4차 경기도 도로건설계획 수요조사 자료 제출(가평군→경기도)
- 2024. 5.: 「경기 동부 SOC 대개발 구상」 사업 건의(군→경기도)
- 2024. 5.: 「북한강 권역 경기북부 대개발 관광콘텐츠 개발」 사업 건의(군→경기도)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 경기도에서는 '22. 6월 장기 보류되고 있는「지방도364호선 가평-현리 노선」에 대하여 경제성 등이 부족하다는 이유로 일몰사업을 염두에 둔 재검토 용역을 착수함
- 이에 건설과에서는 자체적으로 노선을 분석하여 투자사업비를 대폭 절감시킨 합리적인 대안을 경기도에 제시하였으며, 사업의 당위성을 경기도에 적극 피력하는 등 사업 재추진에 각별히 신경을 쓴 결과, 최종적으로 가평군에 꼭 필요한 지방도 개설사업 재추진을 관철시키는 큰 성과를 거둠.
- 현재 「제4차 경기도 도로건설계획(2026~2030)」 수요조사 시 해당 노선을 건의하였으며, 해당 사업이 반영 추진 될 수 있도록 경기도에 지속적으로 건의하겠음.


□ 향후계획

- 2024. 7. ~: 관계기관 지속 건의(예정)

□ 기대효과

- 가평군 동서관통도로 구축에 따른 지역 접근성 향상으로 지역균형발전 도모
- 수도권제2순환고속도로 및 지방도387호선 연계교통망 구축으로 교통량을 분산하여 국도46호선의 만성적인 교통 지·정제 해소 및 내방객과 지역주민들에게 교통편의 증진 도모

□ 위치도 및 노선도

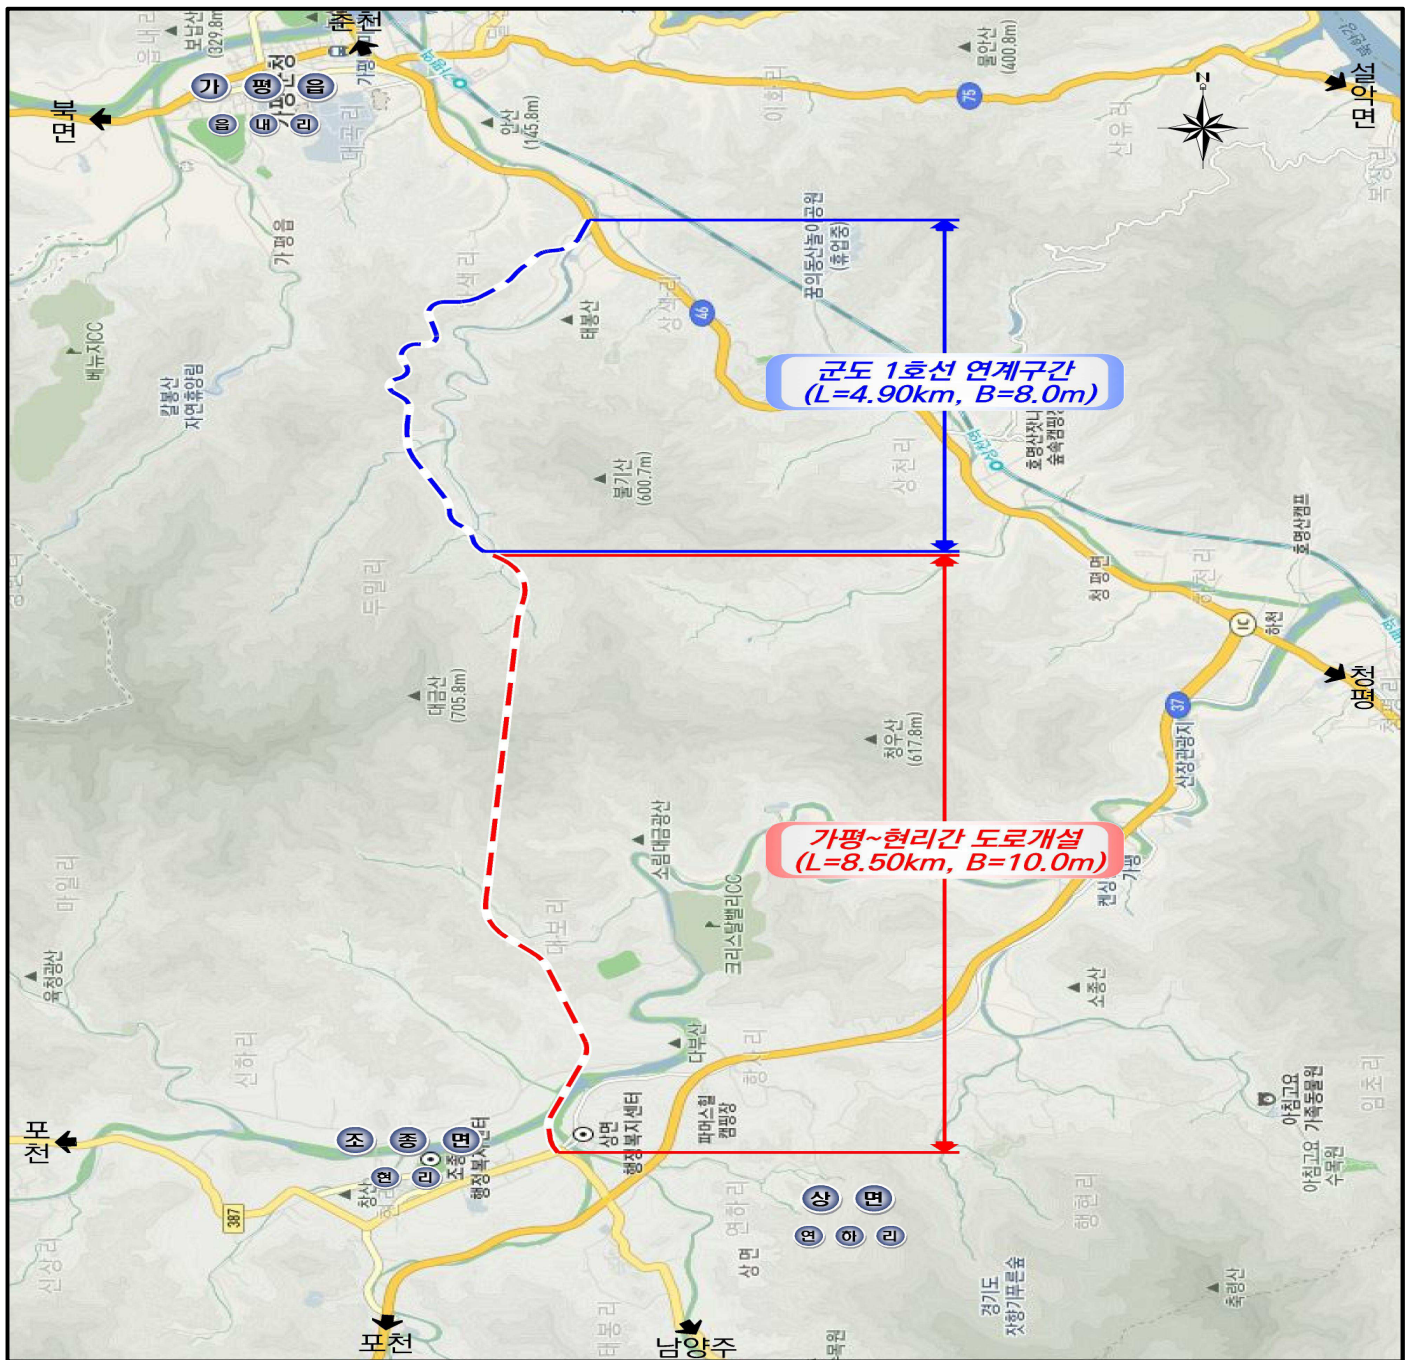

환 경 정 책 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
3개 사업						100%	
IV-6	가평군 재정여건 개선을 위한 한강수계관리기금 추가확보	가평군	신규	2026 (임기내)	완료	100	
V-9	전기차 충전 인프라 확대	가평군	신규	2026 (임기내)	이행후 계속	100	
VII-3	환경부 대응 환경정책자문위원회 설치 · 운영	가평군	신규	2026 (임기내)	이행후 계속	100	

약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 10만의 자족도시를 완성하겠습니다.

가평군 재정여건 개선을 위한 한강수계관리기금 추가확보

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅳ-6	환경	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	환경정책과	한강수계팀장	최진수(2445)	담당자	김미애(2447)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 한강수계기금 추가확보를 통한 가평군 재정여건 개선 및 균형있는 지역발전 도모

□ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 계속
- 사업위치: 가평군 일원
- 사업규모: 한강수계관리기금 대상사업 (주민지원, 친환경청정, 하수도, 기타분야)
- 기금확보계획: **104,385백만원** ※ 확보예산: 총 32,223백만원(22년: 14,909, 23년: 17,314)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	104,385		86,385	14,909	17,314	18,642	17,520	18,000	18,000	
국비										
도비										
군비										
기타	104,385		86,385	14,909	17,314	18,642	17,520	18,000	18,000	기금

○ 사업내용

- 주민지원사업(특별지원), 친환경 청정사업의 공모신청으로 사업비 추가 확보
- 사업비 증액을 위한 법률개정 요구

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	공모사업 선정 추진	· 부서별 공모사업 신청 · 사업비 증액을 위한 법률 개정 검토	-	-
2023	공모사업 선정 추진 신규사업 추가 발굴	· 부서별 공모사업 신청 및 추가사업 발굴 · 사업비 증액을 위한 법률 개정 요청	35	35
2024	공모사업 선정 추진	· 부서별 공모사업 신청 · 사업비 증액을 위한 법률 개정 요청	25	65
2025			25	
2026 상반기			15	

□ 추진실적

○ 2022. 9.: 2023년도 한강유역환경청공모사업 선정

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	기금 확보액	비 고
계	4개 사업	2,332.3	
특별지원	설악 반다비 문화체육센터 건립	1,000.0	
"	청평면 대성리 오수관로 설치사업	412.3	기금:지방비=7:3
"	보납산-늪산 생태통로 연결사업	200.0	
친환경 청정	친환경 평생학습관 건립	720.0	기금:지방비=6:4

○ 2022.12.: 한강수계관리기금 지원비 증액을 위해 특별대책지역 수질보전정책협의회 등에 제도개선 개정 건의

○ 2023. 3.: 한강유역환경청 '24년도 친환경청정사업 공모사업 사업계획서 제출(2건)

○ 2023. 7.: 한강유역환경청 '24년도 우수 주민지원 특별지원 공모사업 사업계획서 제출(3건)

○ 2023.10.: 2024년도 한강유역환경청공모사업 선정

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	기금 확보액	비 고
계	2개 사업	5,577.0	
특별지원	청평면 종합사회복지회관 건립	3,400.0	
친환경 청정	친환경 평생학습관 건립	2,177.0	

○ 2024. 3.: 한강유역환경청 '25년도 친환경청정 공모사업 사업계획서 제출

(단위: 백만원)

구분	사 업 명	기금	비 고
계	5개 사업	7,399.0	
친환경 청정	친환경 평생학습관 건립	4,303.0	평생교육사업소
친환경 청정	가평문화예술회관 친환경 리모델링	2,014.0	문화체육과
친환경 청정	탄소중립을 위한 하수도시설 태양광설비 확충	522.0	하수도사업소
친환경 청정	하수처리구역 배수설비 설치공사	180.0	하수도사업소
친환경 청정	친환경 산림문화 활성화 지원센터 건립	380.0	산림과

○ 2024. 5.: 친환경 청정사업 예산 조정에 따른 1,000백만원 추가확보(3,177백만원)

※ 2024년 한강수계관리기금 최종 18,642백만원 확보

[사업비 확보현황]

(단위: 백만원)

사업분야	사 업 명	2022년	2023년	당초	2024년 추가확보 (‘24.5.20.)	최종	비고
	계	14,909	17,314	17,487	1,155	18,642	
주민 지원 사업	주민지원사업(일반지원)	4,386	4,171	3,988	-	3,988	
	주민지원사업(특별지원)	-	1,612	3,400		3,400	
	주민지원사업 평가 및 DB지원	72	81	69	12	81	
하수도 분야	환경기초시설 설치	3,622	2,703	457	-	457	
	환경기초시설 운영	6,443	7,296	7,173	-	7,173	
	수질자동측정감시장치 설치	-	330	-	-	-	
친환경청정	친환경청정사업	-	720	2,177	1,000	3,177	
기 타	오염총량관리사업	132	130	146	-	146	
	비점오염저감사업	21	42	49	-	49	
	댐 부유물 운반처리 비용	43	31	28	-	28	
	하천변 쓰레기 수거사업	190	198	-	143	143	

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 사업비 증액을 위한 법률개정 및 제도개선 지속 건의
 - 한강수계관리기금의 많은 비중을 차지하는 주민지원사업과 하수도분야 사업규모 확대를 위해 주민지원사업비 배분비율 증가의 법률화, 환경기초시설 지원비율 증대 등을 지속적으로 건의 예정

□ 기대효과

- 상수원관리지역 주민의 생활환경개선 및 각종 수질개선사업 지원을 통한 팔당상수원 수질 보전 및 가평군 지역발전 도모

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

전기차 충전 인프라 확대

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-9	환경	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	환경정책과	대기관리팀장	김민모(2440)	담당자	남가운(2443)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- 전기차 충전 인프라 확대로 전기차 보급 촉진 및 친환경 도시 구축
- 기존 내연 기관차량의 효과적인 전기차 전환 유도로 차량에서 배출되는 대기오염물질 저감 및 탄소중립 실현

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 계속
- 사업위치: 가평군 관내
- 사업규모: 20대/년
- 소요예산: 비예산
- 사업내용: 전기자동차 충전시설 확충

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	20대	· 공공부분 전기차 충전시설 확대	20	20
2023	20대	- 전기자동차 충전인프라 구축사업 지원 신청(환경부, 경기도) - 전기자동차 충전인프라 구축사업 재원마련을 위한 기금 등 신청	20	20
2024	20대	- 한국전력공사 등 전기차 충전시설 설치를 위한 관련기관 협업 추진	20	60
2025	20대	· 민간 공중이용시설 전기차 충전시설 확대 - 충전시설 설치 의무대상 기축시설에 대한 충전시설 설치 추진	20	
2026 상반기	20대	- 신규 건축물의 전기차 충전시설 등의 설치 안내 및 권고	20	

□ 추진실적

○ 2022.12.: `22년 경기도 전기차 충전인프라 구축 지원사업 선정

설치유형	설 치 장 소	수량(대)	비 고
급속 충전시설	설악면 공영주차장(1)	1	

○ 2022.12.: 전기차 충전시설 설치 의무 대상 공공·공중이용시설 설치 현황 파악 및 설치 안내
- 총 86개소(공공기관 48개소, 공중이용시설 21개소, 공동주택 17개소)

- 2023. 2.: `23년 전기자동차 공용 완속충전시설 설치 신청 홍보 안내
- 지원대상 : 공동주택, 사업장, 대규모 주차장 등의 소유 및 운영 주체 모두 신청 가능
- 2023. 5.: `23년 한국전력공사 공용 전기차 충전소 구축 사업 수요 신청(가평읍 택시쉼터외 5개소)
※ 한국전력공사 사업 타당성 조사 결과 최종 미선정
- 2023. 6.: `23년 경기도 전기차 충전인프라 구축 지원사업 선정

설치유형	설 치 장 소	수량(대)	비 고
듀얼 충전시설	가평군 보건소(1), 청평역 공영주차장(1), 운악산 공영주차장(1), 산장관광지(1), 상면생활체육공원(1)	5	

○ 2023.10.: `23년 환경부 공공급속충전시설 설치 사업 선정

설치유형	설 치 장 소	수량(대)	비 고
급속 충전시설	가평군 눈썰매장(1), 북면생활체육공원(1), 음악역1939 주차장(3), 조종면 청소년문화의집(2)	7	

○ 2024. 1.: `24년 환경부 전기자동차 공공급속충전시설(상천역 공영주차장 외 4개소) 및
경기도 전기자동차 충전인프라 구축사업 설치 신청(상천역 공영주차장 외 5개소)

○ 2024. 4.: `24년 경기도 전기자동차 충전인프라 구축사업 선정

설치유형	설 치 장 소	수량(대)	비 고
급속 충전시설	상천역 공영주차장	1	듀얼

※ 관내 전기차 충전시설 설치현황 (단위: 대)

구분	유형	임기 전	임기 중			민선8기 증감	비고
		`22.6.	`22.12.	`23.12.	`24.6.		
계		187	235	439	515	328(증)	
민간		154	202	364	439	285(증)	
공공	급속	7	9	36	47	40(증)	
	듀얼	22	16	17	17	5(감)	
	완속	4	8	22	12	8(증)	

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

- 충전시설 미설치 다중이용 공공시설 충전시설 설치 추진
- 충전시설 설치 지원 홍보 및 안내를 통한 민간 충전시설 보급 확대 등

□ 기대효과

- 차량 운행 중 CO2 및 대기오염물질 배출이 없는 전기자동차의 보급 확대로 대기환경 개선 및 친환경 도시 구축
- 친환경 관광도시 이미지 제고로 관광산업 및 지역경제를 활성화함은 물론 친환경 도시 브랜드 창출

약속Ⅶ 군민의 눈높이에서 일 잘하는 가평군이 되겠습니다.

환경부 대응 환경정책자문위원회 설치 · 운영

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅶ-3	환경	주민참여는 더 활발하게	가평군	신규	단기	임기 내
추진부서	건설도시국	환경정책과	환경정책팀장	정상호(2240)	담당자	정재현(2241)
추진현황	□완료 ■이행후계속 □정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 100%

□ 추진방향

- 군정 발전을 위한 환경규제 및 갈등요인 해결을 위해 환경부 대응 환경정책자문위원회 설치
- 환경활동가 등 학식과 경험이 풍부하고 군민의 신망이 두터운 사람을 위원으로 위촉하여 환경정책자문위원회의 설치 및 운영

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 하반기 ~ 계속
- 사업규모: 위원회 구성(20명 이내)
- 소요예산: 53백만원(군비)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	53		53		24	7	11	11		
국비										
도비										
군비	53		53		24	7	11	11		
기타										

- 사업내용: 환경정책자문위원회 설치 및 운영

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022. 하반기	위원회 설치 및 구성	· 위원회 설치계획 수립 · 위원회 관련 조례 제정 및 시행	50	50
2023. 상반기 이후 계속	위원 선정 및 활동	· 자문위원 선정 등 위원회 구성 및 위촉 · 위원회 개최 및 운영	50	50

□ 추진실적

- 2022.12.: 「가평군 환경정책자문위원회 설치 및 운영조례」제정 및 시행
- 2022.12. ~ 2023. 2: 가평군 환경정책자문위원회 위원 선정 및 위촉 완료
- 2024. 1.: 가평군 환경정책자문위원회 위원 2명 추가 위촉
- 2024. 4.: 가평군 환경정책자문위원회 위원 1명 해촉

※ 가평군 환경정책자문위원회 운영 결과

차수 계	일자 5회	참석현황	주요안건
'23년 1차	'23.02.24.	14/16	· 공동위원장 및 부위원장 선출 · 가평군 환경계획(안) 보고 및 자문
'23년 2차	'23.05.25.	10/16	· 토지 등 매수 및 수변녹지 조성·관리 업무처리지침 개정 · 한강수계관리기금 운용규칙 개정 · 2024년 공공하수도분야 신규 국고보조사업 신청
'23년 3차	'23.09.12.	10/16	· 가평군 2050탄소중립녹색성장위원회 기능 대행 · '24년 한강수계관리기금 공모사업 신청
견학	'23.10.31	9/16	· 금강유역 물 관리 및 생태공원 견학 및 간담회
'23년 4차	'23.12.14.	8/16	· '24년 환경정책자문위원회 자문안건 추진 보고 및 자문
'24년 1차	'24.03.29.	10/18	· '25년 한강수계관리기금 공모사업 신청 · '25년 공공하수도 분야 신규 국고보조사업 신청 · '23년 가평군 기후위기 적응대책 이행점검 심의
'24년 2차	'24.06.26.	12/17	· 하수처리구역 내(內) 수변구역 해제 건의 · '25년 한강수계관리기금 특별지원 공모사업 신청

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 기대효과

- 특별대책지역, 수변구역 등 규제 및 급변하는 환경정책 대응 역량 강화
- 역량 있는 민간 자문위원과의 환경정책 네트워크 구축

자 원 순 환 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						50%	
V-10	친환경 자원회수시설(소각) 설치	가평군	신규	2028 (임기외)	정상추진	50	

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

친환경 자원회수시설(소각) 설치						
관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-10	환경	주민안전은 더 세심하게	가평군	신규	장기	임기 외
추진부서	건설도시국	자원순환과	자원시설팀장	김성훈(2530)	담당자	이근용(2534)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	50%

□ 추진방향

- 입지: 「폐기물시설촉진법」에 따른 입지 선정으로 투명성 확보
- 시설: 안정적·친환경·자원회수에 유리한 시설의 설치
- 운영: 안전한 시설 운영을 통하여 주민의 휴식, 재생산 공간으로 활용

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 3. ~ 2028. 12.
- 사업위치: 가평읍 상색리 산67-3번지 일원(최종후보지)
- 사업규모: (소각규모) 85톤/일 (생활폐기물 70톤/일 + 하수슬러지 15톤/일)
- 소요예산: 76,845백만원 (국비 22,635백만원, 지방비 20,685백만원, 민간 33,524백만원)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	76,845		16,087					16,087	60,758
국비	22,635		3,611					3,611	19,024
도비	6,985		1,114					1,114	5,871
군비	13,701		2,186					2,186	11,515
기타	33,524		9,176					9,176	24,348 민간

※ 불변가격 적용 시 총사업비 69,865백만원, 주민편익시설 설치비 별도

- 사업내용
 - 2023.: 입지타당성 조사 및 환경영향평가를 통한 입지 분석, 사업추진방식 결정
 - 2024. ~ 2026.: 입지선정, 부지매입, 민간투자사업자 선정, 자원협의를, 관련인허가
 - 2026. ~ 2028.: 소각시설 설치공사 및 시험가동

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	50
2022 하반기	입지 후보지에 대한 평가 실시	· 2022.08: 후보지 입지타당성 조사 용역 계약 · 2022.08: 전략환경영향평가 계약심사 및 계약	10	10
2023	입지선정 절차 진행	· 2023.05: 3차 입지선정위원회 개최 · 2023.06: 4차 입지선정위원회 개최 · 2023.08: 5차 입지선정위원회 개최 · 2023.08: 전략환경영향평가 초안 작성 완료 · 2023.08: 주민의견수렴(공람 및 주민의견제출) · 2023.10: 주민설명회 개최 · 2023.10: 전략환경영향평가서 협의(한강유역청) · 2023.12: 사업추진방식 결정	30	30
2024	입지선정, 민간투자사업 적정성 검토	· 2024.01: 민간투자사업 제안서 접수 · 2024.04: 전략환경영향평가서 협의(한강유역청) · 2024.04: 폐기물처리시설(소각)입지 결정·고시 · 2024.06: 제안서 검토 의뢰(PIMAC 및 검토기관)	15	10
2025	사업시행자 선정	· 2025.04.: 민간투자사업 추진결정 · 2025.04.: 제3자 제안 공고 · 2025.11.: 실시협약 체결 및 사업시행자 지정	15	
2026 상반기	공사 착공	· 2026.03: 통합환경허가 완료 · 2026.03: 실시계획 승인 · 2026.06: 공사착공	10	
임기후	공사 준공	· 2028.12: 공사 준공	20	

※ 비율은 행정소요기간과 예산 투자율 등을 검토하여 산정

□ 추진실적

○ 소각시설 입지선정을 위한 절차 진행 중

- 2022. 7.: 제1차 입지선정위원회 개최(입지후보지 검토)
- 2022. 8.: 제2차 입지선정위원회 개최(타당성조사기관 선정)
- 2022. 9.: 전략환경영향평가 용역 착수
- 2022. 9.: 입지타당성조사 용역 입찰 공고
- 2022.10.: 입지타당성조사 용역 착수
- 2023. 5.: 입지선정위원회 3차 회의 개최(대체후보지 2개소 선정)
- 2023. 6.: 입지선정위원회 4차 회의 개최(입지후보지 배점기준 결정)
- 2023. 8.: 입지선정위원회 5차 회의 개최(후보지 평가 및 최종후보지 선정)
- 2023. 8.: 전략환경영향평가서 초안 제출 (가평군 → 한강유역환경청)
- 2023. 9.~ 10.: 전략환경영향평가 초안 공람 및 주민설명회 개최

- 2023.10.: 전략환경영향평가서(초안) 의견 회신(한강유역환경청 → 가평군)
- 2023.12.: 사업추진 방식 결정을 위한 소통회의 개최(민간투자사업 추진)
- 2024. 1.: 민간투자사업 사업제안서 접수 및 보완 요청
- 2024. 2.: 전략환경영향평가서 제출 (가평군 → 한강유역환경청)
- 2024. 4.: 전략환경영향평가 협의 완료
- 2024. 4.: 주민설명회 개최
- 2024. 4.: 자원회수시설(소각) 입지 결정·고시 완료
- 2024. 6.: 민간투자사업 사업제안서(보완) 접수

□ 추진상 문제점 및 대책

- 소각시설 설치에 대한 부정적 인식 및 상색리 태양광 발전시설 등으로 인근 지역주민들의 반발 제기
 - ▶ 지역주민 인식전환을 위해 타 지자체 유사시설 견학 및 지역주민 지속적 협의 추진 등을 통한 지역인 유대 강화

□ 향후계획

- 2024. 7.: 민간투자사업 제안서 보완 완료 및 제안서 검토 의뢰(PIMAC 및 검토기관)
- 2025. 2.: 적격성 조사 및 제안서 검토 완료(PIMAC 및 검토기관)
- 2025. 3.: 민간투자사업 추진에 대한 군의회 동의
- 2025. 4.: 민간투자사업 추진 결정 및 제3자 제안 공고
- 2025. 8.: 우선협상대상자 선정
- 2025.11.: 실시협약 체결 및 사업시행자 지정
- 2026. 5.: 통합환경허가 완료 및 실시계획 승인
- 2026. 6.: 공사 착공
- 2028.12.: 공사 완료

□ 기대효과

- 위생매립장의 추가 확보가 현실적으로 어려운 상황에서 소각시설 설치를 통해 가용기간을 연장함으로써 생활폐기물의 안정적인 처리
- 「폐기물관리법」 개정으로 2026년 생활폐기물의 직매립 금지 등 변화하는 환경정책에 대응
- 생활폐기물의 안정적 처리기반 확보 및 자원의 재활용 기여
- 하수슬러지의 안정적인 자체 처리와 생활폐기물의 외부 위탁에 소요되는 비용 절감

도 시 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
4개 사업						53.2%	
Ⅳ-1	명품주거단지 1만호 건설(군인아파트 등) 목표로 주거문제 해결	민간	신규	2026 (임기내)	정상추진	40	
Ⅳ-2	북면도시공원 야간 경관 조성	가평군	계속	2023 (임기내)	완료	100	
Ⅳ-3	수도권정비계획법 자연보전권역 규제 완화	가평군	신규	2026 (임기외)	정상추진	40	
V-8	청평역, 상천역 역세권 활성화 (기반시설 확충)	가평군	계속	2027 (임기외)	정상추진	33	

약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 10만의 자족도시를 완성하겠습니다.

명품주거단지 1만호 건설(군인아파트 등) 목표로 주거문제 해결

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅳ-1	도시	주민안전은 더 세심하게	민간	신규	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	도시과	도시계획팀장 박상민(2350)	담당자	김도혁(2463)	
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 40%

□ 추진방향

- 주거지역내 주택건설사업을 통한 양질의 주택 제공
- 시가화 개발을 통한 계획적인 개발계획 수립

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 가평읍, 설악면, 청평면 일원
- 사업내용: 도시개발사업(공동주택) 및 주택건설사업계획승인
- 사업내용: 총 23개소, 10,553세대 / 주택건설사업 (※ 5개소, 1,578세대)
 - 가평읍: 14개소, 5,832세대(※ 4개소, 1,158세대)
 - 설악면: 4개소, 2,744세대(※ 1개소, 420세대)
 - 청평면: 5개소, 1,977세대
- 소요예산: 2,256,600백만원(전액민자)

구분	총사업비	임기 내						임기 후	비고
		소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	2,256,600	2,256,600	100,000	1,000,000	600,000	331,000	225,600		
국비									
도비									
군비									
기타	2,256,600	2,256,600	100,000	1,000,000	600,000	331,000	225,600		

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
	10,500세대	계	100	40
2022 하반기	2,000세대	씨티호반청평, 신천2지구, 신천3지구, 청평역세권2지구	18.1	15.8
2023	3,000세대	청평2지구, 신천4지구, 달전2지구, 하색지구, 하색2지구	27.2	14.2
2024	3,000세대	청평3지구, 달전5지구, 달전6지구, 달전7지구	27.2	10
2025	1,500세대	대곡3지구, 읍내3지구 (달전3지구, 대성지구 제외)	18.1	
2026 상반기	1,000세대	달전4지구, 청평5지구 (청평4지구 제외)	9.4	

□ 추진실적

○ 세부추진현황

- 2022. 7. 2.: 청평역세권2지구 도시개발구역지정(401세대)
- 2022. 7. 5.: 씨티호반청평지구 사업시행자지정 및 실시계획인가 접수
- 2022. 8.12.: 가평 달전2지구 도시개발구역 지정 제안 수용통지(458세대)
- 2022. 8.23.: 신천3지구 사업시행자지정 및 실시계획인가 접수(1,000세대)
- 2022.10.26.: 청평3지구 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시
- 2022.10.27.: 청평2지구 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시
- 2022.11. 2.: 달전5지구 주택건설사업계획승인[지앤피스타(주)]
- 2022.12.29.: 달전6지구 주택건설사업계획승인[(주)무궁화신탁]
- 2022.12.30.: 달전2지구 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시
- 2022.10.26.: 청평3지구 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시
- 2022.10.27.: 청평2지구 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시
- 2022.11. 2.: 달전5지구 주택건설사업계획승인[지앤피스타(주)]
- 2022.12.29.: 달전6지구 주택건설사업계획승인[(주)무궁화신탁]
- 2022.12.30.: 달전2지구 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시
- 2023.01.16.: 하색1지구 도시개발사업 구역지정, 개발계획(안) 주민등의 의견청취
- 2023.01.16.: 하색2지구 도시개발사업 구역지정, 개발계획(안) 주민등의 의견청취
- 2023.02.06.: 대곡3지구 도시개발사업 구역지정, 개발계획(안) 주민등의 의견청취
- 2023. 2. 8.: 청평3지구 사업인정협의 완료(중앙토지수용위원회)
- 2023. 5.15.: 청평3지구 도시개발사업 사업시행자 지정 및 토지세목 고시
- 2023. 6.13.: 대곡3지구 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시
- 2023. 7.26.: 신천4지구 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시

- 2023. 8. 7.: 청평5지구 도시개발구역 지정 제안 수용통지(382세대)
- 2023. 9. 6.: 하색1지구 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시
- 2023. 9. 6.: 하색2지구 도시개발구역지정 및 개발계획수립 고시
- 2023.10.28.: 가평 달전4지구 도시개발구역 지정 제안 수용통지(492세대)
- 2023.11.30.: 청평3지구 도시개발사업 실시계획인가 고시
- 2024. 1.15.: 달전2지구 도시개발사업 사업시행자 지정 고시
- 2024. 2. 2.: 신천3지구 도시개발구역, 개발계획, 실시계획 변경인가 고시
- 2024. 3.20.: 대곡3지구 도시개발사업 사업시행자 지정 고시
- 2024. 3.29.: 달전2지구 도시개발사업 실시계획인가 고시
- 2024. 5.24.: 청평3지구 도시개발사업 구역 외 기반시설 사업시행자 지정 고시

□ 추진상 문제점 및 대책

- 최근 주택건설 자금조달의 어려움으로 일부 사업 추진 지연

□ 향후계획

- 1만호 명품주택 건설 목표 완성을 위한 지속적 행정지원

□ 기대효과

- 양질의 주거공간 조성을 통한 수도권 인구 유입 및 지역 경제 활성화에 따른 생활 인구 증가
- 공공기여시설 기부채납에 따른 관내 기반시설 확보
- 대규모 공사로 인한 지역경제 활성화

약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 10만의 자족도시를 완성하겠습니다.

북면도시공원 야간 경관 조성사업

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅳ-2	도시	주민안전은 더 세심하게	가평군	계속	단기	임기 내
추진부서	건설도시국	도시과	도시개발팀장	김인호(2370)	담당자	임재범(2371)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

□ 추진방향

- (필요성) 수려한 자연경관으로 다수의 관광객이 방문하고 있는 북면지역 내 도시공원에 대하여 관광명소로 조성하여 날로 침체되는 지역경제 활성화에 기여
- 북면 행정복지센터와 인접한 목동 근린공원에 대하여 지역주민의 휴식처와 더불어 관광명소로 거듭날 수 있는 계기 마련

□ 사업개요

- 사업기간: 2021. 4. ~ 2024. 4.
- 사업위치: 북면 목동리 목동근린공원 일원
- 사업규모: 야간경관시설이 접목된 타워전망대 설치 1개소(H=30m, D=18m)
- 소요예산: 5,036백만원(공사비 4,836 / 설계및감리비 200) ※ 확보예산: 총 2,036백만원(기투자 제외)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	5,036	3,000	2,036		2,036					
국비										
도비	2,800	2,800								
군비	2,236	200	2,036		2,036					
기타										

○ 사업내용

- 관광휴게실(관망탑)/지상 1층(건축면적=212.61㎡, 연면적=212.61㎡)
- 관광조명 설치 1식 (LED등 43개 설치)
- 엘리베이터 1개소, 그네 설치 2개소, 난간 및 게이트 설치

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2023		· 2023. 4: 전망대 철골구조물 현장반입 및 설치 · 2023. 5: 경관조명 및 엘리베이터 설치 · 2023. 6: 주공정 완료 · 2023.10: 부대시설 설치 후 사업완료	100	100
2024		· 2024. 4: 도색작업 등 마무리 공정 진행 후 사업완료		

□ 추진실적

- 2022. 6.28.: 전망대 설치 전체분, 1차분 계약체결
- 2022. 7. 6.: 1차분 공사 착공
- 2022. 9.19.: 전기공사 계약체결 및 착공
- 2022. 9.19.: 전기공사 계약체결 및 착공
- 2023. 3. ~ 6.: 기초 설치 완료, 전망대 철골구조물 현장반입 및 설치
- 2023. 7. ~ 12.: 전망대 주요 철골구조물 및 부대설비 등 설치
- 2024. 2. : 마무리 도색작업 진행후 사업완료 예정 (공정률 97%)
- 2024. 4. : 도색작업 등 마무리 공정 진행후 사업완료 예정 (공정률 97%)
- 2024. 4.23.: 사업준공
- 2024. 6.: 안내판, 미끄럼방지 패드 등 안전시설물 설치공사 실시
- 2024. 7. 1.: 전망대 시설물 개방

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 2024. 9.: 전망대 시설물 안전시설물 추가 설치 등 보수공사 실시

□ 기대효과

- 목동 근린공원 내 야간경관시설이 접목된 전망대 설치를 통한 지역 명소 조성으로 관광객들에게 볼거리와 즐길거리를 제공하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사진



약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 10만의 자족도시를 완성하겠습니다.

수도권정비계획법 자연보전권역 규제 완화

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅳ-3	도시	주민안전은 더 세심하게	가평군	신규	장기	임기 외
추진부서	건설도시국	도시과	도시계획팀장	박상민(2350)	담당자	윤성문(2351)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	40%

□ **추진방향**

- 가평군은 인구소멸지역으로 수도권의 과밀인구화는 상반되므로 수도권에서 제외될 수 있도록 추진
 - ※ 대안: 수도권의 인구소멸대상 지역인 연천, 강화와 협력하여 수도권에서 제외 추진

□ **사업개요**

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 가평군 전역
- 사업규모: 관련 규정 (수도권정비계획법 시행령) 개정
- 소요예산: 비예산
- 사업내용
 - 인구소멸지역에 해당되는 지역과 협력하여 수도권에서 제외될 수 있도록 지속적 건의

□ **연도별 목표 및 추진계획**

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	40
2022 하반기	수도권 규제 문제점 제기	수도권 규제개선 건의	5	5
2023	수도권규제 완화 공감대 형성		25	25
2024			25	10
2025			25	
2026 상반기	수도권규제 개선 절차 진행		20	

□ 추진실적

- 2022. 7.: 수도권규제 개선 건의자료 전달 (국토부교통부장관 면담)
- 2022.12.: 수도권규제 문제점 제출 및 상담 (달리는 국민신문고)
- 2022.12.: 경기북부 발전 학술포럼 개최 (제3차 수도권정비계획의 평가와 개선방안)
- 2022.12.: 연천·강화·가평 국회의원 결의문 채택
- 2023. 2.: 불합리한 규제개선 과제 제출(산업단지위 심의시 수도권정비위 심의 면제)
- 2023. 3.: 수도권정비계획법령 관련 제도개선 건의사항 제출(국토부교통부장관 면담)
- 2023. 4.: 인구감소지역의 수도권 규제 제외 및 자연보전권역 행위제한 규모 완화 건의 (경기도 제출)
- 2023. 9.: 수도권 규제의 합리적 조정을 위한 자연보전권역 시·군 단체장 회의 추진 및 제도개선 건의(국토부 제출)
- 2024. 5. 자연보전권역 규제개선 간담회 제도개선 건의사항 제출 (경기도 제출)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 수도권(자연보전권역) 규제완화는 비수도권지역의 반발 및 타 권역의 무관심으로 시행령 개정도 어려운 상황으로 가평, 연천, 강화, 옹진 및 자연보전권역 시·군과 연대하여 규제완화의 불가피성 피력

□ 향후계획

- 수도권규제 개선 필요성의 공감대 형성을 위한 지속건의

□ 기대효과

- 다양한 유형의 주택공급으로 주거의 질 향상 및 주택 공급난 해소
- 산업단지 규모 확대에 따른 규모의 경제 실현으로 수질오염 방지시설 등 기반시설 일괄설치 및 산업단지 분양가 인하
- 산업단지 내 공장 유도로 개별입지공장 설치 억제

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

청평역, 상천역 역세권 활성화 (기반시설 확충)

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-8	도시	주민안전은 더 세심하게	가평군	계속	중기	임기 외
추진부서	건설도시국	도시과	도시재생팀장	정종경(2460)	담당자	박성호(2461)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 33%

□ 추진방향

- 역세권 기반시설 조성사업의 현실적 재정여건 및 주변상황을 고려하여 주요도로 우선 시행
- 역세권 지구단위계획 재정비 결과로 단계별 집행계획에 따라 사업추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2027
- 사업위치: 청평역·상천역 신역사 일원
- 사업규모: 청평: 도로 3개소(L=1,130m), 상천: 도로 1개소(L=650m)
 - ※ 청평: 도로 3개소 중 도로 1개소(L=370m) 공사완료, 도로 1개소(L=195m) 공사중
 - ※ 상천: 도로 1개소(L=650m) 보상중
- 소요예산: 총사업비 37,450백만원(청평: 23,200, 상천: 14,250)
 - ※ 확보예산: 총 4,170백만원(기투자제외, 22년: 1,000, 23년: 1,500, 24년: 1,670)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	37,450	23,940	13,510	1,000	1,500	1,670	1,740	3,000	4,600	
국비										
도비										
군비	37,450	23,940	13,510	1,000	1,500	1,670	1,740	3,000	4,600	
기타										

○ 사업내용

- 지구단위계획 구역 내 주요 간선도로를 조성하여 지역개발 활성화

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	33
2022 하반기	실시계획인가 고시	· 청평 중로2-5호선 공사 완료 · 연말까지 보상계획 공고	5	5
2023	보상 추진	· 청평 중로2-1호선 보상 완료 · 상천 중로1-8호선 보상 추진	10	8
2024	보상 및 공사추진	· 청평 중로2-1호선 공사 완료 · 청평 중로2-7호선 보상 추진 · 상천 중로1-8호선 보상 추진	25	20
2025	보상 추진	· 상천 중로1-8호선 보상 추진	20	
2026	보상 및 공사추진	· 청평 중로2-7호선 보상 추진 · 상천 중로1-8호선 공사 추진	20	
2027	공사 완료	· 청평 중로2-7호선 공사 완료 · 상천 중로1-8호선 공사 완료	20	

□ 추진실적

- 2022. 6.: 청평 중로 2-5호선 준공
- 2023. 4.: 청평 중로 2-1호선 손실보상협의 요청(2차)
- 2023. 5.: 청평 중로 2-1호선 손실보상협의 요청(3차)
- 2023. 7.: 청평 중로 2-1호선 수용재결 신청
- 2023.12.: 청평 중로 2-1호선 보상완료
- 2024. 2.: 상천 중로 1-8호선 보상추진(일부필지 보상완료)
- 2024. 2.: 청평 중로 2-1호선 착공
- 2024. 3.: 청평 중로 2-7호선 손실보상협의 요청(1차)
- 2024. 4.: 상천 중로 1-8호선 일부토지 보상완료(2필지)
- 2024. 5.: 청평 중로 2-7호선 일부토지 보상완료(6필지)
- 2024. 6.: 청평 중로 2-1호선 추진중 (공정률 80%)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 2027.12.: 청평 상천 역세권 공사 완료

□ 기대효과

- 기반시설 확충을 통한 지구단위계획구역 내 발전의 기틀 마련
- 도시계획도로 장기 미집행으로 인한 주민들의 불편해소

□ 위치도(청평)



□ 위치도(상천)



교 통 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
4개 사업						72.5%	
Ⅲ-6	드론 아카데미 확대 운영	가평군	계속	2026 (임기내)	정상추진	80	
Ⅳ-4	GTX-B 노선 가평 연장 확정	국토부	신규	2026 (임기내)	완료	100	
Ⅳ-5	대중교통 시스템 및 노선확충 (7000노선 : 잠실-청평-가평)	국토부 경기도	계속	2026 (임기내)	정상추진	60	
V-7	읍면별 도심지 주차장 확충 추진	가평군	계속	2026 (임기내)	정상추진	50	

약속Ⅲ 문화가 융성한 관광콘텐츠 육성으로 문화·관광도시로 성장하겠습니다.

드론 아카데미 확대 운영

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅲ-6	관광	지역문화는 더 다채롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	교통과	교통행정팀장	라주희(2202)	담당자	정윤욱(2200)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	80%

□ 추진방향

- 기초 및 전문가 수준이상 교육과정이 가능한 드론 양성교육기관과의 업무협약 운영
- 각종 현장에서 활용 가능한 드론 전문자격 취득 및 교육 확대로 취업기회 강화 등

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 사업위치: 가평군 설악면 위곡리 3-4 (한컴 아카데미 청리움)
- 사업규모: 초경량비행장치 교육기관과의 협약을 통한 드론 아카데미 확대 운영
- 소요예산: 303백만원(320백만원) ※ 확보예산: 총 31백만원(24년: 31)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	303	110	193		12	31	60	90	
국비									
도비									
군비	303	110	193		12	31	60	90	
기타									

- 사업내용
 - 드론 교육 프로그램 설계 및 운영계획 수립
 - 드론 교육기관 운영방안(용역) 검토 및 협약기관 선정 등

□ 연도별 목표 및 추진계획

구분	목표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	80
2023 하반기	추진계획 수립 및 검토	· 현장조사 및 관련 법규·기관 협의 검토 등 (사업 타당성 및 가능성 사전 검토 등)	30	30
2023 ~임기내	운영방안 검토(용역 등) ⇒ 용역발주 및 협약추진	· 드론 아카데미 확대 운영추진 (가평군민 및 직원 드론교육 추진 등)	70	50

□ 추진실적

- 유관기관 현장방문 조사 및 검토
 - 2022. 9.15.: 한컴아카데미 교육장 방문
 - 2022. 9.27.: 제7021부대 사단사령부와의 실무 미팅
 - 2022. 9.30.: 가평경찰서와의 실무 미팅
- ⇒ 민·관·군·경 드론자격취득 교육 지원 및 아카데미 운영방안 모색
- 2022.12.28.: 드론 활성화지원 홍보물 등 구입(고글 안전모 등 7종 1,300천원)
- 2023. 4.19.: 드론업무 총괄 부서 지정 회의(부군수 지시사항) 결과
 - ⇒ 교통과: 드론교육 업무 전담 추진
- 2023. 5. ~ 9.: 가평주민 대상 드론 입문(기초과정 46명) 수료
- 2023.12.: 공직자 대상 드론 자격취득(5명)
- 2024. 5. ~ 6.: 가평군민 대상 드론 입문 1기 교육 (16명)
- 2024. 6.: 공공분야 드론 조종인력 양성사업에 따른 드론 자격(1종) 취득(1명)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 드론 업무관련 총괄부서 부재로 인한 효율적 교육인프라 및 활용방안 미흡
- 드론 자격증 취득 후 인사이동으로 인한 드론 자격증 활용 미흡

□ 향후계획

- 공직자 드론 조종 자격(1종) 취득 교육 과정 추진 (2024년 7월 중 / 10명 자격 취득 예정)
- 가평군민 대상 드론 입문 교육 2~3기 추진 (2024년 7월 ~ 10월 / 32명 교육 예정)

□ 기대효과

- 드론산업의 전문 인력 양성을 통해 새로운 일자리 및 취업기회 확대 등

약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 10만의 자족도시를 완성하겠습니다.

GTX-B 노선의 가평 연장 확정

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅳ-4	교통	주민안전은 더 세심하게	국토부·경기도	신규	중기	임기 내
추진부서	건설도시국	교통과	교통행정팀장	라주희(2202)	담당자	문기환(2203)
추진현황	☒ 완료 ☐ 이행후계속 ☐ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	100%

□ 추진방향

◆ GTX(Great Train Express) : 수도권 전역을 1시간 내에 연결할 수 있는 수도권광역 급행철도

☞ B노선(남양주~송도) 경기도 남양주시 화도읍에서 출발하여 서울시 중랑구·동대문구·중구·용산구·영등포구·구로구와 경기도 부천시, 인천광역시의 부평구·남동구를 거쳐 송도국제도시까지 80.1km를 운행한다. 운행 노선은 마석역(기점)~평내호평역~별내역~망우역~청량리역~서울역~용산역~여의도역~신도림역~당아래역~부평역~인천시청역~송도역(종점)의 13개 역으로 계획되어 있다. 2019년 8월 예비타당성 조사를 통과하였다. 총 사업비는 5조9038억원이 소요된다.

- (필요성) 경춘국도 차량집중으로 인한 상습적 지·정체로 서울 접근성이 떨어지고, 각종 규제에 인하여 정체된 지역균형발전 도모 및 관광 활성화를 위해 GTX-B 노선의 가평, 춘천 연장 필요
- (추진방향) 수도권광역급행철도GTX-B(인천 송도~남양주 마석) 노선의 마석~가평(청평역·가평역)~춘천(강촌역·춘천역)까지 연장구간을 기본계획에 포함시키기 위해 가평군·춘천시가 사전타당성조사 용역 추진 등 공동 대응 체계 확립

□ 사업개요

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업위치: 남양주 마석~가평~춘천
- 사업규모: GTX-B 노선 남양주 마석~춘천 노선 연장(55.7km)
- 소요예산: 500백만원(가평군 250 + 춘천시 250) ※확보예산: 총 250백만원 (2022년: 250백만원)
※ 용역발주: 332.5백만원(가평군 50%) / 기간: '22. 7.15 ~ '23. 4.10(9개월)
⇒ 2022년 제1회 추경 250백만원 확보 및 송금(完) / 추후 정산 예정
- 사업방법: GTX-B 연장 사전타당성 용역추진 등(협상에 의한 경쟁입찰 / 춘천시 도로과)
- 사업내용(*주요 추진현황)
 - “가평군·춘천시 협업 GTX-B 노선 연장 사전타당성 조사 공동용역”추진
 - ※ 용역기간: '22. 7월 ~ '23. 4월(9개월) / 춘천시 발주
 - 과업내용: GTX-B 노선 가평(가평역·청평역)~춘천 연장에 따른 검토 요구
 - (용역결과) GTX-B 노선을 남양주 마석~가평~춘천까지 연장할 수 있도록 춘천시와 협력하여 중앙부처(*2023. 4월경 국토교통부)에 건의 등

- (경기도) ‘22. 4월 경기도지사 “GTX 플러스 프로젝트” 공약 발표 및 ‘22. 9월 제2회 추경 기본구상 용역 발주비용 12억 요구 ⇒ 예산 편성 후 ‘22. 10월부터 1년간 용역 추진 (GTX-B+: 마석~가평 연장) ⇒ 제5차 국토부 국가철도망계획 반영 요구(건의)
- (국토부) ‘22. 7월 “수도권 광역급행철도(GTX) 확충 통합기획 연구용역” 착수보고회 개최 (한국교통연구원, (주)태조엔지니어링, (주)유신컨소시엄 / ‘23. 6월 용역완료)
 ※ 국토부 “GTX 추진단” 발족 (사업팀: GTX A-B-C 추진 / 기획팀: GTX연장·신설 전담)
 ⇒ ‘23. 1월 GTX-B 노선 민자구간 협상대상자 지정 : 대우건설 컨소시엄(주)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	100
2022 하반기	GTX-B 노선연장 타당성 조사용역	· 가평군·춘천시 협업 GTX-B(마석~춘천)노선 연장 사전 타당성 조사 공동용역(추진 중) - 사업비: 500백만원(가평 250, 춘천 250) - 용역기간: 2022. 7.~ 2023. 4.(9개월) ※ 2022. 5월 우리 군 용역비 250백만원 완납(송금) (☎ 춘천시 도로과 도로시설팀 033-250-3159)	20	20
2023	GTX-B 노선연장 확정(공동건의)	· 가평군·춘천시 공동 협의 건의(‘23년 4월) ※ 노선연장 용역결과 국토교통부 공동건의(방문) (관련부처: 국토교통부 철도정책과, 코레일) · 국회의원 등 각종 기관방문 협조 요청(공동대응) (강원도 춘천시와 연계하여 공동 대응전략 추진)	80	80
2024				
2025				
2026 상반기				

□ 추진실적

- 용역 착수보고회 개최 : 2022. 8.30.(춘천시청/ 건설도시국장, 교통과장 등 3명 참석)
 - 용역기간: 2022. 7.15. ~ 2023. 4.10.까지(9개월)
 - 주요내용: 가평(청평역~가평역)·춘천연장에 따른 기술적 검토 등
 ⇒ 국가철도망계획 및 시설사업기본계획에 용역결과 반영(춘천시+가평군 공동대응)
- 가평군 당정(국민의힘당+가평군·의회)협의회 현안사항 건의: 23. 1. 6.
- 용역 중간 보고회 및 자문회의(춘천시): 23. 1.17.
- 용역 중간보고회(가평군) 개최: 23. 2.15.
- 용역 중간보고회(가평군) 중간 보고회: 23. 2.15.
- 용역 최종 보고회: 23. 4. 4.
- 용역 중지(연장) ⇒ 국토부 용역 완료 시까지: 23. 4. 5.
- 용역 추진현황(주요사항 요약) 국토부 건의 등(춘천시): 23. 4월

- 용역 추진 현황 군의회 보고 및 국회의원 자료 제출 등: 23. 5월
- GTX+기본구상 연구용역 간담회(경기도) 참석: 23. 6. 8.
- 춘천시 담당부서와 간담회 실시: 23.11.28.
- 제5차 국가철도망 구축계획 건의사업 목록제출(경기도): 23.12.26.
- 춘천시 담당부서와 2차 간담회 실시(춘천시): 24. 1.29.
- GTX-B 연장노선 사전타당성조사 공동용역 최종보고서 납품전 검토회의(춘천시): 24. 3.14.
- 국토교통부 철도국(신속개통기획단) 관계자 면담: 24. 4. 3.
- GTX-B 노선 확정 완료 보고: 24. 4.11.
- 제5차 국가철도망(2026~2035) 사업계획서 제출: 2024. 5월
- GTX-B노선 가평~춘천 연장관련 회의개최(가평군): 24. 6. 7.
 - 참석자: 경기도, 강원도, 춘천시, 가평군

□ 추진상 문제점 및 대책

- GTX-B 노선 연장시 가평군 원인자 부담금의 재정부담 ⇒ 경기도 재정지원 지속 건의

□ 향후계획

- GTX-B 노선 조기추진을 위해 춘천시와 공동대응 지속추진

□ 기대효과

- 각종 규제로 정체된 지역균형 발전 및 관광 활성화 도모
- 수도권 1시간이내 진출입 가능에 따른 인구유입 및 다양한 문화욕구 충족 등

약속Ⅳ 활력이 넘치는 생활인구 10만의 자족도시를 완성하겠습니다.

대중교통 시스템 및 노선 확충

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
Ⅳ-5	교통	주민안전은 더 세심하게	경기도	계속	단기	임기 내
추진부서	건설도시국	교통과	교통행정팀	라주희(2202)	담당자	오우석(2296)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률 60%

□ **추진방향**

○ 현재 운행 중인 7000번 버스(잠실-청평-가평) 운행횟수 증회하여 교통 인프라 강화

□ **사업개요**

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업위치: 잠실-청평-가평
- 사업규모: 1일 5회 운행(2024. 1월 기준)
- 소요예산: 204백만원(1,648백만원) ※ 확보예산: 총 204백만원(2024년 기준)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	204		204		90	114				
국비	102		102		45	57				
도비	30		30		13	17				
군비	72		72		32	40				
기타										

※ 사업비 확정내시분 반영 금액
○ 사업내용

7000번 버스(잠실-청평-가평) 운행 노선 현황

- 7000번 1대/5회(일) 운행(시간표 평일 기준 06:30, 10:30, 14:00, 18:00, 21:50)
※ 평일이 아닌 날은 4회 운행(토요일·휴일 06:30, 11:40, 17:30, 21:40) / (일요일 06:30, 12:00, 16:30, 22:10)
- 가평~잠실 운행시간 1시간 40분가량 소요(왕복 약 3시간 20분)
- 해당 7000번 노선은 2023년 12월 1일 대광위* 광역버스 준공영제 사업으로 이관 및 관리
*대도시권광역교통위원회

• 잠실노선 운송손익(2023년 11월 운행손실금 산정 연구용역) (단위: 원)

노선	연간운송수입	보조금			연간운송원가	운송손익	비고
		수도권환승할인	청소년할인	계			
7000	147,459,605	8,730,204	929,459	9,669,663	515,348,378	-358,229,110	

※ 現 운송손익 적자운영 원인 : 이용객수 저조(장시간 소요 및 기존 전철노선 대체가능)

- 잠실노선 평균 이용객 수 현황(2023년 12월 기준, 왕복)

노선	구간	1일 평균 이용객(명)	1회 평균 이용객(명)	이용률(%)	비고
7000	가평-설악	31	6.2	22	
	설악-잠실	109	21.8	78	

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	60
2022 하반기	현행 유지 (운행횟수 5회)	· 1대 차량, 1일 5회 운행	-	
2023	증차(증회)	· 1대 차량, 1일 5회 운행(평일이 아닌 날은 4회) · 추후 이용자수 여건에 맞춰 대도시권광역교통위원회 (대광위)와 사업계획변경(증회) 사전협의 추진	100	60
2024				
2025				
2026 상반기				

□ 추진실적

- 경기도 출퇴근시간대 증차 운행지원 사업으로 7001번 노선 1회 증차 요청
- 2023. 5. 1. ~ 12. 31.: 7001번 버스 임시 증회 승인
- 2023.11. 6.: 7000번 버스(잠실-청평-가평) 노선 증차 요청에 따라 대광위에 증차 요청
- 2023.12. 1.: 7000번 버스(잠실-청평-가평) 노선 대광위(대도시권광역교통위원회) 주관 사업으로 이관
- 2024. 5.16.: 국토부 대광위 방문(선정위원회 결과 지연(타당성평가 연구용역 진행 중))
- 2024. 6.26.: 대광위 준공영제 신설 관련 노선위원회 심의결과 ⇒ 기각

□ 추진상 문제점 및 대책

- 서울시의 잠실 일대 서울 도심의 극심한 혼잡을 사유로 더 이상의 노선 진입을 불허함에 따라 잠실 인근 지역이면서 상대적으로 덜 혼잡하고 향후 SRT 정차 예정역인 수서역을 종점으로한 신규노선을 검토하겠다고 대광위로부터 회신(구두)받았으나,
광역버스 노선위원회 심의결과 기각됨

□ 향후계획

- 대광위(대도시권광역교통위원회)에 지속적인 건의

□ 기대효과

- 대중교통 노선확충으로 실질적인 인구유입 효과 및 가평읍 교통 인프라 강화 등

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

읍면별 도심지 주차장 확충 추진

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-7	교통	주민안전은 더 세심하게	가평군	계속	단기	임기 내
추진부서	건설도시국	교통과	교통시설팀장	김태랑(2259)	담당자	은지혜(2281)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	50%

□ 추진방향

- 읍면 도심지 내 부족한 주차 공간 확보를 통하여 원활한 교통 소통과 주민불편 해소
- 주민의견과 이용객의 접근성을 고려한 주차장 입지 선정 후 절차 진행

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 관내
- 사업규모: 읍면별 도심지 주차장 조성
- 소요예산: **21,395백만원** ※ 확보예산: 총 12,995백만원(22년: 5,471, 23년: 5,849)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	21,395	1,675	19,720	5,471	5,849	8,400			
국비									
도비	8,649	1,500	7,149	2,500	3,649	1,000			
군비	12,746	175	12,571	2,971	2,200	7,400			
기타									

※ 가평읍 레일바이크 부지 사업비 증가

- 사업내용 ※ 총사업비(보상비 / 공사비)

구 분	사업명	사업기간	사업위치	총사업비(백만원)	사업규모
계			5개소	21,395 (15,138 / 6,257)	부지면적 : 19,297㎡ 주차면수 : 474대
가평읍	어린이음악놀이터 옆 공영주차장 조성	2022~23	가평읍 대곡리 243-14 일원	2,895 (2,215 / 680)	부지면적 : 2,852㎡ 주차면수 : 43대
	경춘선 폐선부지 (레일바이크) 옆 공영주차장 조성	2023~25	가평읍 읍내리 354-5 일원	4,200 (3,000, / 1,200)	부지면적 : 3,709㎡ 주차면수 : 117대
청평면	청평 공영주차장 (1구역) 조성	2022~24	청평면 청평리 457-2 일원	5,345 (3,791 / 1,554)	부지면적 : 2,980㎡ 주차면수 : 60대
	청평 공영주차장 (2구역) 조성	2022~24	청평면 청평리 84-10 일원	4,255 (2,632 / 1,623)	부지면적 : 6,586㎡ 주차면수 : 165대(대형 11)
조종면	조종면 시가지 공영주차장 조성	2022~25	조종면 현리 274-10 일원	4,700 (3,500 / 1,200)	부지면적 : 3,170㎡ 주차면수 : 89대

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	50
2022 하반기	청평 공영주차장(2구역) 실시설계	· 2022.12. : 실시설계용역 착수	10	10
	어린이음악놀이터 옆 공영주차장 실시설계	· 2022. 9. : 부지 매입 완료 · 2022.12. : 실시설계용역 착수		
2023	청평 공영주차장(1구역) 착공	· 2023. 6. : 실시설계용역 및 실시계획인가 완료 · 2023. 7. : 국유지(2필지) 토지보상 · 2023. 8. : 공사 착공	40	40
	청평 공영주차장(2구역) 착공	· 2023. 5. : 국유재산 매입 협의 · 2023. 7. : 실시설계용역 및 실시계획인가 완료 · 2023. 8. : 공사 착공 · 2023.12. : 공사 준공(토목)		
	어린이음악놀이터 옆 공영주차장 착공	· 2023. 5. : 실시설계용역 완료 · 2023. 6. : 공사 착공		
	레일바이크 옆 공영주차장 실시설계	· 2023.12. : 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 착수		
	조종면 시가지 공영주차장 실시설계	· 2023. 4. : 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 착수		
2024	청평 공영주차장(1구역) 준공	· 2024. 4. : 공사 준공	30	
	청평 공영주차장(2구역) 준공	· 2024. 4. : 공사 준공 · 2024. 5. : 국유재산 매입 완료		
	레일바이크 옆 공영주차장 실시설계	· 2024. 7. : 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 완료 · 2024.10. : 손실보상 · 2024.12. : 문화재조사		
	조종면 시가지 공영주차장 준공	· 2024. 4. : 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 완료 · 2024. 7. : 손실보상 · 2024. 8. ~ 12. : 공사 착공 및 준공		
2025	레일바이크 옆 공영주차장 준공	· 2025. 3. ~ 7. : 공사 착공 및 준공	20	

※ 신규 사업은 2024년도 예산확정 후 반영(6개 사업)

□ 추진실적

- 2022.12.: 어린이음악놀이터 옆 공영주차장 실시설계용역 착수
- 2023. 1.: 청평 공영주차장(2구역) 실시설계용역 착수
- 2023. 3.: 2023년도 공영주차장 조성사업 추진계획 방침결재(공영주차장 군계획시설 결정 후 추진, 레일바이크 대체부지 선정 등)
- 2023. 3.: 道 주차환경개선사업 선정(어린이음악놀이터 옆) ※도비 180백만원 확보
- 2023. 4.: 조종면 시가지 공영주차장 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 착수
- 2023. 6.: 어린이음악놀이터 옆 공영주차장 실시설계용역 완료 및 공사 착공
- 2023. 7.: 청평 공영주차장(1·2구역) 경기도 계약심사 완료

- 2023. 8.: 청평 공영주차장(1·2구역) 공사 착공
- 2023.12.: 어린이음악놀이터 옆 공영주차장 조성공사(통신) 준공
- 2023.12.: 청평 공영주차장(2구역) 공사(토목) 준공
- 2023.12.: 가평읍 시가지(레일바이크 외 4개소) 군계획시설(주차장) 결정 및 실시설계용역 착수
- 2024. 2.: 어린이음악놀이터 옆 공영주차장 조성공사(토목) 준공
- 2024. 2.: 청평 공영주차장(2구역) 공사(통신) 준공
- 2024. 2.: 道 주차환경개선사업 선정(가평읍 레일바이크 옆, 조종면 시가지) ※ 도비 1,000백만원 확보
- 2024. 4.: 조종면 시가지 공영주차장 조성사업 주민설명회 개최
- 2024. 4.: 청평 공영주차장(1·2구역) 공사(전기) 준공
- 2024. 5.: 청평 공영주차장(1구역) 공사(통신) 준공
- 2024. 6.: 청평 공영주차장(1구역) 공사(토목) 준공
- 2024. 6.: 가평읍 시가지(레일바이크 외 3개소) 군계획시설(주차장) 결정 및 고시

□ 추진상 문제점 및 대책

- 국가철도공단 내부행정절차 진행에 따른 폐선부지 매수 지연
⇒ 매수 전 무상사용허가를 득해 공사 정상 추진(2024. 5. 매수 완료)

□ 향후계획

- 「주차장법」 제3조에 따른 주차장 수급 실태조사 결과와 읍·면 주차장 조성 건의 등 검토하여 그 외 도심지 주차장 추가 확충

□ 기대효과

- 공영주차장 조성으로 도심지 주차난 해소를 통한 주민불편해소

□ 사진



가평읍 어린이음악놀이터 옆



가평읍 레일바이크 인근



청평면 1구역(청평농협 뒤)



청평면 2구역(중앙내수면연구소 옆)



조종면 시가지(조종초교 앞)

보 건 정 책 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						25%	
VI-1	경기도의료원 가평병원 유치	가평군	신규	2026 (임기내)	정상추진	25	

약속VI 군민의 건강한 삶을 최우선으로 하겠습니다.

경기도의료원 가평병원 유치

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
VI-1	보건	주민안전은 더 세심하게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	보건소	보건정책과	보건행정팀장	윤정숙(2810)	담당자	조혜영(2811)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	25%

□ 추진방향

- 지리적 특성으로 의료불균형 해소에 한계가 있으며, 의료서비스 향상을 위하여 병원급 이상의 공공 의료기관 확보(응급의료분야 의료취약지: 가평, 동두천, 양평, 여주, 연천)
- 24시간 응급진료 및 공공진료가 가능토록 추진함으로서 지역 간 의료격차 해소

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 6.(2026. 7.)
- 사업위치: 가평군 청평면 일원 예정
- 사업규모: 건물신축 1동 (6,275.3㎡)
- 소요예산: 45,604백만원(30,130백만원) ※ 확보예산: 총 45백만원(22년: 45)

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	45,604		25,030	45			10,000	14,985	20,574
국비	10,627		5,881					5,881	4,746
도비	2,657		1,471					1,471	1,186
군비	32,320		17,678	45			10,000	7,633	14,642
기타									

※ 1/4분기 대비 토지구입비용 감소(10,000백만원)

○ 사업내용

- 진료시설: 725.3㎡ (치과, 한방과, 일반내과, 일반외과, 산부인과, 소아과, 정형외과 등)
- 응급시설: 245.7㎡ (응급실, 처치실, 당직의사실 등)
- 진료지원시설: 378㎡ (방사선실, 임상병리실 등)
- 병동시설: 941.4㎡ (1인실, 2인실, 4인실, 간호사실 등)
- 사무시설: 975.7㎡ (회의실, 사무실, 원무과, 전산실 등)
- 보건사업활동시설: 712.3㎡ (결핵관리실, 구강보건실, 건강증진실 등)
- 서비스시설: 670㎡ (세탁실, 식당 등)
- 기타시설: 1626.9㎡(공유면적, 기계실, 선택시설 등)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	25
2022 하반기	기본계획 수립 및 부지선정	· 추진 방침 결정 및 기본계획 수립 · 타당성조사 용역 실시 · 부지 선정	10	10
2023	사전절차 이행	· 가평병원 설립 계획 확정(연구용역 완료) · 사전 행정절차 이행 · 설립, 운영 관련 조례 등 법령 제정·정비 · 부지매입 협의	20	15
2024	부지매입 및 설계완료	· 부지매입 · 사업예산 확보: 국·도비 확보 · 군 계획 결정 및 실시계획 인가 · 기본 및 실시설계	20	
2025	착공	· 시공업체 선정 및 계약 · 공사착공	40	
2026 상반기	진행	· 공사진행	10	

□ 추진실적

- 2022. 8.30.: 경기도 공공의료과(방문) 가평병원 유치 정책 건의
 - 경기도의료원 가평병원 설립 필요성 제기(경기도 공공의료과장)
- 2022. 8. ~ 12.: 의료원 유치를 위한 민·관 추진위원회 위촉 및 민간(유관기관) 간담회
 - 가평 의료원 유치 방향, 민간부분 공조, 군민 서명 운동 협조
- 2022. 9. ~ 2023. 4.: 의료원 타당성 조사 연구용역 (추경)예산 편성 및 용역 시행
 - 가평군 의료원 설립 연구용역(수행기관: 한국능률협회컨설팅)
- 2022.10.: 경기도 보건건강국(방문) 가평병원 유치 정책 건의
 - 경기도 의료원 정책 방향 및 유치 협의(경기도 보건건강국장, 부군수님)
- 2022.11. ~ 2023. 1.: 의료원 유치를 위한 범 군민 서명 운동 및 지역사회 홍보
- 2023. 1.31.: 경기도의료원 유치 범 군민 건의문 및 서명부(28,028명) 전달
 - 경기도의료원 가평병원 설립 필요성(경기도지사 군수님 면담)
- 2023. 2.22. / 27.: 민·관 추진위원회 벤치마킹 및 회의
 - 의료원 유치 관련 설립 및 추진 방향 논의(청송군, 경기도의료원포천병원)
- 2023. 3.15.: 의료원 부지 선정을 위한 소통 회의
- 2023. 3.24.: 의료원 유치 및 설립 추진방향 기관방문
 - 경기도 (보건)의료원 정책 및 방향 논의(연천군 부군수, 가평군 부군수)
- 2023. 8. 3.: 경기도 보건의료과 및 경기도의회 보건복지위원회 기관 방문 협의
 - 건립 관련 행정·재정 지원 요청(경기도 보건의료과장, 경기도의회 보건복지위원장)
- 2023. 8.14.: 가평병원 등 의료기관 유치 총괄 업무 사무인계인수
 - 자치행정과-16617(23.5.24.) 기획예산담당관(성과관리팀) ⇄ 보건정책과 사무인계
- 2023. 8.: 타·지자체 의료(병)원 건립 및 운영 현황 벤치마킹

- 연천군보건의료원(8. 10.), 정선군립병원(8. 11.), 삼척의료원(8. 22.)
- 2023. 8.22.: 2023년 제4차 정기지방재정 「중앙」투자심사의뢰서 제출
 - 보건의료원 건립 관련 「지방재정 투자사업 심사 규칙」 등 관련 행정 절차 이행
- 2023. 8.24.: 경기도 군협력담당관 기관 방문 협의
 - 의료원 건립부지(구, 국군청평병원)관련 국방부 등 유관기관 협조 요청(군협력담당관)
- 2023. 8.28.: 경기도 군협력담당관 건립부지 방문 현장 협의
 - 구)국군청평병원 부지 현장 확인 및 유관기관 협조 방안 추가 논의(군협력담당관 전문관)
- 2023. 9. 6.: 의료원 건립 부지 매입 및 지역 의료기관 상생 협의
 - 의료원 건립 부지(구, 국군청평병원) 매입(환지) 협의(수도기계화보병사단 사단장)
 - 병원 건물 및 시설 2개층 활용, 상생 협업 요청(HI매그놀리아국제병원장, 경영이사)
- 2023. 9. 7.: 의료원 건립 및 운영 관련 강원대학교병원 방문 논의
 - 강원대학교 가평군 응급의료 지원 방향 논의(강원대학교병원 기획조정실장, 기획예산과장)
- 2023. 9. 8.: 보건의료원 건립 관련 단양군보건소 벤치마킹
 - 보건의료원 건립 및 운영 계획 등 업무 협의(2024년 보건의료원 개원예정)
- 2023. 9.11.: 의료원 건립 부지 매입을 위한 국방부 및 경기도 협조 요청
 - 구)국군청평병원 매입 및 환지 요청(국방부), 상생협의체 안건 제출(경기도)
- 2023. 9.27.: 국방부 시설관리본부(북부시설단) 가평군 보건소 방문 실무 협의
 - 구)국군청평병원 부지 매입(환지)관련 실무 협의(북부시설단 팀장)
- 2023. 10.26.: 가평군 보건의료원 건립 및 운영 관련 외부 전문가 간담회 개최(교수, 의료(병)원장)
 - 가평군 의료취약지 개선을 위한 의료원 건립 추진 안건 공유 및 관련 전문가 제언
- 2023. 11.27.: 국방부 시설관리본부(북부시설단) 가평군 보건소 방문 2차 실무 협의
 - 구)국군청평병원 부지 매입(환지) 관련 2차 실무 협의
- 2023. 12.14.: 가평군 보건의료원 건립 및 운영 관련 2차 외부 전문가위원 회의 개최
 - 24시간 응급진료 및 지역 주요 의료현황 공유와 의료원 건립과 운영 관련 전문가 제언
- 2023. 12.18.: 보건 및 건축분야 전문가 소위원회 개최 (교수, 보건의료원장)
 - 가평군 보건의료원 건축계획의 방향성, 건립 규모, 응급실, 병동 및 병상, 필요 시설 등 건축 관련 사항 논의
- 2024. 1. 5.: 가평군 보건의료원 건립 부지 활용 방안 협의(육군본부, 수도기계화보병사단)
 - 舊 국군청평병원 부지에 가평군 보건의료원 및 군 숙소 건립 내용 협의
- 2024. 1.11.: 국방부 시설관리본부(북부시설단) 가평군 보건소 방문 3차 실무 협의
 - 舊 국군청평병원 부지 매입 관련 3차 실무 협의
- 2024. 1.12.: 舊 국군청평병원 부지 매입 사무인계인수
 - 회계과에서 보건정책과로 舊 국군청평병원 부지 매입 사무인계인수
- 2024. 1.18.: 가평군 보건의료원 건립후보지 입지분석 조사 관련 업무 협의
 - 가평군 보건의료원 건립후보지 입지분석 조사 용역사와 실무 협의(도시과, (주)중앙이앤씨)
- 2024. 2.15.: 舊 국군청평병원 부지 활용 방안 토의
 - 舊 국군청평병원 부지 활용방안 및 관계 부서 사업 추진 토의(수도기계화보병사단, 도시과, 환경정책과, 상수도사업소, 하수도사업소)
- 2024. 2.20.: 舊 국군청평병원 부지 활용 방안 토의를 위한 국방부 방문

- 국방부 유희부지(舊 국군청평병원 부지) 활용 관련 업무 협의(국방부 국유재산과, 육군본부, 국방시설본부, 경기북부시설단, 안전재난과, 도시과)
- 2024. 2.28.: 화천군보건의료원 운영 벤치마킹
 - 보건의료원 건립을 위하여 화천군보건의료원 시설 및 운영 방안 확인
- 2024. 3.27.: 가평군 보건의료원 건립 관련 경기도청 방문
 - 농어촌의료서비스개선사업 보건의료원 건립 업무 협의를 위하여 경기도청 방문
- 2024. 4.23.: 건립부지 선정위원회 위촉장 수여 및 회의 개최
- 2024. 5.29.: 「(가칭)가평병원 건립 후보지 입지분석 용역」재개(중지일:‘23.7.12.)
- 2024. 5.30.: 공공의료시설 부지매입 절차 등 업무 협의를 위한 국토교통부, 행정안전부 방문
- 2024. 6.4.: 「(가칭)가평병원 건립 후보지 입지분석 용역」최종보고회 개최
- 2024. 6.12.: 舊)국군청평병원 부지 활용방안 국방부(경기북부시설단)와 논의 및 현장 확인
- 2024. 6.14.: 국방부 소유 건립 후보지 매입 절차에 대한 관련 부서(도시과, 안전재난과) 간담회 개최
- 2024. 7.2.: 제2회 건립부지 선정위원회 개최
 - 최종 건립부지 선정: 舊)국군청평병원(청평면 청평리 259번지 일원)

□ 추진상 문제점 및 대책

- 지역 보건의 수요, 주민의 접근성, 지리적 요건을 감안하고 공공 의료원 설립 표준대지 면적 10,163㎡를 충족한 국군청평병원 이전 부지 매입 추진
- 법령, 조례, 행정, 설립 부지 등 공공 병원 설립에 필요한 관련 사항 정비 및 중앙, 경기도, 유관부서와 재정 확보를 위한 지속적인 검토중
- 건립에 필요한 부지 매입비, 건립비 등 국,도비 예산 확보 어려움
 - ⇒ 공모사업, 지방소멸대응기금 등 공공의료기관 건립에 필요한 재정 확보를 위하여 다각적 노력 및 관계부처와 지속적 업무 협의

□ 향후계획

- 선정된 건립부지 매입 협의 등 관련 절차 이행
- 건립규모 및 부지매입에 따른 용역 등 행정절차 이행 및 관계부처 협의

□ 기대효과

- 농어촌 지역보건의료기관의 인프라 확충을 통한 지역주민의 건강권 보장 및 보건의료 서비스 질 향상
- 질병예방·건강관리 등 지역 내 공공의료기관 운영으로 지역주민 건강수준 향상
- 감염병 및 재난 등 공중보건 위기 발생 시 위기 대응 역량 강화

소 득 개 발 과

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						31%	
I-8	가평군 스마트팜 기술보급 사업 추진	가평군	계속	2026 (임기내)	정상추진	31	

약속 I 군민중심의 경제·농업 정책으로 행복한 가평을 만들겠습니다.

가평군 스마트팜 기술보급 사업 추진

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
I-8	농업	군민생활은 더 풍요롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	농업기술센터	소득개발과	원예특작팀장	박명산(2890)	담당자	김주형(2883)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	31%

□ 추진방향

- 지역농업 특성에 적합한 작목별 스마트팜 단지 확대 보급
- 농업인의 IT 활용능력 향상 및 전문 농업인 양성
- 농가 순회 자체지도로 농업기술센터와 농업인의 소통 강화

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026
- 사업위치: 스마트팜 설치지원 과학적 농업실천 시설(채소, 화훼) 및 과수, 축산 현장
- 사업규모: 3개분야/연
- 소요예산: 2,033백만원(2,593백만원) ※ 확보예산: 총 230백만원(22년: 190, 23년: 40)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	2,033	683	1,350	190	40	100	470	550		
국비	360	110	250	50		50	70	80		
도비	366	197	169	27	12		60	70		
군비	1,100	285	815	95	20	50	300	350		
기타	207	91	116	18	8		40	50		

○ 사업내용

- 분야별 스마트팜 시설 및 장치 지원
- 환경조절시스템(온습도 등), 관수시스템, 자동화 시설 등 설치
- 스마트장치 활용능력 향상을 위한 농업인 교육
- 분야별 담당자 스마트팜 시설 및 재배관리 지도

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	31
2022 하반기	사업 완료 및 활용관리 지도	· 채소, 화훼, 축산분야 4개 사업 - 시설원예 스마트팜 기술보급 시범사업(1개소, 0.3ha) - 이상기상 대응 원예작물 안정생산 기술 시범사업(3개소, 1.1ha) - ICT활용 화훼재배 기반구축 시범사업(2개소, 0.2ha) - 기후변화 및 가축전염성 질병예방 사육환경 개선 시범사업(2개소)	10	10
2023	분야별 사업 확보 - 시설채소·화훼, 과수, 축산	· 스마트팜사업(국·도비) 신청 · 국·도비, 자체사업 추진	16	16
2024		- 2023년 스마트팜 기술보급 추진(2개사업) :시설원예 스마트팜 기술보급 시범사업(1개소), ICT활용 화훼재배 기반구축 시범사업(1개소)	20	5
2025		- 2024년 스마트팜 기술보급 추진(1개사업)	26	
2026 상반기		:무인 방제 활용 과수 종합관리기술 구축 시범(1개소)	28	

□ 추진실적

- 2022년 스마트팜 4개사업(190백만원) 설치 완료, 시설 유지 및 재배관리 지원
- 2023년 국·도비 5개사업(290백만원) 신청 완료
- 2023년 스마트팜 기술보급 사업 예산확보 및 추진: 도비 2개사업(40백만원, 도비)
 - 시설원예 스마트팜 기술보급 시범사업 준공완료(20백만원/ 1개소, 0.2ha)
 - 스마트기기 활용 시설하우스 환경모니터링(온·습도, CO2센서, 천·측창개폐 등)
 - 관수자동화시설 원격제어시스템 등
 - ICT활용 화훼재배 기반구축 시범사업 준공완료(20백만원/ 1개소, 0.2ha)
 - 온실개폐 및 시설환경(난방, 보광, 관수) 복합제어시스템(All-In-One) 등
- 시설하우스 스마트영농 기술교육 추진(계속)
 - 시설토마토 스마트팜 재배농가 기술 자문위원 농가지원 완료(경기도 농업기술원 연계, 1농가)
 - 양액배지(온도, 습도, pH등) 관리, 양액조제, 입식소독 등 토마토 양액재배 관리기술
- 2024년 스마트팜 기술보급 사업 예산확보 및 추진: 국비 1개사업(100백만원, 국비)
 - 무인 방제 활용 과수 종합관리기술 구축 시범 사업자 선정완료
 - 원격 에어포그 무인방제 시스템(분사장치, 제어기 등)
- 2025년 국비 3개사업(192백만원) 신청 완료

□ 추진상 문제점 및 대책

- 가평 농업인구의 영세화 및 노령화에 따른 신기술의 보수적 수용, 대부분 고가인 스마트 농업 장비 및 시설 투자의 경제적 부담 발생 등으로 스마트농업 추진의 어려움 다소 발생
 - 보조금액 증액·상향 등을 통한 농가의 경제적 부담 경감 및 예산지원과 연계한 농가교육 확대 및 교육프로그램 개발 필요
- 시설업체 영세화, 스마트 장비 유지관리 서비스 지원기술 미비 및 농가의 데이터 수집·분석 능력의 한계 발생
 - 기술업체들의 프로그램 연계화 및 수집된 데이터의 농업기술센터 등 기관과의 연계를 통한 농가별 적합한 가공된 데이터분석 제공 기능 개발 필요
 - 스마트팜 특화작목 생산기반 조성을 위한 기금 투자사업, 공모 투자사업 발굴 등 국·도·군비 예산확보를 위해 적극 대응 중

□ 향후계획

- 2023년 스마트팜 기술보급 시범(40백만원, 도비) 완료사업 사후관리
- 시설하우스 스마트영농 기술지원 지속 추진
 - 시설원에 스마트농업 현장 기술지원(경기도 농업기술원 연계 기술 자문위원 농가지원, 11월중)
- 2024년 무인방제 활용 과수 종합관리 기술 구축(1개소, 1.0ha, 100백만원)
 - 노지과원 대상 병해충 원격·생력화 방제시스템 구축, 미세살수 활용 과원 생육환경 개선
- 경기스마트팜 지원사업 작목별 농가맞춤 컨설팅(비예산, 2024~)
 - 시설딸기 및 화훼 신축시설 재배농가 스마트 농업활용 재배기술 교육 추진
 - 양액공급 자동화시설, 안개분무, 다겹보온커튼 및 알루미늄스크린, 보광등, 환기팬 등
- 원예분야 ICT활용 시설·장비 시범사업 농가 스마트영농 기술지도 추진(비예산, 2024~)
 - 시설딸기(2개소 0.6ha), 시설토마토(9개소 3.5ha) 및 시설화훼(2개소 0.4ha) 재배농가
 - 양액공급 및 온실개폐자동화시설, 안개분무시설, 농업용 전기히트펌프 등 설치지원
 - 과수(사과) 농가(2개소 2.0ha)
 - 라이다 센싱 데이터기반 분사노즐 개별제어기술, 사과 에어포그 무인방제시스템 등

□ 기대효과

- 디지털 기반기술 지원으로 농가 재배환경 편리성 증진 및 노동력 절감
- 이상기온 및 급격한 환경변화 등에 대한 효과적 대응 및 관리가능
- 고품질 생산 및 상품성 향상으로 농가 소득 증대와 농업경쟁력 강화
- 초기시설투자에 대한 부담완화로 스마트농업 진입장벽 완화 및 확대

평 생 교 육 사 업 소

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
2개 사업						55%	
Ⅱ -5	평생학습관 건립 및 교육사업 프로그램 편성 운영	가평균	계속	2026 (임기내)	정상추진	50	
Ⅱ -6	청소년문화의집 프로그램 운영	가평균	계속	2026 (임기내)	정상추진	60	

약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

평생학습관 건립 및 교육사업 프로그램 편성 운영

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
II-5	교육	지역문화는 더 다채롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	평생교육사업소		평생학습팀장	정선영(4676)	담당자	박경원(2476) 김범수(4678)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	50%

□ 추진방향

- 성인 취미·교양 교육을 넘어서 지역성장에 기여하는 지속가능발전 목표의 지표에 부합한 범분야별·생애별 특성화 교육기관으로서 지역 인적자원 육성 및 강화 역할 수행
- 강의 공간·체험실습 공간·편의시설 공간 등을 갖춘 종합시설로서 계획 및 추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2020 ~ 2026(4월 개관 목표)
- 사업위치: 가평읍 읍내리 885번지 일원
- 총사업비: 230억원[도 균형발전 전략 93, 도 균형발전 성과 26, 수계기금 29, 군 82]
 - 공사비 153억원, 토지보상비 24억원, 감리비 26억원, 용역비 등 27억원
 - 평생학습관 교육프로그램 운영 관련 연간 사업비 12.6억원 별도
[가평군 인재육성재단 설립 타당성 연구(2022, 경기연구원) 기준]
 - 확보예산: 5,931백만원(23년: 도비 4,069, 수계기금 720, 군비 1,142)
 - 2024. 3. 착공식 행사운영비 10백만원 총 사업비 외 별도 편성 요구

구분	총사업비	기투자	임기 내					임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	23,010	3,700	19,310		5,477	10,038	3,795		
국비									
도비	11,969	1,500	10,469		4,069	6,400			
군비	8,144	2,200	5,944		688	1,461	3,795		
기타	2,897		2,897		720	2,177			

○ 사업내용: 부지면적 7,450㎡, 연면적 4,657.02㎡

- 도입시설 건축(안)

층 별	주 요 시 설
지상4층	공예실, 생활스포츠실, 조리제빵실, 바리스타체험, 카페공간
지상3층	음악실습실, 강의실 2개, 강사대기실, IT실, 크리에이티브 스튜디오, 다목적강의실, 양재실
지상2층	스터디실, 커뮤니티공간, 강의실 3개, 동아리실 3개, 체험존 2개, 뷰티건강실습실, 생활기술실습실(목공, 전기 등), 3D프린터, VR·AR실습실
지상1층	숙직실, 상담실, 휴게실, 반려동물실습실
지하1층	사무실, 회의실, 상담실, 아이돌봄실, 카페 테리아, 편의점, 기계실, 전기실, 발전기실

※ 문화공연 시설은 인근 유사시설 활용으로 제외

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
		계	100	50
~2022 상반기	토지매입 및 실시설계· 평생학습관 운영계획 수립	- 경기도 지방투자심사 및 공유재산관리계획 승인, 중기지방재정계획 반영 - 실시계획인가 및 수용재결(읍내리 885외 5필지 매입) - 평생학습관 운영계획 수립 용역 발주('22. 5.)	30	30
2022 하반기	투자심사 재검토 및 평생학습관 운영계획 수립용역 완료	- 사업비 증액에 따른 중앙투자심사 재심사 요청('22.3.) - 중앙투자심사 재검토 통보('22.6.)에 따라 재검토 내용 연구용역 반영 및 재분석실시('22. 7. 사업규모 및 운영수지 재분석) - 평생학습관 운영계획 수립 용역완료('22.12.) - 중앙투자심사 재검토 사항의 분석에 따른 사업 규모축소로 재심사 미대상으로 확인(30% 미만), 중앙투자 심사 재심사 절차 제외('22.12.) - 민선8기 공약사업 계획 변경('22.12.군수방침결재)	5	5
2023 상반기	실시설계 변경추진 및 관련 협의	- 설계 변경에 따른 변경계약 체결('23.4.) - 실시설계 변경 추진('23. 1. ~ 6.) 및 경기도 지역균형발전위원회 기본계획 변경, 친환경청정사업 계획 변경 - 설계의 경제성 등 검토, 예비인증(녹색건축, 에너지효율) 등 재협의('23. 6.)	10	10
2023 하반기	건설기술심의 등 행정절차완료 및 공사발주	- 경기도 건설기술심의 완료('23. 7. ~ 8.) - 조달청 원가 심사('23. 9. ~10.) - 공사 계약 및 발주('23.11.)	5	5
2023 하반기 ~2025 하반기	공사진행 및 공사준공, 교육 프로그램 운영 준비	- 공사 진행('23.11. ~ '25.10.—'24. 3. ~ '26. 6.) - 공사 준공('25.11.—'26. 6.예정) - 교육 프로그램 운영(안) 확정 ('25. 6.) - 수강생, 강사 모집('25. 8. ~ 12.)	50	
2026 2.~	평생학습관 개관 및 운영	- 평생학습관 개관('26. 2.—'26. 8.) - 상·하반기 정기 교육프로그램 운영('26. 2.~)	-	

□ 추진실적

- 2022. 3.: 실시설계 결과 사업비 증가에 따른 중앙투자심사 의뢰(당초 총사업비 180억원 ⇒ 300억원)
- 2022. 6.: 중앙투자심사 재심사 결과“재검토”통보(사업규모 및 운영수지 재분석)
- 2022. 7. ~ 12.: 중앙투자심사 재검토사항 「평생학습관 운영계획 수립 용역」반영
 - 사업규모 축소 운영 제시 (연면적 6,849.03㎡ ⇒ 4,632.19㎡)
- 2022.12.: 『가평군 평생학습관 건립사업』변경 추진계획 수립(사업규모 축소 반영)
- 2023. 6.: 가평군 평생학습관 건립사업 기본 및 실시설계 용역 변경계약 체결, 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 용역 발주
- 2023. 9.: 설계의 경제성 등 검토(설계VE) 완료, 녹색건축물 관련 예비인증 재인증 완료, 경기도 건설기술심의 신청
- 2023.10.: 경기도 건설기술심의 완료, 2024년도 한강유역환경청 친환경청정사업 선정 2,177백만원 예산 확보
- 2023.11.: 조달청 공사계약 의뢰 완료
- 2023.12.: 건축협의를(허가) 완료, 전기·통신·소방공사 개찰 완료
- 2024. 3.: 공사계약 완료 및 착공
- 2024. 6. 현재: 공정율 5%

□ 추진상 문제점 및 대책

- 2024년도 경기도 지역균형발전사업비 12,306백만원 중 미확보 소요예산 59억원 제2회 추경예산 확보

□ 향후계획

[평생학습관 건립 부분]

- 2024. 3.: 공사 착공
- 2026. 6.: 공사 준공
- 2026. 8.: 평생학습관 개관

[교육 프로그램 운영 부분]

- 2025. 6.: 교육프로그램 운영계획(안) 확정
- 2025. 8. ~ 2026. 6.: 수강생 및 강사 모집
- 2026. 8. ~: 교육 프로그램 운영

□ 기대효과

- 사회변화에 대응하는 전 군민의 역량, 행복지수, 의식수준 향상을 통하여 가평군 전체의 생동감과 지역경쟁력 극대화과 군립대학역할 수행

□ 위치도 및 조감도



약속 II 맞춤형 인구정책으로 인구소멸 위기에 대응하겠습니다.

청소년문화의집 프로그램 운영

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
II-6	교육	지역문화는 더 다채롭게	가평군	계속	중기	임기 내
추진부서	평생교육사업소		청소년팀장	문소영(2465)	담당자	최효진(2466)
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	60%

□ 추진방향

- 청소년의 욕구 및 수요를 반영한 프로그램 운영 및 개발
- 청소년 이용 활성화 및 신규 이용자 참여 확대

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 계속
- 사업위치: 가평읍, 설악면, 조종면
- 사업규모: 권역별 청소년문화의집 프로그램 운영(가평·북면/ 설악·청평/ 상면·조종)
- 소요예산: 2,354백만원(12,938백만원) ※ 확보예산: 총 905백만원(22년: 398, 23년: 507, 24년 429)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	2,354		2,354	398	507	429	509	511		
국비	9		9	3	2		2	2		
도비	165		165	45	30	30	30	30		
군비	2,180		2,180	350	475	399	477	479		
기타										

○ 사업내용

- 청소년을 위한 건전한 문화·예술 프로그램 운영
- 청소년의 진로개발 및 자질향상을 위한 프로그램 운영
- 4차 산업혁명 관련 메이커(3D펜, 3D프린터, 드론 등) 프로그램 운영
- 그 밖에 건전한 청소년 활동을 위하여 필요한 사업 운영

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	추진계획	프로그램 만족도 평균	목표이행률	공정률
계			100	60
2022 하반기	· 프로그램 만족도 조사 및 청소년운영위원회의 모니터링으로 기존 프로그램 개선·발전	83점	20	20
2023	· 청소년 욕구조사를 통해 청소년의 의견을 반영한 신규 프로그램 개발	84점	20	20
2024	· 참여대상 확대를 위한 프로그램 개발 및 홍보강화	86점	20	20
2025	· 타 시·군 우수 프로그램 벤치마킹	88점	20	
2026 상반기	· 경쟁력 있는 프로그램 운영·개발을 위한 예산 지원	90점	20	

□ 추진실적

- 가평청소년문화의집 프로그램 운영
 - 참여활성화 및 미래역량강화: 18개 프로그램 / 2,872명
 - 예술특성화 및 4차 산업: 12개 프로그램 / 4,077명
- 설악청소년문화의집 프로그램 운영
 - 참여활동 및 역량강화: 19개 프로그램 / 3,667명
 - 공모 및 특성화사업: 5개 프로그램 / 2,207명
- 조종청소년문화의집 프로그램 운영
 - 참여활성화 및 미래역량강화: 12개 프로그램 / 9,885명
 - 예술특성화 및 미디어활동: 12개 프로그램 / 6,954명
- 2022년 가평군 청소년 문화의집 프로그램 만족도 조사 완료
- 2023년 청소년 욕구조사를 통한 청소년의 의견을 반영한 신규 프로그램 개발 지원
- 2023년 가평군 청소년문화의집 사업계획 수립 및 사업비 교부
- 2023년 각 프로그램 종료 후 만족도 조사 및 프로그램 모니터링 실시
- 2024년 가평군 청소년문화의집 사업계획 수립 및 사업비 교부
- 2024년 가평군 청소년문화의집(3개소) 시설장 인사발령(전보)
- 2024년 가평군 청소년육성위원회 개최(동아리 사업(9개) 및 어울림마당(1개) 대상자 선정)
- 2024년 1분기 군·위탁재단·청소년문화의집(3개소)·청소년상담복지센터 간담회 개최
- 2024년 가평군 청소년참여위원회 위원(19명) 위촉 및 위촉장 수여

□ 추진상 문제점 및 대책

- 가평군 건축 재정운영에 따라 추가경정예산 삭감으로 전년 대비 기존 및 신규 프로그램 발굴 및 추진 축소

□ 향후계획

- 2024년 가평군 청소년문화의집 프로그램 운영(연중)
- 각 프로그램 종료 후 만족도를 조사하고, 2024년 청소년운영위원회 구성 후 매월 프로그램 모니터링 실시

□ 기대효과

- 청소년의 역량증진을 도모하여 경쟁력 있는 청소년 육성
- 올바른 청소년상 정립에 기여하고 건강한 사회구성원 양성

상 수 도 사 업 소

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						20%	
V-11	상수도 사회기반시설 증진	가평군	신규	2026 (임기내)	정상추진	20	

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

상수도 사회기반시설 증진

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-11	환경	주민안전은 더 세심하게	가평군	신규	중기	임기 내
추진부서	상수도사업소 수도시설팀장 김중호(4420)					
추진현황	☐ 완료 ☐ 이행후계속 ☒ 정상추진 ☐ 일부추진 ☐ 보류 ☐ 폐기				공정률	20%

□ 추진방향

- 지역개발에 필수요소인 상수도의 시설용량 부족으로 지역발전 저해요소로 대두되고 있음
- 이에, 수도정비기본계획에 따라 가평군 통합 취·정수장 3,000㎥/일 증설계획임
(향후 2030년까지 7,000㎥/일 추가증설)

□ 사업개요

- 사업기간: 2023년 6월 ~ 2026년 6월
- 사업위치: 가평통합취·정수장(가평읍 달전리 산 55-4번지)
- 사업규모: 가평통합정수장 취·정수시설 증설(19,000㎥/일→22,000㎥/일) (10,000톤)
- 소요예산: 18,059백만원[공사비 17,059 / 설계비 1,000(기투자)] (40,000백만원)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	18,059		18,059		1,000	1,800	9,412	5,847		
국비										
도비										
군비	18,059		18,059		1,000	1,800	9,412	5,847		
기타										

※ 배수치 추가 증설 비용 증액

○ 사업내용

- 3,000㎥/일 증설(시설용량: 19,000㎥/일→22,000㎥/일)
 1. 방사상집수정 2개소 개발(22,000㎥/일)
 2. 정수장 시설 부분 증설 등(배수지 등)
 3. 건설사업관리용역 1식(18개월)

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	20
2023	실시설계용역 추진	· 수도정비기본계획 승인(환경청) · 가평통합정수장 증설공사 실시설계용역 용역 착수	10	10
2024	설계완료 및 공사 발주	· 가평통합정수장 증설공사 실시설계용역 용역 준공 · 가평통합 취·정수장 증설사업 인가추진 및 발주	20	10
2025	공사 시행	· 가평통합 취·정수장 증설공사 시행	40	
2026	공사 시행 및 준공	· 가평통합 취·정수장 증설공사 시행 · 시행시험작동 및 준공	30	

□ 추진실적

- 2023. 3. 6.: 수도정비기본계획 승인(환경청)
- 2023. 3.17. : 가평통합 취·정수장 증설공사 실시설계용역 계약업체 입찰 의뢰(조달청)
- 2023. 6.21.: 용역업체 계약체결
- 2023. 6.27.: 실시설계용역 착수
- 2023.12.12.: 하천점용허가(원주지방환경청)
- 2024. 2.15.: 시추조사 및 착정조사 완료
- 2024. 4.12.: 경기도 지역균형발전사업 공모 신청

□ 추진상 문제점 및 대책

- 대규모 투자사업으로 사업비 확보가 어려워, 관계(상위) 기관 협의 및 지원 요청을 지속적으로 실시하고자 함

□ 기대효과

- 안정적인 수돗물 공급에 따른 지역균형발전 및 인구유입 활력 증진

하 수 도 사 업 소

번호	사 업 명	사업주체	신규여부	완료시기	추진상황	공정률	비고
1개 사업						35.5%	
V-12	하수도 사회기반시설 증진	가평군	신규	2027 (임기외)	정상추진	35.5	

약속 V 도시 인프라 확충으로 성장동력의 발판을 마련하겠습니다.

하수도 사회기반시설 증진

관리번호	분야	중점 추진과제	사업주체	신규여부	사업시기	완료시기
V-12	환경	주민안전은 더 세심하게	가평군	신규	장기	임기 외
추진부서	하수도사업소		하수관로팀장 하수시설팀장	김기철(4455) 이현호(4440)	담당자	박현석(4453) 김명환(4448)
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기				공정률	35.5%

□ 추진방향

- 하수도법 제6조에 따라 수립한 가평군 하수도정비 기본계획에 따른 단계적 공공하수도 확충사업 추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2027 (2025)
- 사업위치: 가평군 공공하수처리구역 일원
- 사업규모: 총 17개 사업
 - 하수처리장 용량 증설 9,850톤/일(6개 사업)
 - 하수관로 정비 258.62km(11개 사업)
- 소요예산: 327,532백만원 ※ 확보예산: 총 40,252백만원(22년: 4,099, 23년: 14,539, 24년: 21,614)

구분	총사업비	기투자	임기 내						임기 후	비고
			소계	2022	2023	2024	2025	2026		
계	327,532	127,538	199,994	4,099	10,936	21,614	81,673	81,672		
국비	263,551	90,000	173,551	3,377	6,532	15,768	73,937	73,937		
도비	11,041	6,573	4,468	185	89	1,771	1,212	1,211		
군비	40,711	18,736	21,975	537	4,315	4,075	6,524	6,524		
기타	12,229	12,229								

○ 사업내용

- 지역개발 수요에 부응한 환경기초시설 확충

□ 연도별 목표 및 추진계획

구 분	목 표	추진계획	목표이행률	공정률
계			100	35.5
2023	가평 증설 등 5개 사업 완료	· 가평처리장 증설사업(3,500톤) · 신천처리장 증설사업(1,300톤) · 북면하수관로 정비사업(60.25km) · 북면·설악 차집관로 정비사업(7.6km) · 2016년 도시침수예방사업(6.87km)	20	19.3
2024	북면, 설악, 상면 노후관로 정비 사업완료	· 북면·설악면·상면 노후관로 정비사업(2.34km)	5	0.5
2025	현리처리장 증설 등 11개 사업완료	· 현리처리장 증설사업(1,300톤) · 천안처리장 증설사업(450톤) · 산유처리장 증설사업(200톤) · 청평처리장 증설사업(3,100톤) · 봉수소규모(현리 연계) 사업(25.78km) · 현리·산유 하수관로 정비사업(28.38km) · 청평·설악 하수관로 정비사업(49.6km) · 가평읍 하수관로 정비사업(18.5km) · 북면 하수관로 2단계 정비사업(44.6km) · 운악·상판 하수관로 정비사업(10.6km) · 청평면 노후관로 정비사업(4.1km)	75	15.7

※ 공정률 산정방식
 - 전체 공정률(100%) 중 설계완료공정률(10%), 시설공사완료공정률(90%) 으로 환산하여 산정함.

□ 추진실적

○ 사업별 추진현황 ※ 사업완료 4건, 공사중 4건, 공사중지 1건, 공사발주예정 2건, 설계중 6건

구 분	사 업 명	추진현황	비고
2023	1 가평처리장 증설사업(3,500톤)	사업완료	
	2 신천처리장 증설사업(1,300톤)	사업완료	
	3 북면하수관로 정비사업(60.25km)	사업완료	
	4 북면·설악 차집관로 정비사업(7.6km)	사업완료	
	5 2016년 도시침수예방사업(6.87km)	공사재착공예정(8월)	26년준공예정
2024	6 북면·설악·상면 노후관로 정비사업(2.34km)	공사착공예정(8월)	26년준공예정
2025	7 현리처리장 증설사업(1,300톤)	공사 중	26년준공예정
	8 천안처리장 증설사업(450톤)	공사착공예정(9월)	26년준공예정
	9 산유처리장 증설사업(200톤)	설계 중	27년준공예정
	10 청평처리장 증설사업(3,100톤)	설계 중	27년준공예정
	11 봉수소규모(현리 연계) 사업(25.78km)	공사 중	26년준공예정
	12 현리·산유 하수관로 정비사업(28.38km)	공사 중	26년준공예정
	13 청평·설악 하수관로 정비사업(49.6km)	공사 중	27년준공예정
	14 가평읍 하수관로 정비사업(18.5km)	설계 중	27년준공예정
	15 북면 하수관로 2단계 정비사업(44.6km)	설계 중	27년준공예정
	16 운악·상판 하수관로 정비사업(10.6km)	설계 중	27년준공예정
	17 청평면 노후관로 정비사업(4.1km)	설계 중	27년준공예정

□ 추진상 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 2024. 8.: 2016년 도시침수 예방사업 외 1건 공사 착공 및 재착공
- 2024. 9.: 천안처리장 증설사업 착공
- 2024.12.: 산유처리장 증설사업 외 5건 설계용역 준공
- 2025. 6.: 산유처리장 증설사업 외 5건 공사착공
- 2026. 1.: 현리처리장 증설사업 외 1건 준공
- 2026. 8.: 2016년 도시침수 예방사업 외 1건 공사 준공
- 2026. 6.: 현리·산유 하수관로 정비사업 준공
- 2026. 9.: 천안처리장 증설사업 준공
- 2027. 6.: 청평·설악 하수관로 정비사업 준공
- 2027. 7.: 산유처리장 증설사업 외 5건 준공

□ 기대효과

- 지역개발 수요에 부응한 환경기초시설 확충
- 북한강 수질보전과 팔당수계 맑은 물 공급
- 주민생활환경 개선과 공중보건 증진
